


# Colima

## Tramo Armería-Manzanillo

**Avance físico**

- Programado: 89.33%
- Real: 31.63%
- Semanal: 0.35 %
- Financiero: 20.79%

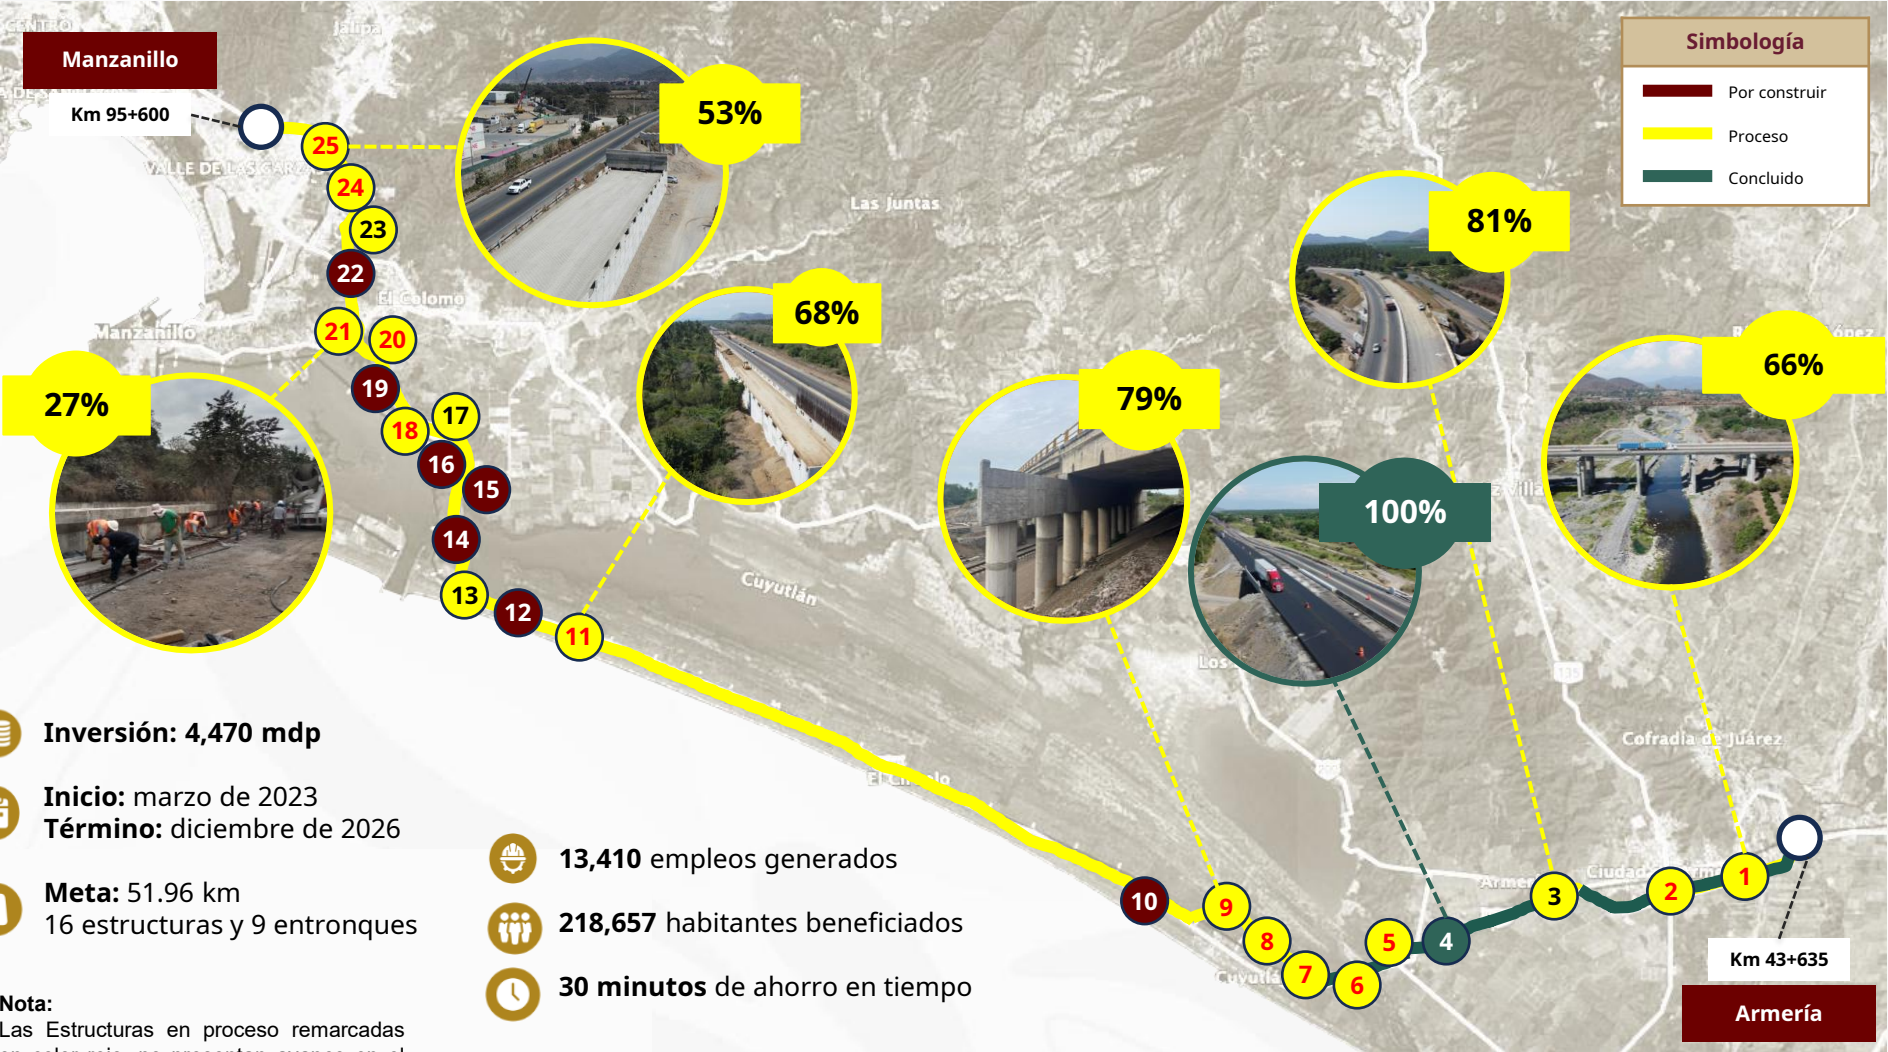

**Nota:**  
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

**Concesionaria:** PINFRA

Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (66%) <b>Falta de personal operativo.</b>
2	Entronque Paraíso km 47+741 (78%) <b>No esta programado avance.</b>
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (81.10%)
4	PSV Tilapia km 54+350 (100%)
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (41.03%)
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (17%) <b>Retraso en logística de perforación</b>
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (9%) <b>Retraso por logística en demolición de PIV existente.</b>
8	Entronque Salineros km 59+551 (5%) <b>Falta regularizar programa</b>
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (79.45%)
10	Entronque Cuyutlán km 60+880
11	PIV Retorno en U km 77+600 (68%) <b>Falta aumentar Fuerza de Trabajo</b>
12	Entronque Retorno en U km 77+600
13	PSFFCC Tepalcates I km 79+900 (4.09%)
14	Entronque Tepalcates I km 80+100
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+323
16	Entronque Tepalcates II km 83+500
17	Puente Adjuntas km 85+950 (37.96%)
18	PSV Panteones km 87+300 (21%) <b>Falta de Fuerza de Trabajo</b>
19	Entronque Panteones km 87+630
20	PIV Minatitlán Lib km 92+000 (4%) <b>Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.</b>
21	PIV Minatitlán Lib II km 92+000 (27%) <b>Se detuvieron trabajos</b>
22	Entronque Minatitlán km 92+731
23	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (15.75%) <b>Se trabajó en Fabricación de traves presforzadas</b>
24	Entronque Jalapa km 94+100 (9%) <b>Hay que cambiar el transito al cuerpo izquierdo del paso del puente</b>
25	Puente Jalapa km 94+158 (53%)


# Colima

## Tramo Armería-Manzanillo

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	05/09/25 al 11/09/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	264,248	0	0	180	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	495,241	318,669	0	2,314	
Base y sub base (m³)	260,119	138,494	121,625	0	1,754	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

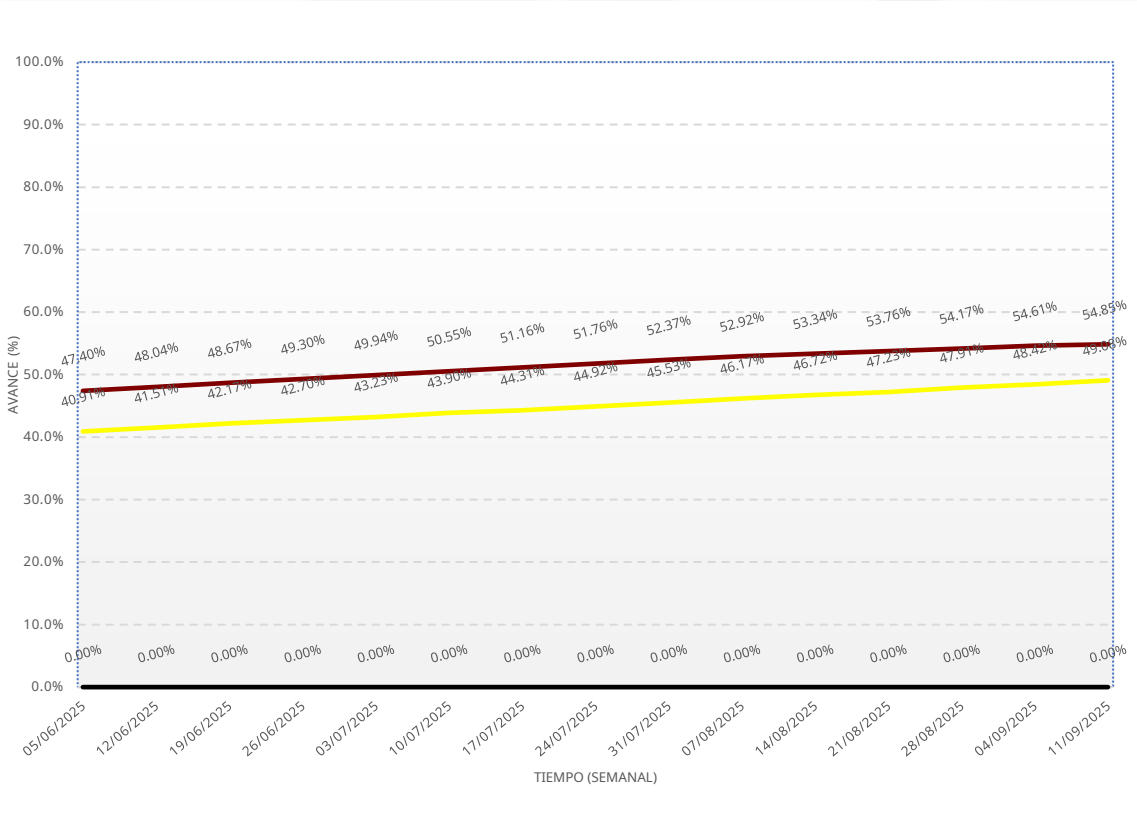

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	29 de agosto al 04 de septiembre	05 de septiembre al 11 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	156	208
Maquinaria	31	90

