

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Avance físico


- Programado: 98.96%
- Semanal: 0.52 %
- Real: 91.40%
- Financiero: 69.85%





Descripción	
1	Entronque Zirimicuaro km 93+500 (100%)
2	Puente canal km 92+210 (94.80%)
3	Entronque Caracha km 92+100, (70.25%). Trabajos de terracerías en gasas de acceso para operación parcial de PIV nuevo y continuar con trabajos de demolición de antigua estructura.
4	PIFFCC km 91+754, (34.65%).
5	Puente Canintzio km 88+283, (51.31%)
6	PIV km 88+054, (92.15%)


Descripción	
7	Entronque San Ángel km 87+400, (93.70%)
8	Rampa de emergencia II km 86+500 (100%)
9	Rampa de emergencia I km 84+100 (100%)
10	Entronque Jujucato km 79+489 (100%)
11	PIFFCC km 73+584, (34.41%)
13	Viaducto Zirahuén km 70+278 (100%)


Descripción	
14	Caseta de cobro remota Zirahuén 68+600 (100%)
15	Plaza de cobro Zirahuén km 60+500 (100%)
16	Entronque Pátzcuaro II km 53+600 (100%)
17	Entronque Pátzcuaro I km 47+500 (100%)
18	Entronque las trojas km 47+00 (100%)

**Inversión:** 1,792 mdp

**Inicio:** Julio 2017
Término: 30 septiembre 2025

**Meta:** 46.79 km; 58 Totales (1 plaza de cobro, 1 puente, 1 viaducto, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado).

**200 mil** habitantes beneficiados

**25 minutos** de ahorro en tiempo.


Concesionaria : PINFRA.

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	08/08/25 al 14/08/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Troncal						
PIFCC km 73+584 Cabezales	2	1	1	1	1	Acarreo y retiro de material producto del descabece de pilotes de concreto (cabezal #2)
PSV km 87+494 Accesos	2	0	2	1	1	Excavación y preparación de caja para conformación de terraplén.
PIV km 88+054 Accesos	2	1	1	1	1	Conformación de material para acceso C2
Puente Canintzio km 88+283 Montaje de trabes	51	36	15	7	7	Maniobras de montaje de trabes de concreto (claro 1-2)
Puente Canintzio km 88+283 Losas	7	4	3	1	1	Colado de concreto para losa (claro 4-5)
PIFCC km 91+754. Cabezales	2	1	1	1	1	Armado de acero de refuerzo para cabezal #2

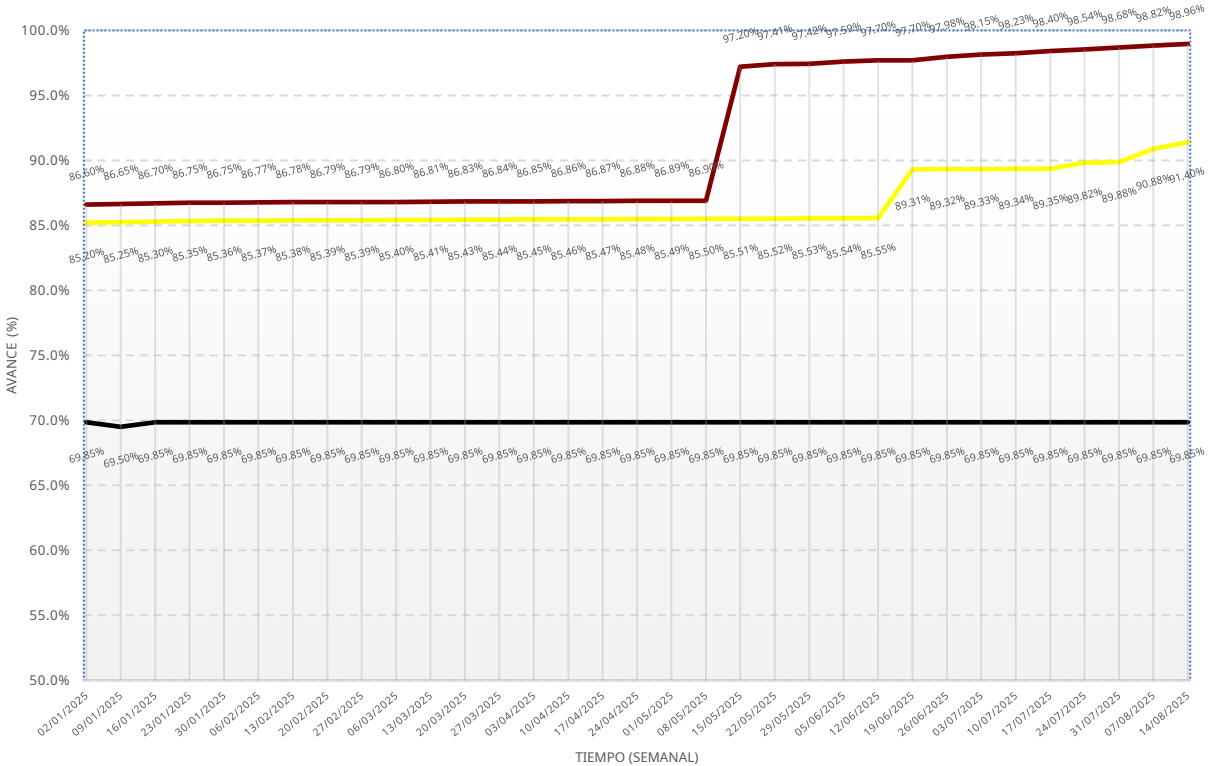

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	01 de agosto al 07 de agosto	08 de agosto al 14 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	365	340
Maquinaria	42	45



2025
Año de
La Mujer
Indígena
