



Nayarit

Las Varas-Puerto Vallarta (Tramo III)


Nota:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

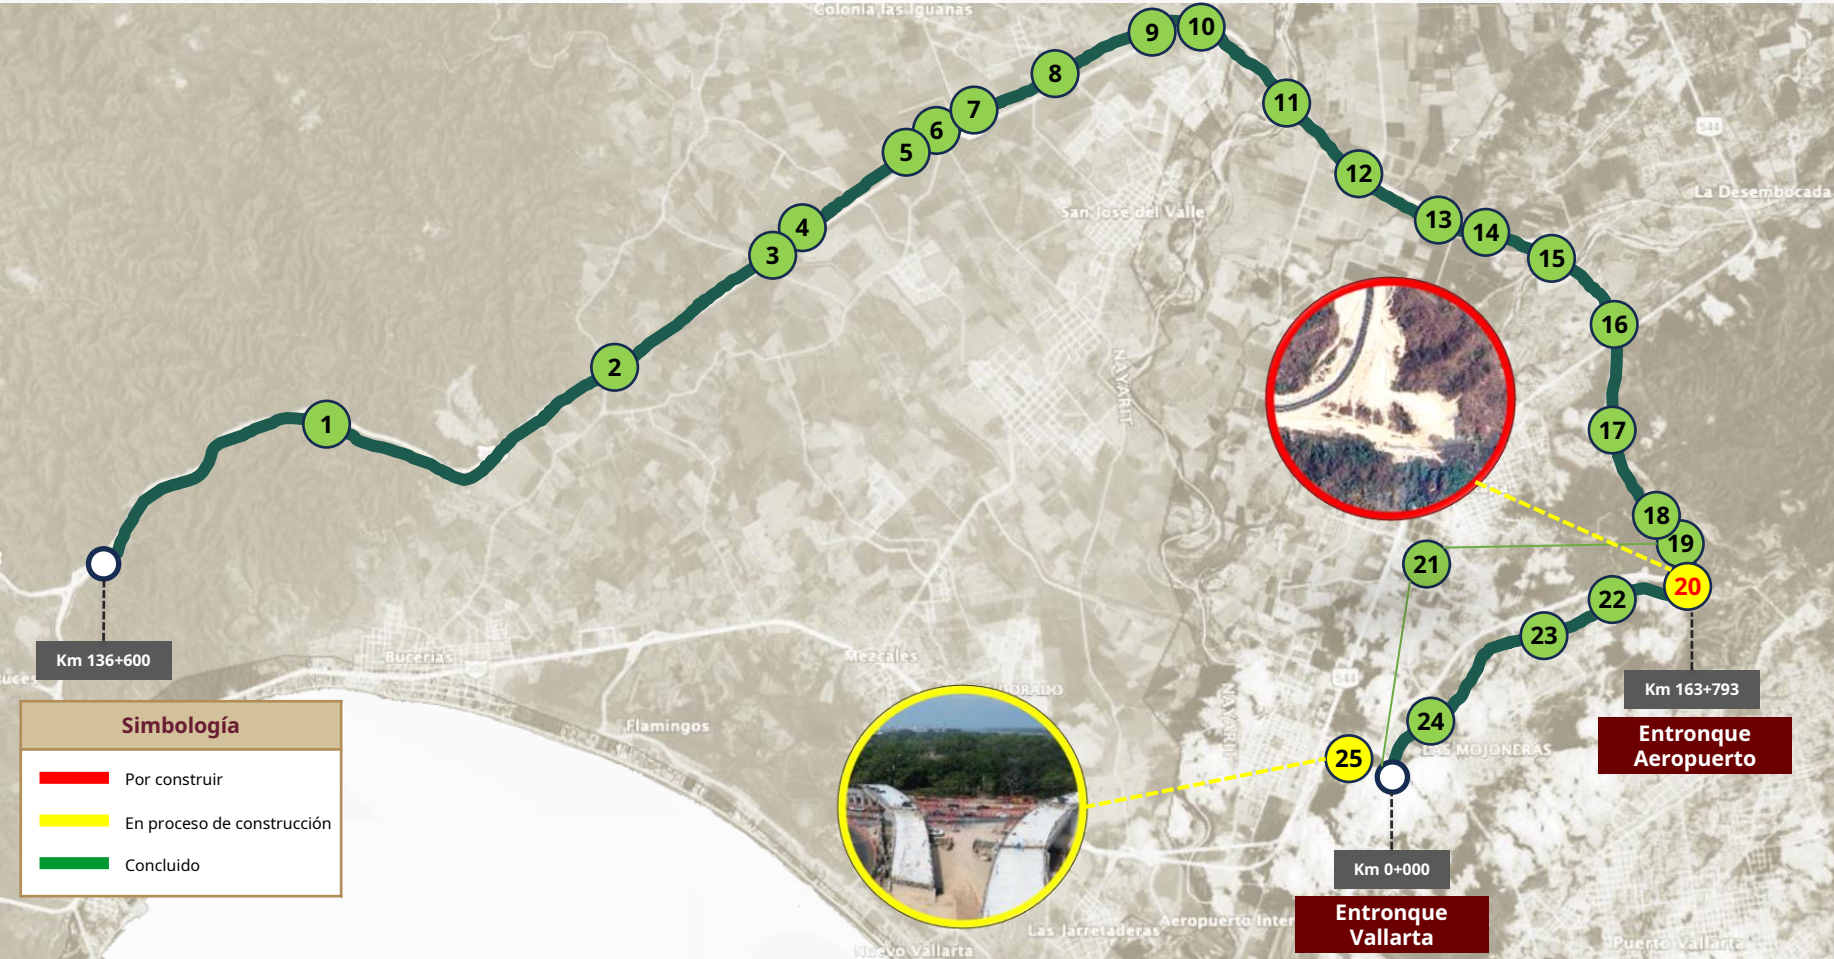

Descripción	
1	Puente rio Las Animas km 240+401
2	PIV 2V a zona agrícola km 144+237
3	PSV 1 V Sin Nombre km 146+700
4	Puente canal de riego km 146+800
5	PIV El Naranjo km 148+260
6	Plaza de cobro La Misión 148+700
7	Puente canal con camino de servicio km 149+597
8	PSV a valle de Candras km 151+496.22
9	PSV km153+225
10	PSV a San José del Valle km 153+538.25
11	Puente Rio Ameca km 154+903.25
12	Puente Canal km 156+754.01
13	PIV a San José del Valle km 157+663
14	Puente canal de riego km 158+876
15	Puente Mascota km 159+302
16	PSV Pto. Vallarta- Las Palmas km 160+427
17	Puente Santo Domingo km 162+181
18	PSV km 163+005
19	PSV km 163+452
20	Entronque Aeropuerto km 163+793, (15.0%) Sin asignación de recursos por la concesionaria.
21	Ramal Aeropuerto
22	PSV km 4+690
23	PSV km 3+018.9
24	PSV A.V. México km 1+000.13
25	Entronque Vallarta km 0+000, (88.0%)




Inversión total: 2,577 mdp




Inicio: septiembre de 2022
Término: septiembre de 2025, inaugurada y puesta en operación diciembre de 2024 (pendiente complementaria)


Concesionaria: IDEAL




Meta: 34.9 km
8 puentes, 13 estructuras de cruce, 2 entronques, 1 plaza de cobro y 1 ramal




Avance físico:
Programado: 100%
Real: 94.79%
Semanal: 0.10%
Financiero: 90%




Avance de obra pendiente: Real: 5.21%



5,500 empleos generados



Más de 50,000 habitantes beneficiados




30 minutos de ahorro en tiempo

Nayarit

Las Varas-Puerto Vallarta (Tramo III)

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	05/09/25 al 11/09/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Entronque Vallarta. Eje 10.						
Guarnición para MME	363.0	230	133	0	40	Colado de Guarnición Acceso 2
Muro de contención	492.9	351.5	141.4	0	232.2	Colado de Muro Acceso 1
Juntas de Calzada	10	2	8	0	2	Apoyos 1 y 2
Entronque Vallarta. Eje 20.						
Parapeto	479.6	479.6	0	0	239.6	Claros 4-5, 5-6 y 6A-7. Por pintar.
Muro de contención	636.2	108.8	527.4	0	108.8	Colado de Muro Acceso 2

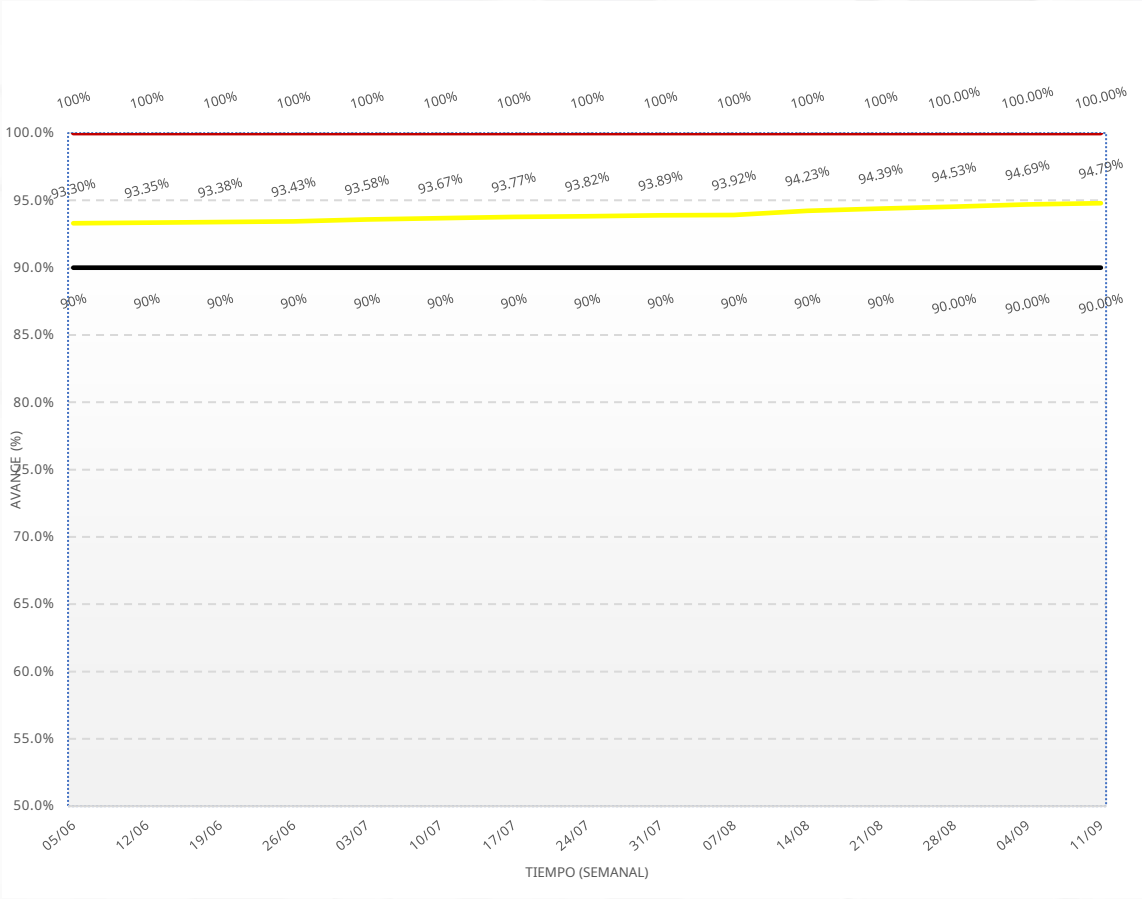

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 29 de agosto al 04 de septiembre	Del 05 de septiembre al 11 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	290	295
Maquinaria	15	15



2025
Año de
La Mujer
Indígena
