


Nayarit

Tramo Tepic-Compostela



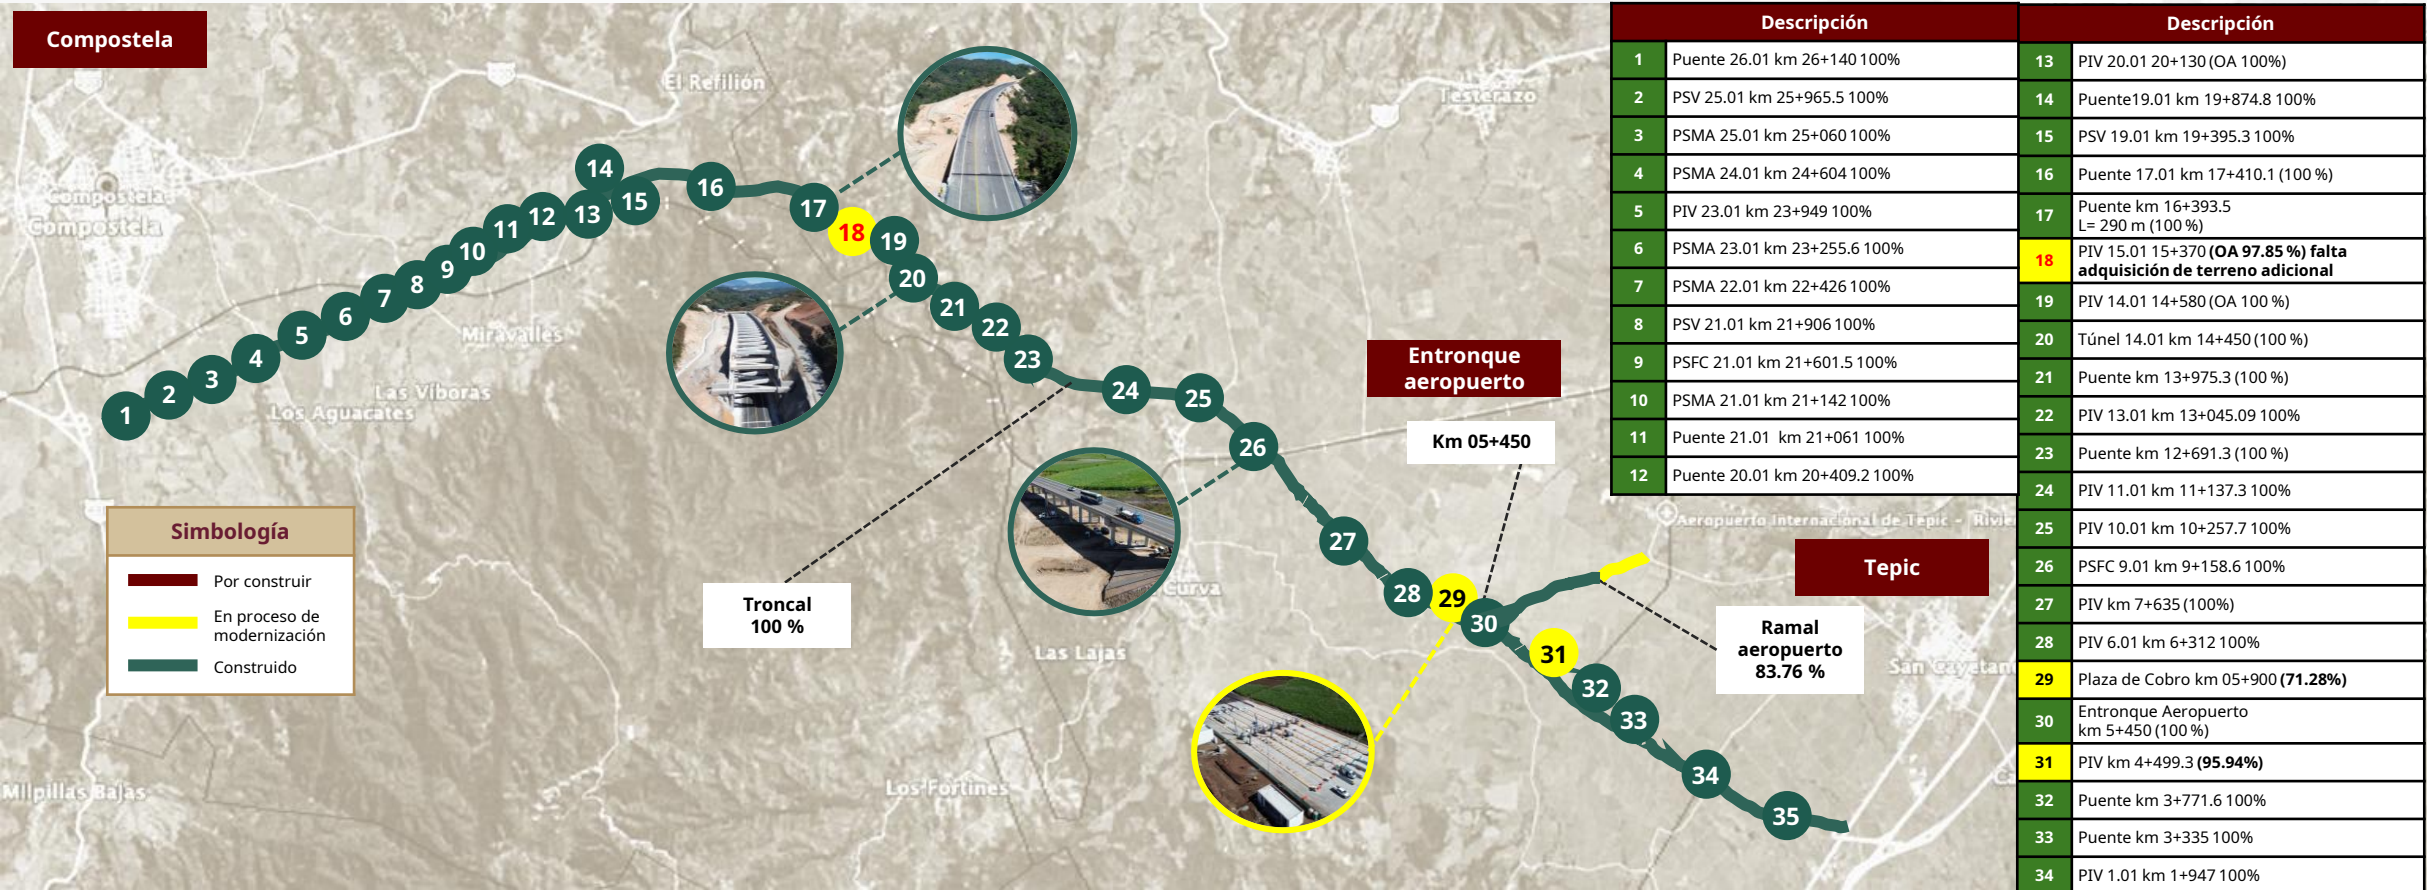

2025
Año de
La Mujer
Indígena


Avance físico

- Programado: 100 %
- Real: 99.98%
- Financiero: 96.70 %
- Semanal: 0.003 %


Concesionaria: FONADIN

 **Inversión:** 2,473.43 mdp

 **Meta:** 28 km. 1 Túnel Falso, 1 Plaza de cobro, 10 Puentes, 2 PSFC, 1 Entronque (solo gazas) y 1 Entronque completo (Aeropuerto), 21 Cruces y Ramal Aeropuerto

 **Inicio:** Marzo 2023
Término: 31-Oct-2025

 **2,473** empleos directos generados P/MDI
4,946 empleos indirectos generados P/MDI

 **490 mil** habitantes beneficiados

 **35 minutos** de ahorro en tiempo

Nayarit

Tramo Tepic-Compostela




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

| Elemento | Meta | Ejecutado acumulable | Faltante | 28/11/25 al 04/12/2025 | | Observaciones |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------|
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| Terraplén (m3) | 2,095,966.26 | 2,092,899.62 | 3,066.64 | 2,000.00 | 2,500.00 | |
| Subyacente (m³) | 290,689.00 | 280,686.49 | 10,002.51 | 450.00 | 500.00 | |
| Puente 16.01 km 16+393.50 | | | | | | |
| Columnas | 8 | 8 | 0 | | | Trabajos concluidos. |
| Cortes (m³) Estabilización de taludes | 2,443,497.56 | 2,423,372.63 | 20,124.93 | | | |
| Obras de drenaje | 77 | 77 | 0 | | | Trabajos concluidos. |
| P.S.F.C. 9.01 km 09+158.50 | | | | | | |
| Losa (claro) | 7 | 7 | 0 | | | Trabajos concluidos. |
| P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50 | | | | | | |
| Junta de dilatación (pza) | 2 | 2 | 0 | | | |

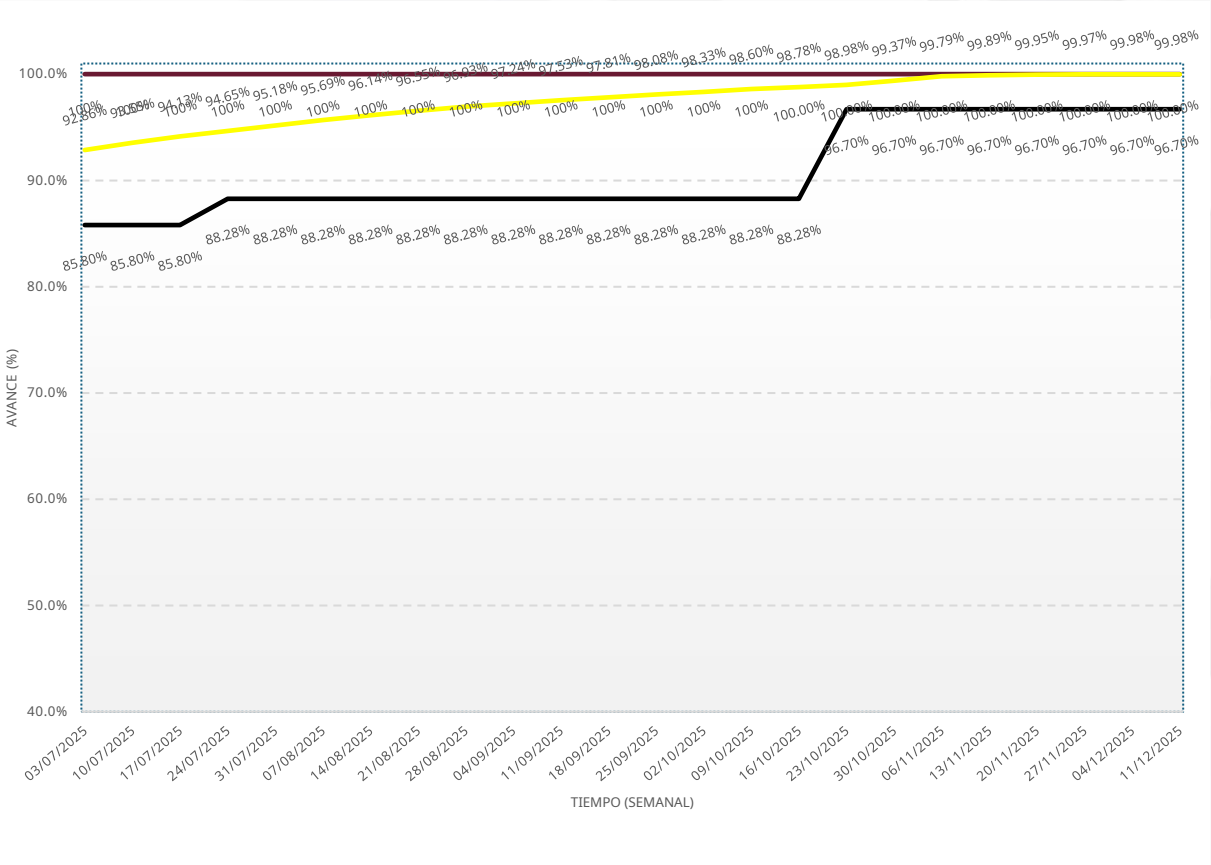

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

| | 28 de noviembre al 04 de diciembre | 05 de diciembre al 11 de diciembre |
|------------------------------|--|--|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 430 | 430 |
| Maquinaria | 68 | 68 |
| Frente de Trabajo | Ramal Aeropuerto, Plaza de Cobro km 05+900, PIV km 4+499.3 | Ramal Aeropuerto, Plaza de Cobro km 05+900, PIV km 4+499.3 |
