


Veracruz Autopista Cardel-Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

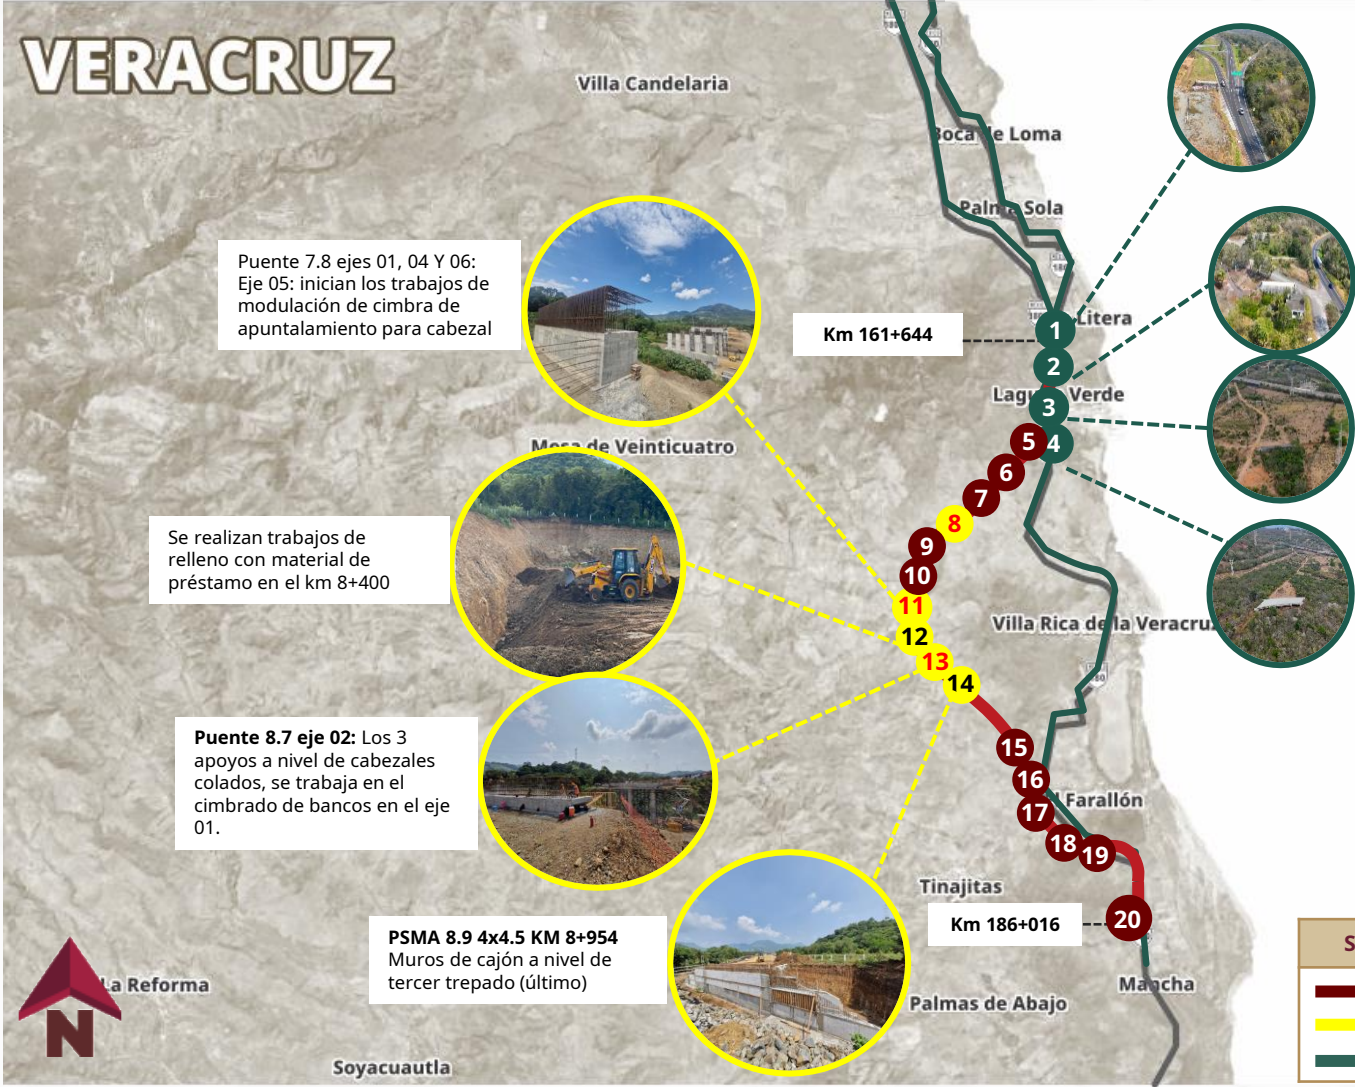

Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080
8	PIV 6.8 Km 6+806 (2.00%) se encontró material tipo 3, se realizaron sondeos para determinar el procedimiento a seguir. En espera de la propuesta técnica
9	PIV 7.04 Km 7+040
10	PUENTE 7.3 Km 7+330
11	PUENTE 7.8 Km 7+860, (25.00%) en espera de suministro y montada de trabe.
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%)
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (30.00%) en espera de suministro y montada de trabe.
14	PSMA 8.9 Km 8+960, (65.00%)
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Simbología	
	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

- Avance físico

- Programado: 32.76%

- Real: 19.18% Incluye

- Ent. Chapachapa

- Financiero: 8.19%

- Semanal: 0.46%
- Inversión: 2,252.78 mdp
- Inicio: Marzo de 2025

Término: Agosto de 2026
- Meta: 19.84 km, 5 Puentes,

1 Plaza de Cobro, 3 Entronques,

2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMAs, 43 ODTs

y el Entronque Chapachapa
- 6758 Empleos generados

2253 empleos directos y 4,506

empleos indirectos
- 128,000 habitantes beneficiados
- 45 minutos de ahorro en tiempo,




tramo 4

Veracruz Autopista Cardel-Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



Simbología	
	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512) (83.88%)
2	ODT 92+827.25 (100 %)
3	PSPyG 92+832.22 (100 %)
4	Ampliación de ODT 100+102, (100 %)

Avance físico

- Real: 83.88%
- Programado: 100 %
- Financiero: 16.56%
- Semanal: 7.38%

Veracruz Autopista Cardel-Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha



Gobierno de
México


Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	10/10/2025 al 16/10/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volúmenes de obra						
Corte	1,414,039.20	131,075.00	1,282,964.20	27,193.00	3,416.00	El volumen programado corresponde a los 19.8km y solo se trabaja en 5 km
Terraplén	1,155,915.50	125,592.49	1,030,323.01	20,641.00	2,154.00	El volumen programado corresponde a los 19.8km y solo se trabaja en 5 km
Subyacente	162,462.20	30,641.19	131,821.01	27,077.03	7,619.76	El volumen programado corresponde a los 19.8km y solo se trabaja en 5 km
Geotextil	265,880.00	102,003.05	163,876.95	26,588.00	8,124.95	El volumen programado corresponde a los 19.8km y solo se trabaja en 5 km
Estructuras Laguna Verde - La Mancha						
Cabezal	6	3	3	1	0	Trabajos de modulación de cimbra de apuntalamiento en eje 05 para fondo y armado de cabezal del Pte. 7.8, Km 7+860
Cabezal	3	3	0	0	0	Trabajos de cimbrado de bancos en eje 02, se esta a la espera de montaje de trabe del Pte. 8.7, km 8+665
Aleros	4	3	1	1	0	Trabajos de cimbrado en aleros muro tipo I y II para colado de remate en entrada y salida del PSMA 8.9, Km 8+954
Muros	3	3	0	0	0	Se concluyeron los trabajos de muros en ODT 9.2, Km 9+212
Losa superior	2	2	0	0	0	Se concluyeron los trabajos de colado en losa superior en ODT 9.2, Km. 9+212
Aleros	4	0	4	2	0	Se inician los trabajos de armado de acero de refuerzo en zapatas para aleros de entrada en ODT 9.2, Km. 9+212
Aproches	1	0	1	1	0	Se inician los trabajos de aproche en PSPyG 9.4, Km 9+478
Losa superior	4	2	2	2	0	Continúan los trabajos de armado de acero de refuerzo en losa del modulo 1 y se concluyeron en modulo 4 en ODT 10.8 Km. 10+885
Muros	8	8	0	0	0	Colado de muros 2do trepado en modulo 4 de ODT 10.8, Km 10+885

Entronque Chapachapa						
Volúmenes de obra						
Carpeta Asfáltica	657.00*	566.34	90.64	164.25	138.25	

* Volumen total incluyendo rotondas que no se ejecutaron

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

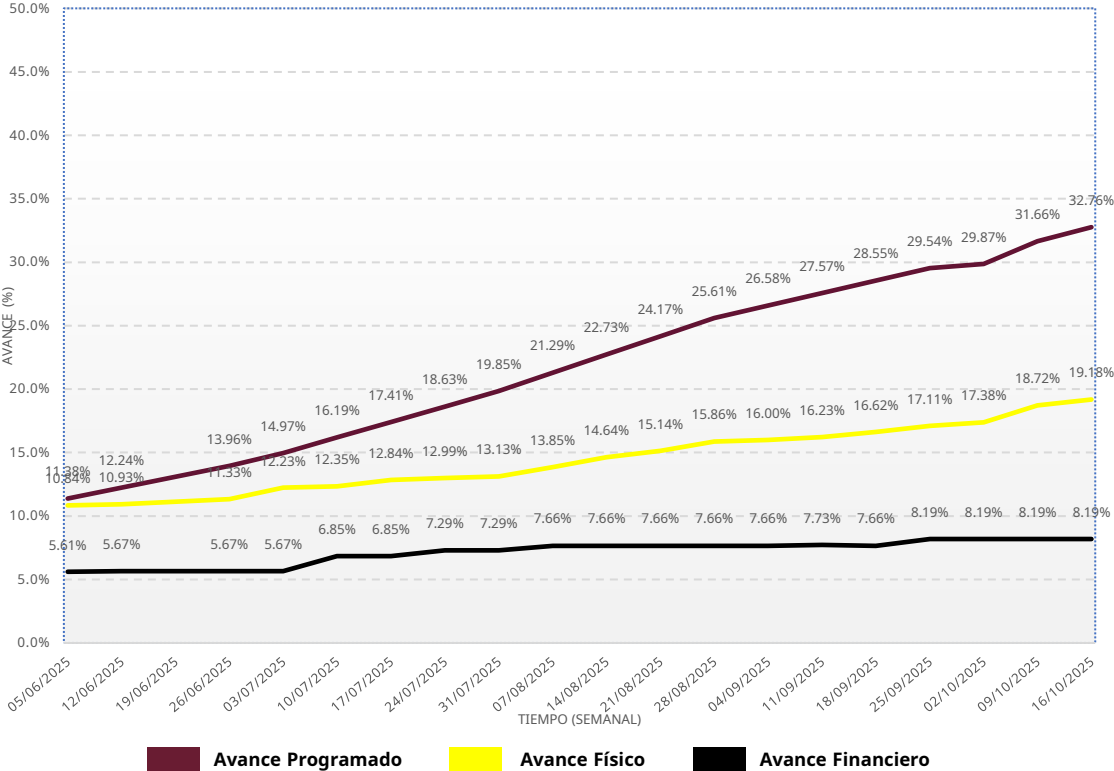

	03 de octubre al 09 de octubre	10 de octubre al 16 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	235	173
Maquinaria	38	26
