




Estado de México




Atizapán - Atlacomulco



2025
Año de
La Mujer Indígena

- **Inversión: 9,865.8** mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)
- **Meta:** 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 79 PSVyG


- **Inicio:** 01 marzo 2016
Término: 30 junio 2027
- **Avance físico:**
 - Programado: 88.00%
 - Real: 47.10%
 - Financiero: 24.11%
 - Semanal: 00.20%

- **132,909** empleos generados (44,303 directos y 88,606 indirectos)
- **1 millón 244 mil** habitantes beneficiados
- **60 minutos** de ahorro en tiempo

Estado de México

Atizapán - Atlacomulco

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

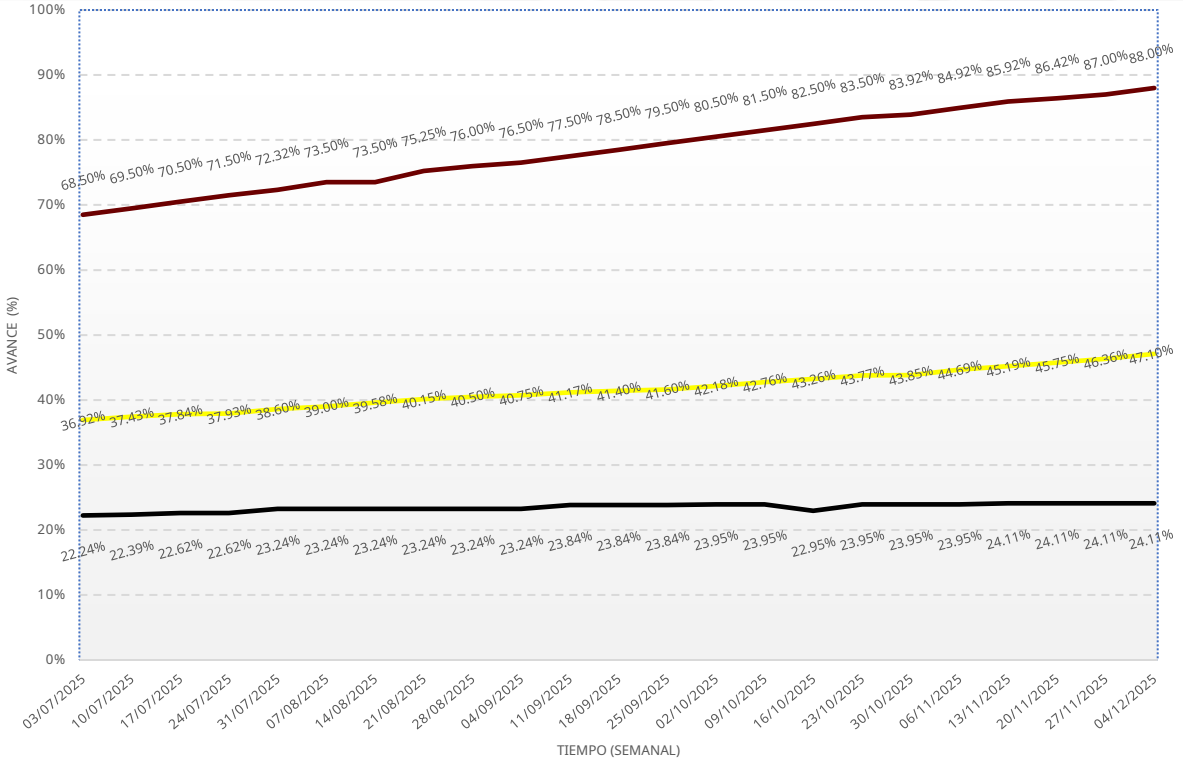

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 21 de noviembre al 27 noviembre	28 de noviembre al 04 diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	1,921	1,942
Maquinaria	497	503
Frente de trabajo	Tramos 1, 2A y 2B	Tramos 1, 2A y 2B



2025
Año de
La Mujer
Indígena
