




# Nayarit

## Las Varas-Puerto Vallarta (tramo III)

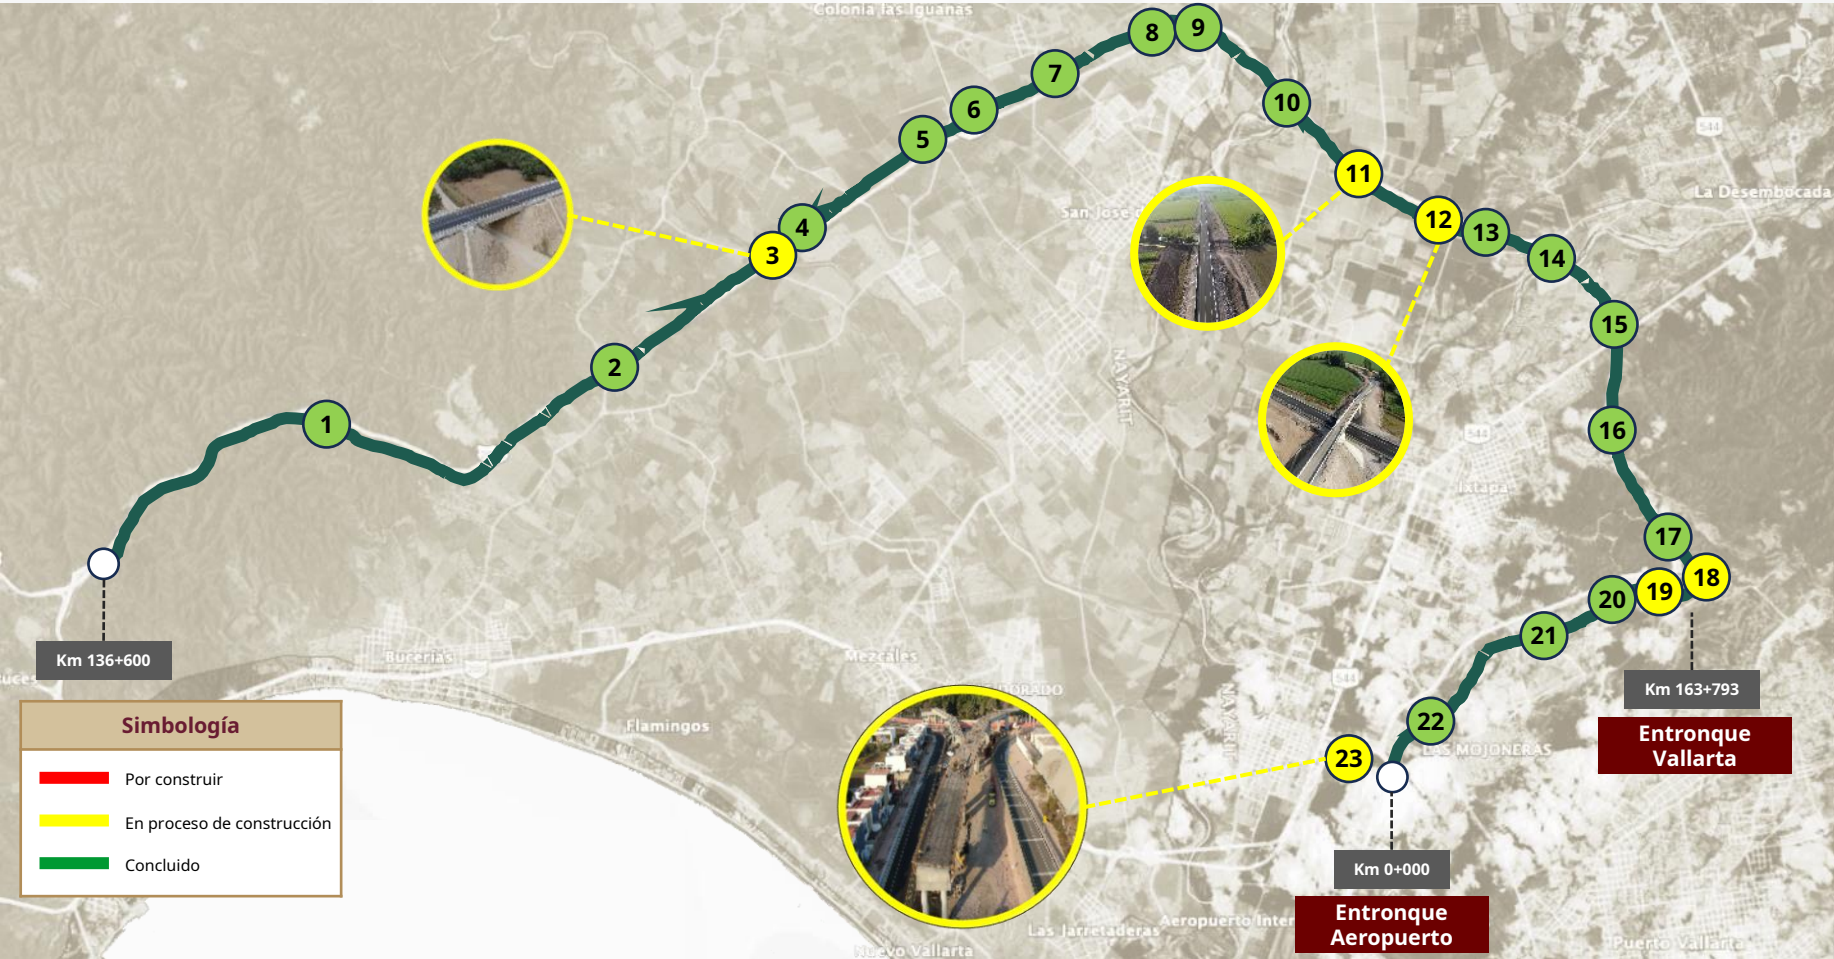


Descripción	
1	Puente rio Las Animas km 240+401
2	PIV 2V a zona agrícola km 144+237
3	PSV 1 V Sin Nombre km 146+700, (98.9%)
4	Puente canal de riego km 146+800
5	PIV El Naranjo km 148+260
6	Puente canal con camino de servicio km 149+597
7	PSV a valle de Candras km 151+496.22
8	PSV km153+225
9	PSV a San José del Valle km 153+538.25
10	Puente Rio Ameca km 154+903.25
11	Puente Canal km 156+754.01, (98.7%)
12	PIV a San José del Valle km 157+663, (98.5%)
13	Puente canal de riego km 158+876
14	Puente Mascota km 159+302
15	PSV Pto. Vallarta- Las Palmas km 160+427
16	Puente Santo Domingo km 162+181
17	PSV km 163+005
18	PSV km 163+452, (98.0%)
19	Entronque Vallarta km 163+793, (15.0%)
20	PSV km 4+690
21	PSV km 3+018.9
22	PSV A.V. México km 1+000.13
23	Entronque Aeropuerto km 0+000, (74.0%)


**Inversión total: 2,577 mdp**


**Inicio:** septiembre de 2022  
**Término:** abril de 2025, inaugurada y puesta en operación diciembre de 2024 (pendiente complementaria)


**Concesionaria:** IDEAL


**Meta:** 2.47 km  
6 puentes, 3 estructuras de cruce y 2 entronques

**Avance físico:**  
Programado: 99.16%  
Real: 93.25%  
Semanal: 0.05%  
Financiero: 87.52%

**Avance de obra pendiente:** Real: 6.75%

**5,500** empleos generados

**Más de 50,000** habitantes beneficiados


**30 minutos** de ahorro en tiempo

# Nayarit

## Las Varas-Puerto Vallarta (tramo III)

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	23/05/25 al 29/05/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Entronque Vallarta Eje 10						
Losa super estructura (m³)	435.0	281.5	153.5	52.9	57.9	Colado de losa 4-5
Entronque Vallarta Eje 20						
Losa super estructura (m³)	282.3	122.0	162.3	35.6	62.6	Colado de losa 2-3
PSV 1V sin nombre km 146+700						
Muro de contención (m³)	377	327	50	0	63	Trabajos con retraso para la fecha del 31 de marzo.
Puente canal de riego 158+876						
Muro de contención (m³)	479	479	0	0	144	Muro Concluido.

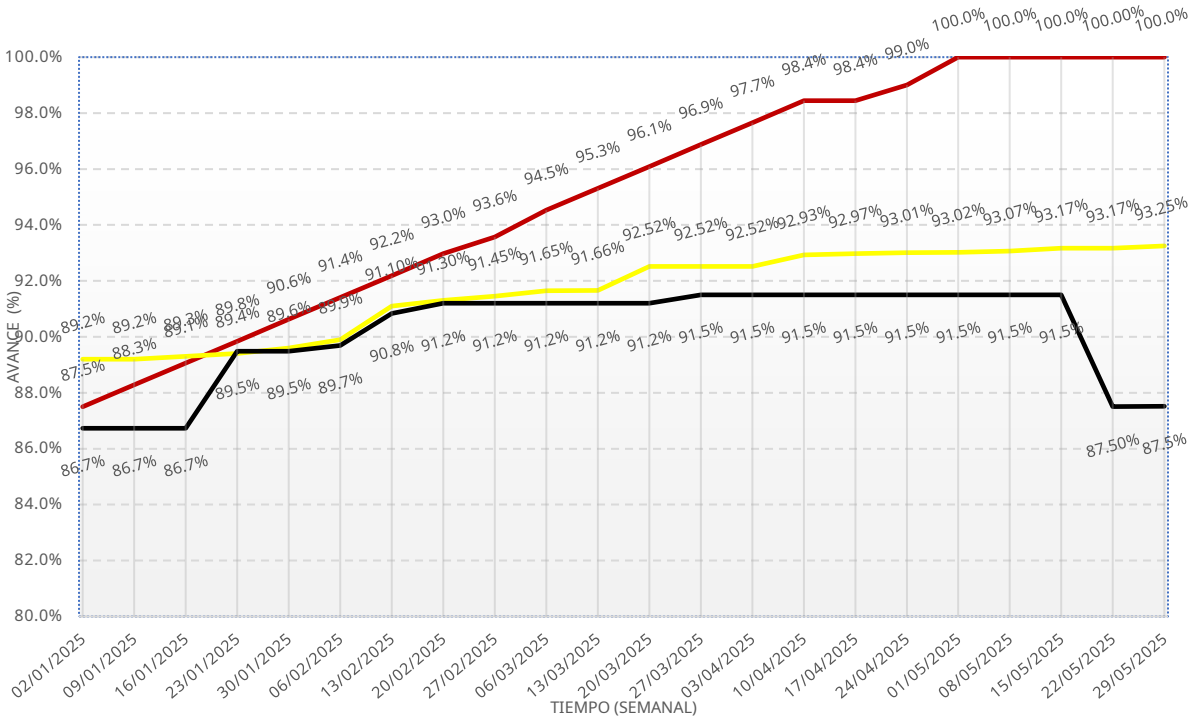

Avance Programado    Avance Físico    Avance Financiero

	Del 16 de mayo al 22 de mayo	Del 23 de mayo al 29 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	293	297
Maquinaria	22	22

