


# Chiapas

## Entronque San Cristóbal

Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV

- Avance físico:**
  - Programado: 0.00%
  - Semanal: 0.00%
  - Real: 25.17%
- Avances:**
  - En septiembre se prevé el reinicio de las obras para la conclusión del entronque.
  - El proyecto ejecutivo se encuentra autorizado y el derecho de vía necesario modificado.

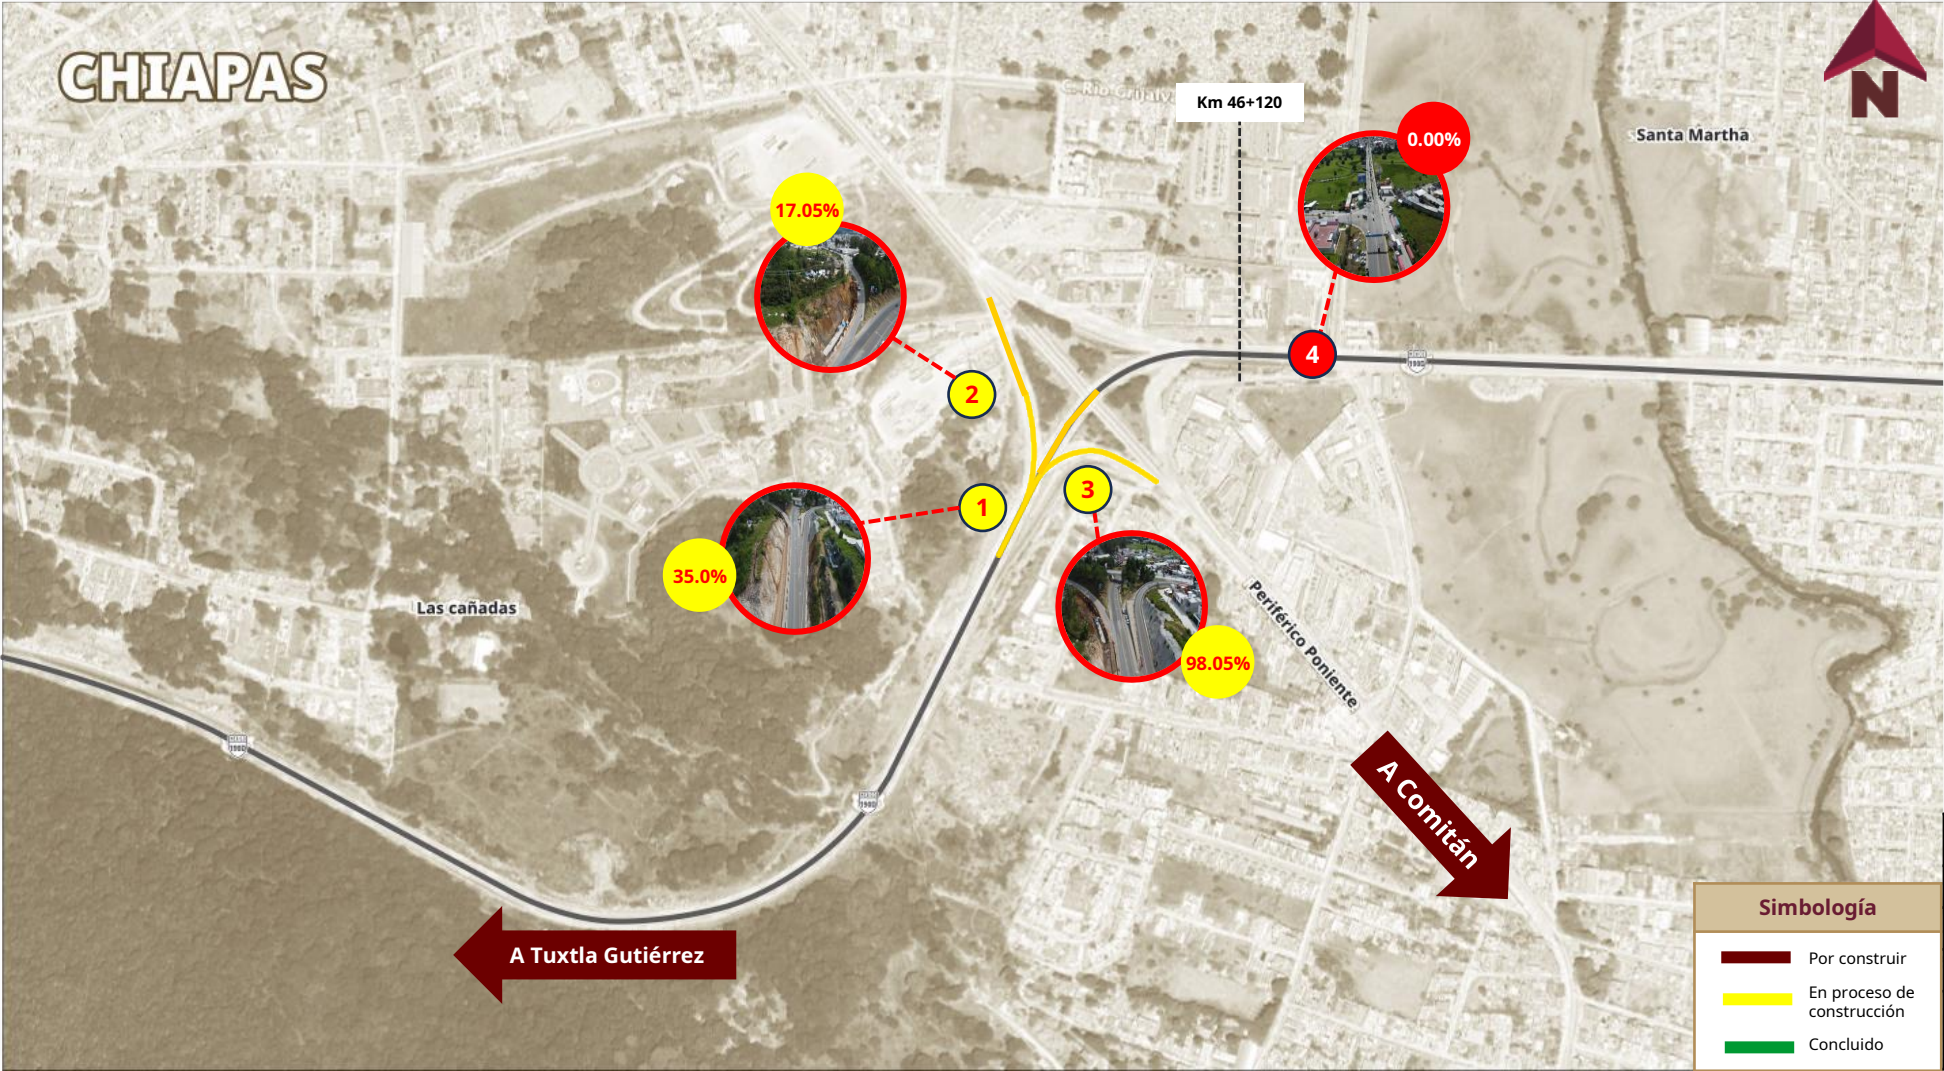

- **Inversión:** 44.96 mdp
- **Meta:** 1 Entronque
- **Avance físico:**

- Real: 25.17%
  - Financiero: 22.96%
- **Inicio:**

**Término:** Por definir
- **135** empleos generados
- **200,000 mil** habitantes beneficiados

- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
  - Disminución de accidentes.
  - Se evitan vueltas prohibidas.

Descripción		Observaciones
1	Eje 50: 35.00%	La Concesionaria esta a la espera del oficio de autorización por parte de la SICT, para la reanudación de los trabajos del Entronque
2	Eje 2: 17.05%	
3	Eje 20: 98.05%	
4	Eje 4 (Glorieta a nivel de piso): 0.00%	
