

# Oaxaca

## Mitla – Entronque Tehuantepec II




### Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes


- Avance físico**
  - Programado: 100%
  - Real: 99.12%
  - Semanal: 0.02%
- Avance obra pendiente**
  - Real: 97.37%
- Avance financiero**
  - Real ejercido: 97.37%
  - Real pagado: 88.53%
  - Con un adeudo de: 8.84%


*\*Nota: Se tiene una deuda de 2,621.89 mdp que representa el 8.84% por trabajos ejecutados, dicho monto continua en conciliaciones por lo que se podría modificar*

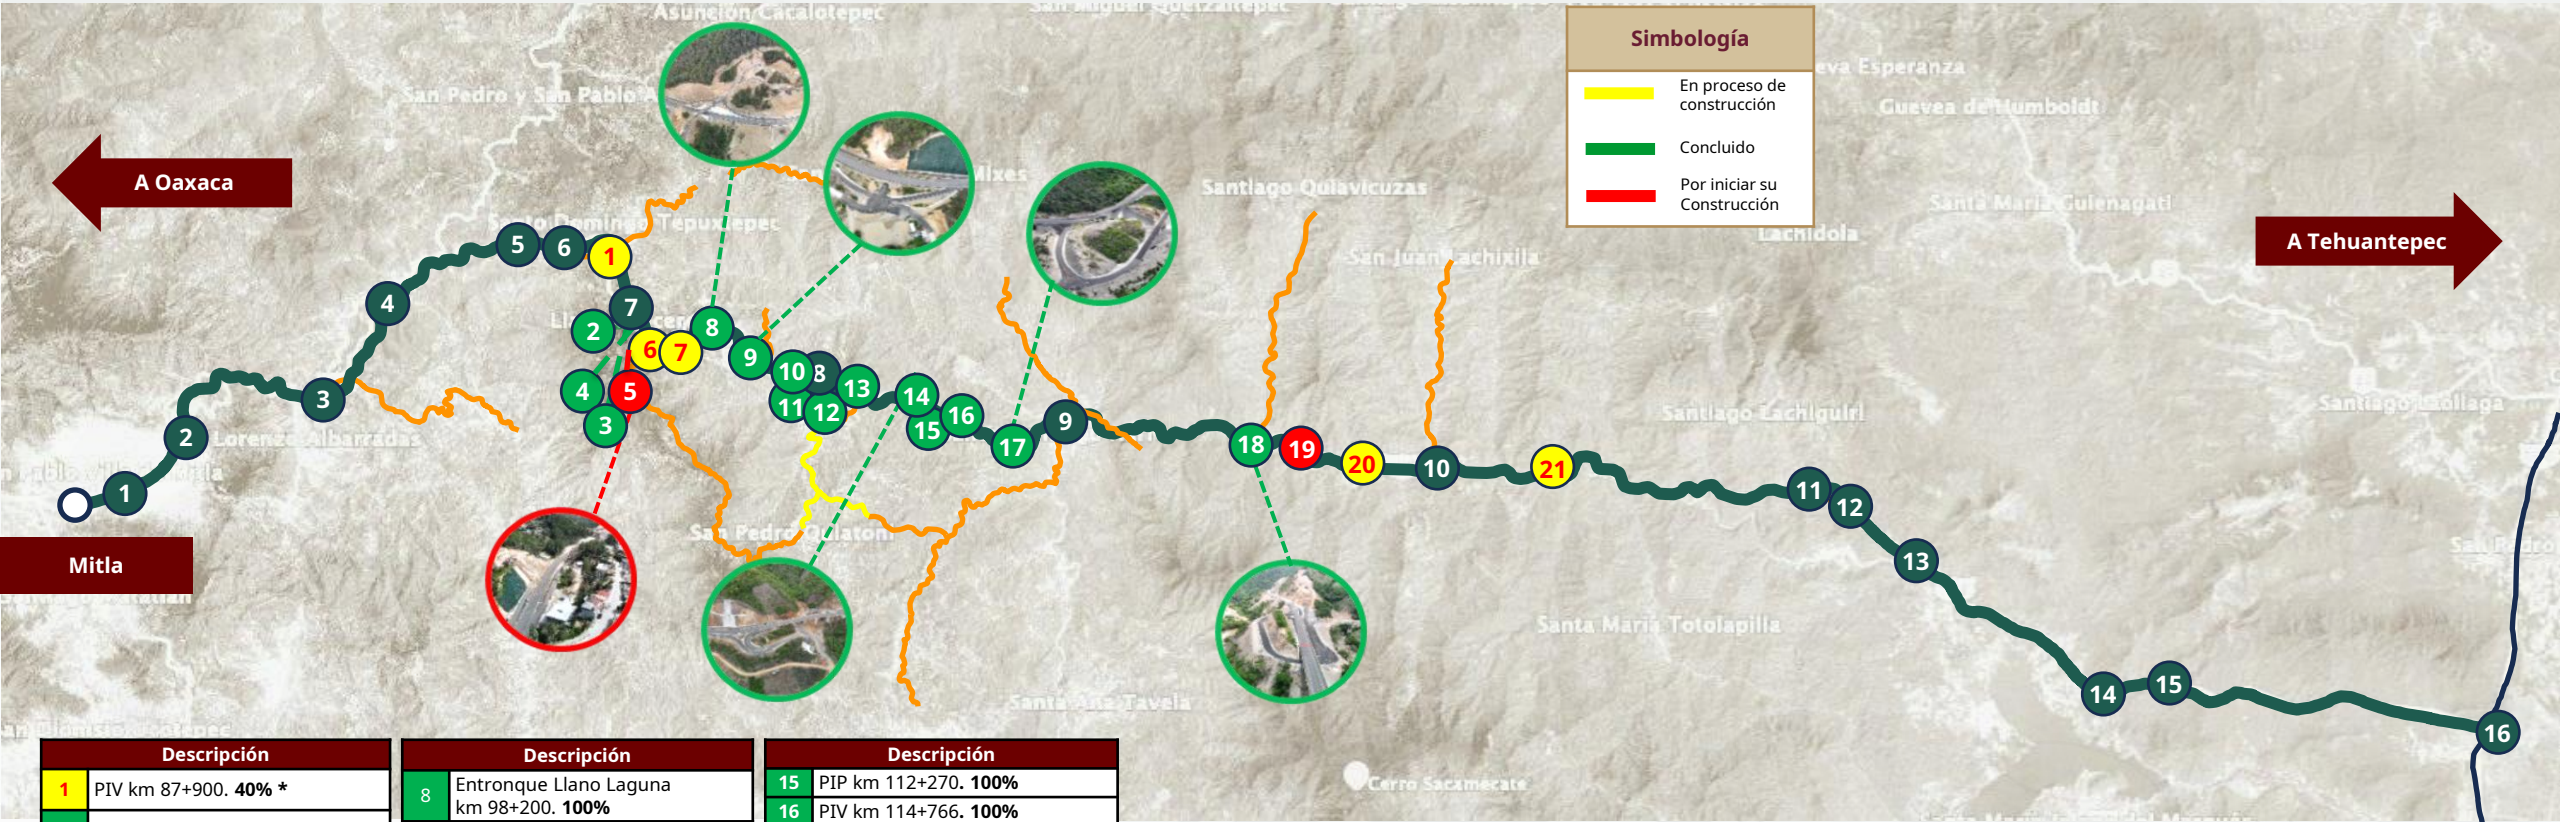



Descripción		Descripción		Descripción	
1	PIV km 87+900. 40% *	8	Entronque Llano Laguna km 98+200. 100%	15	PIP km 112+270. 100%
2	PIP km 91+530. 100%	9	Entronque Cerro Pascale km 100+500. 100%	16	PIV km 114+766. 100%
3	PIPR km 92+436. 100%	10	PIP km 106+570. 100%	17	Entronque Agua Blanca Km 122+600. 100%
4	PIV km 92+438. 100%	11	PIP km 108+570. 100%	18	Entronque Quiavicuzas Km 137+900. 100%
5	PIP km 92+680. 0% *	12	PIV km 109+247. 100%	19	Túnel El Tornillo km 139+400 (Colapsado). En elaboración proyecto del viaducto.
6	Entronque Llano Crucero km 92+690. 82% *	13	PIV km 110+460. 100%	20	PIPG Km 146+840. 95% *
7	Muro de pilas km 92+700. 32% *	14	Entronque Danigare km 111+600. 100%	21	PIPG km159+400. 95% *


\* No hay avances debido a la falta de asignación de recursos


**Inversión:** 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos


**Término:** Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)

**Meta:** 65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques, 2 casetas y 17 pasos de servidumbre. En proceso: Trabajos en la troncal, 1 entronque y 8 pasos de servidumbre

**Nota:** De los pasos de servidumbre 9 están terminados, 2 con un 95%, 1 al 40% y 5 sin iniciar  
El Túnel Tornillo se encuentra colapsado y en proceso de determinar su solución

**30** Empleos directos generados  
**60** Empleos indirectos generados

**+1 millón 400 mil** habitantes beneficiados

**2 hrs.** de ahorro en tiempo

**Concesionaria:** IDEAL

# Oaxaca


## Mitla – Entronque Tehuantepec II

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	05/12/25 al 11/12/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Muro de pilas km 92+700						
Perforación de pilastrones	38	17	21	0	0	• Trabajos suspendidos por falta de asignación de recursos.
Armado y colado de pilastrones	38	17	21	0	0	

**Nota:** No existen avances debido a la considerable deuda que se tiene con las empresas contratadas por la concesionaria a la fecha y la falta de recursos presupuestales.

### Maquinaria

Gruas para montaje de trabes (3) Inactivo

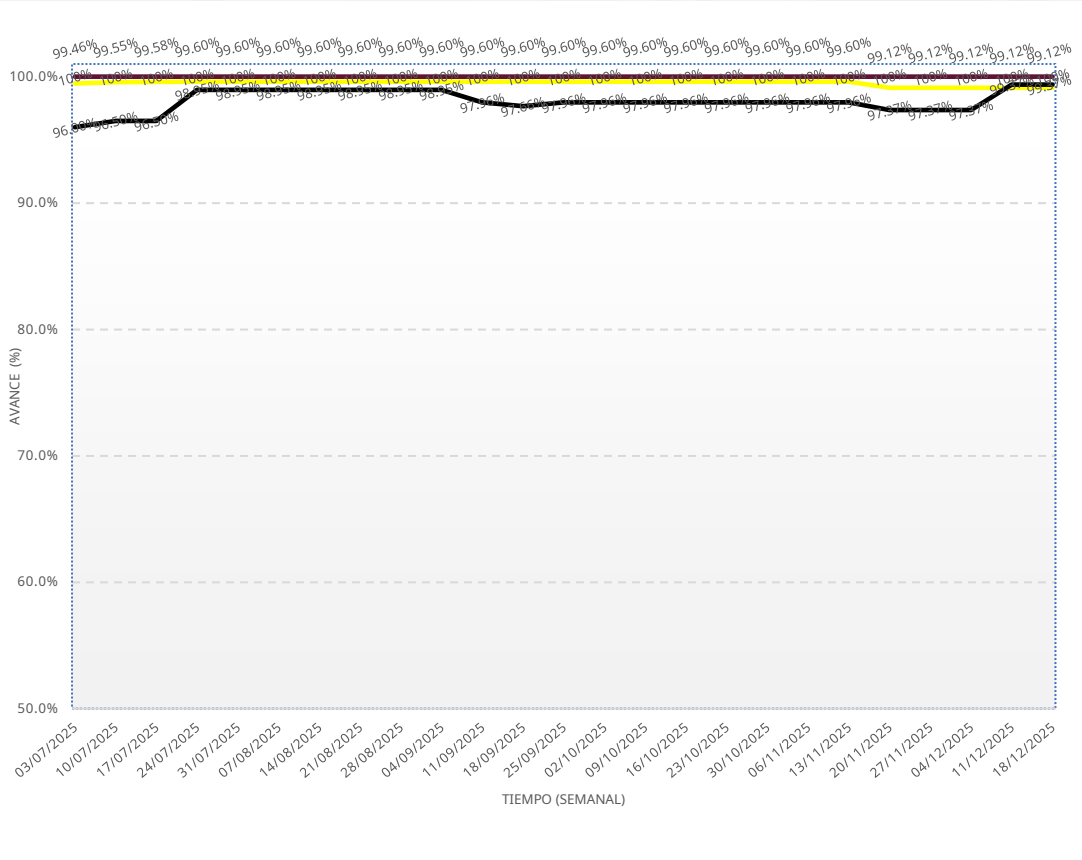

Avance Programado

Avance Físico

Avance Financiero

	28 de noviembre al 4 de diciembre	05 de diciembre al 11 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	30	30
Maquinaria	7	3
Frente de Trabajo	No Aplica	No Aplica
