


Michoacán


Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

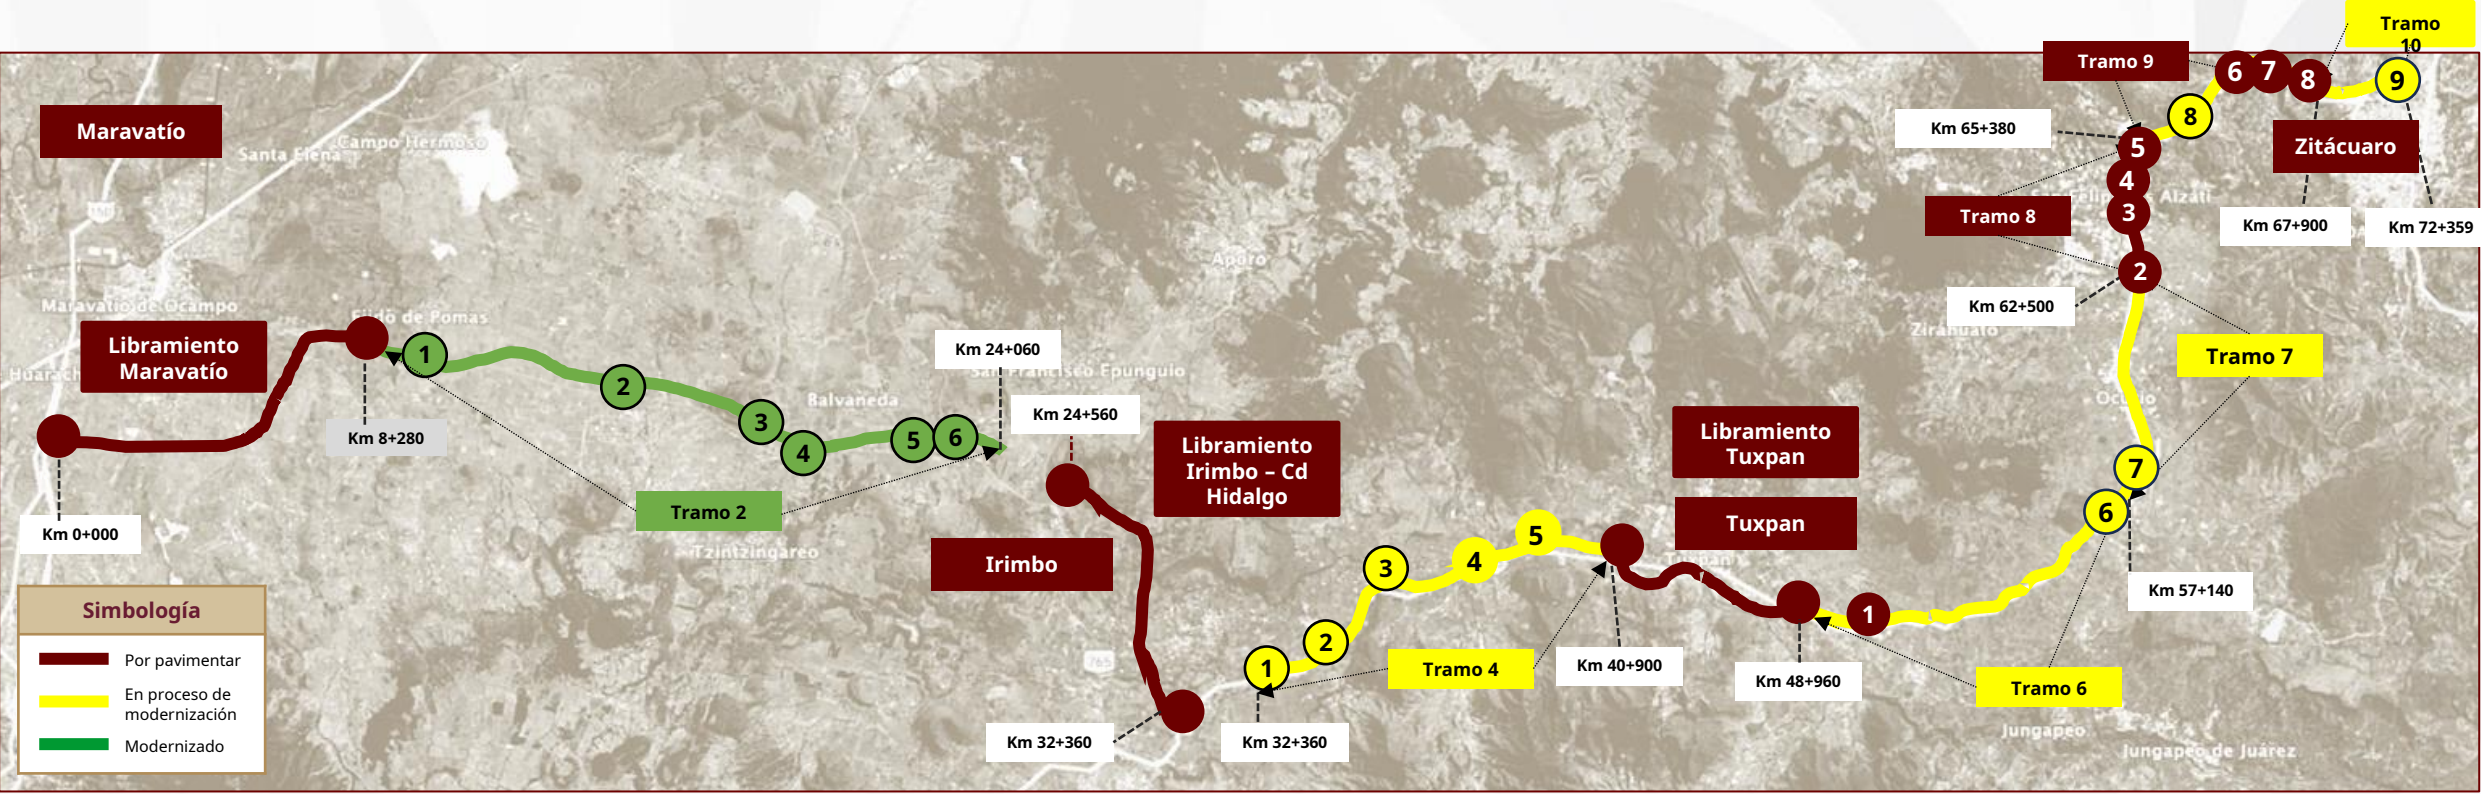


Descripción		Avance	Descripción	
1	Entronque Santa Rosa km 32+420	78.00%	1	Puente Obispo Km 50+400
2	Entronque Ziranda-Jaripeo km 32+420	76.32%	2	Entronque Zirahuato km 62+620
3	Puente Turundeo Km 36+460	73.00%	3	Entronque San Felipe I km 64+400
4	Entronque Turundeo I km 37+550	76.37%	4	Entronque San Felipe II Km 64+640
5	Entronque Turundeo II km 38+780	84.00%	5	Entronque Macutzio km 65+620
6	Entronque Jungapeo km 56+700	51.24%	6	Entronque Curungueo I Km 68+200
7	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700	35.94%	7	Entronque Curungueo II Km 68+400
8	Entronque Valle Verde km 67+220	43.50%	8	Puente San Juan Viejo Km 69+860
9	PSV Zitácuaro Km 72+160	25.00%		

Avance físico


- Programado: 48.04%
- Real: 41.51%
- Semanal: 0.60%
- Financiero: 0.00%




Inversión: 4,575.3 mdp
Inversión 2020-2025: 3,321 mdp




Meta: 71.3 Km
Meta 2020-2025: 41 km




Inicio: septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 30 de enero de 2027



4,800 empleos generados



126,000 habitantes beneficiados



Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío



Gobierno de
México


Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 06 jun al 12 jun 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	611,478.80	94,079.20	2,931.77	1,327.95	DISMINUYE RITMO DE TRABAJO, DEBIDO A TEMPORADA DE LLUVIAS. SE INCREMENTARÁ EL EQUIPO EN SITIO.
Terraplén (m3)	445,687.00	280,143.40	165,543.60	0.00	3,979.53	CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9
Subyacente (m3)	256,097.00	206,378.22	49,718.78	0.00	1,122.90	CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN LOS TRAMOS 4, 6, Y 7
Subrasante (m3)	170,688.00	133,240.28	37,447.73	612.96	180.43	DISMINUYE RITMO DE TRABAJO, DEBIDO A TEMPORADA DE LLUVIAS. SE INCREMENTARÁ EL EQUIPO EN SITIO.

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 06 jun al 12 jun 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	75,285.69	50,373.35	1,132.51	1,390.46	CONTINUAN TENDIDOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7
Bacheo (m3)	1,800.00	811.50	988.50	0.00	28.50	SE REALIZAN BACHEOS EN TRAMO 7 Y 9
Fresado (m3)	10,676.00	9,162.11	1,513.89	48.96	45.11	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 6 Y 7
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	15.47	14.77	0.33	0.35	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 6 Y 7
Geomalla (m2)	84,520.00	34,089.60	50,430.40	2,282.88	2,213.20	SE REACTIVAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4 Y 7.
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	80,440.13	39,973.92	2,135.77	1,658.60	EL AVANCE DEPENDE DE LOS FRENTES DE TRABAJOS DISPONIBLES. SE ABRIERON FRENTES DE TRABAJO EN TRAMOS 6 Y 7.
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	12,676.15	32,571.65	0.00	0.00	AÚN NO INICIA LA PRODUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PLANTA JUNGAPERO. EL AVANCE SE COMPENSARÁ CON EL ALTO RENDIMIENTO EN LA COLOCACION DE LA CAPA.

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 06 jun al 12 jun 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PUENTETURUNDEO	1.00	0.99	0.01	0.00	0.00	MONTAJE DE TRABES EN CLARO A1 - A2
PIV JUNGAPERO	1.00	0.80	0.20	0.00	0.01	CONTINUA EL CORTE DE TN EN GAZAS
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.57	0.43	0.00	0.04	COLADO DE CABEZAL DE APOYO 03
MURO DE CONTENCIÓN MT4	200.00 ml	198.92 ml	1.08 ml	0.00 ml	0.73 ml	ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE ZAPATAS Y MURO

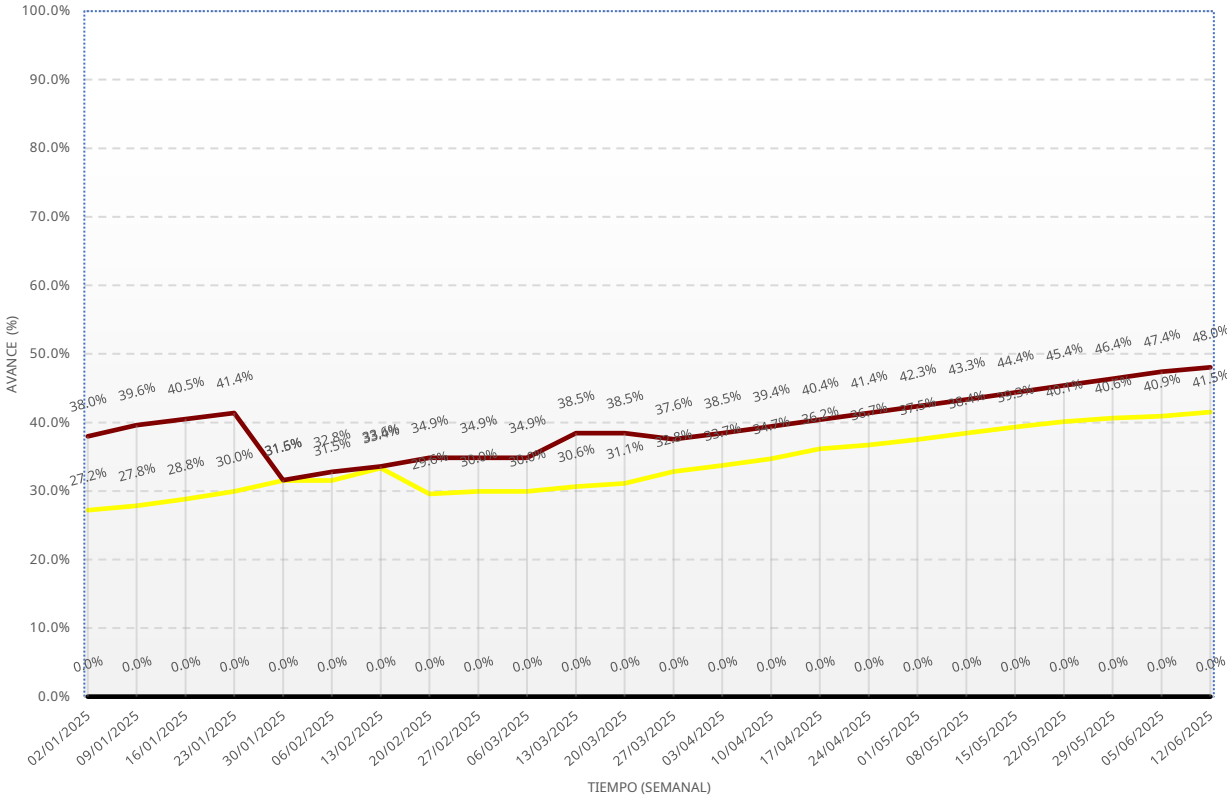

Avance Programado Avance Físico *Avance Financiero

* No presenta avance financiero

	Del 30 de mayo al 05 de junio	06 de junio al 12 de junio
Fuerza de Trabajo (personas)	277	279
Maquinaria	181	182
