


Nayarit ok

Las Varas-Puerto Vallarta (tramo III)



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

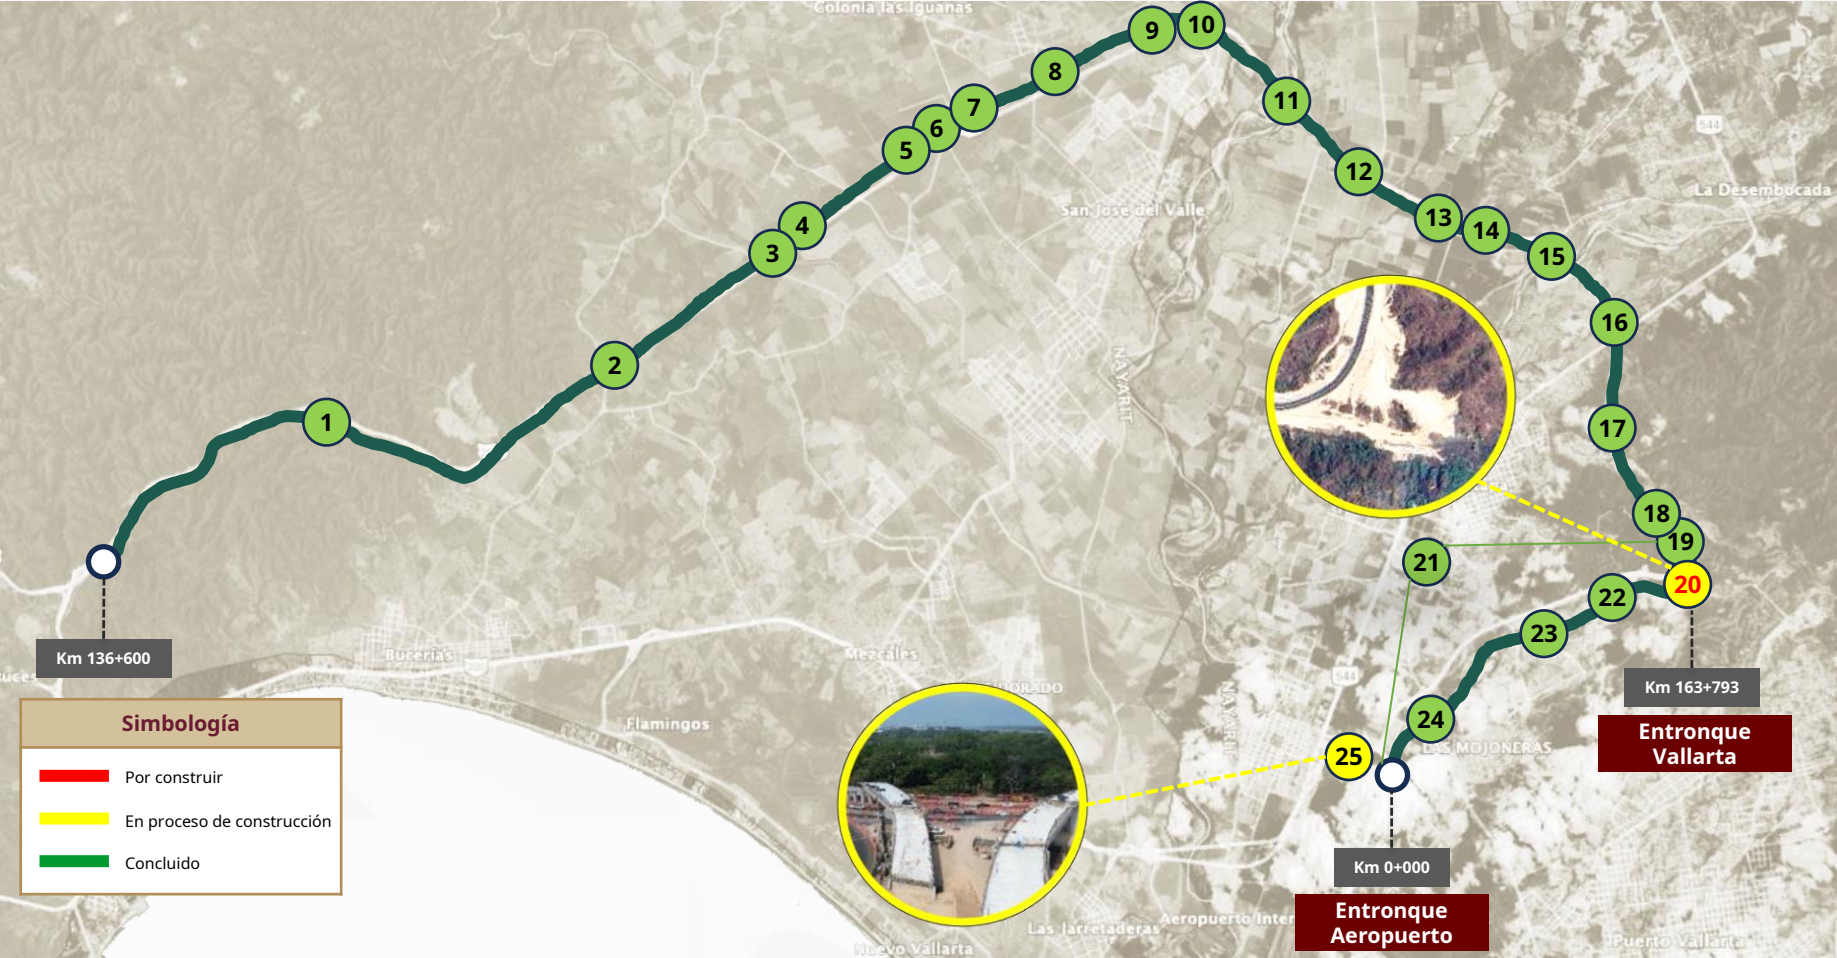

Inversión total: 2,577 mdp



Inicio: septiembre de 2022
Término: septiembre de 2025, inaugurada y puesta en operación diciembre de 2024 (pendiente complementaria)

Concesionaria: IDEAL



Meta: 34.9 km
8 puentes, 13 estructuras de cruce, 2 entronques, 1 plaza de cobro y 1 ramal



Avance físico:
Programado: 100%
Real: 93.77%
Semanal: 0.10%
Financiero: 90%



Avance de obra pendiente: Real: 6.23%



5,500 empleos generados



Más de 50,000 habitantes beneficiados



30 minutos de ahorro en tiempo


Descripción

1	Puente rio Las Animas km 240+401
2	PIV 2V a zona agrícola km 144+237
3	PSV 1 V Sin Nombre km 146+700
4	Puente canal de riego km 146+800
5	PIV El Naranjo km 148+260
6	Plaza de cobro La Misión 148+700
7	Puente canal con camino de servicio km 149+597
8	PSV a valle de Candras km 151+496.22
9	PSV km153+225
10	PSV a San José del Valle km 153+538.25
11	Puente Rio Ameca km 154+903.25
12	Puente Canal km 156+754.01
13	PIV a San José del Valle km 157+663
14	Puente canal de riego km 158+876
15	Puente Mascota km 159+302
16	PSV Pto. Vallarta- Las Palmas km 160+427
17	Puente Santo Domingo km 162+181
18	PSV km 163+005
19	PSV km 163+452
20	Entronque Vallarta km 163+793, (15.0%) Sin asignación de recursos por la concesionaria.
21	Ramal Aeropuerto
22	PSV km 4+690
23	PSV km 3+018.9
24	PSV A.V. México km 1+000.13
25	Entronque Aeropuerto km 0+000, (80.3%)

Las Varas-Puerto Vallarta (tramo III)



Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	11/07/25 al 17/07/2025 Programado	Ejecutado	Observaciones
Entronque Vallarta. Eje 10.						
Montaje de trabes	49	46	3	0	1	Claro 0-1A.
Guarnición y parapeto	611.4	212.0	399.4	0	159.0	Claros 5-6, 6-7 y 7-8
MME	2,748	1,158.5	1,589.5	196.3	58.0	Esta semana se trabajó en continuar los rellenos del muro. La proxima semana se retoman con normalidad los trabajos de colocación de escamas.
Entronque Vallarta. Eje 20.						
Pilas de cimentación	31	31	0	0	2	Pilotes de apoyo 7
Columnas	25	25	0	0	2	Columnas apoyo 7
Cabezales	8	8	0	0	2	Cabezales apoyos 6A y 7
Fabricación de trabes	32	31	1	0	2	Colado de trabes claro 6A-7
Montaje de trabes	32	27	5	0	5	Claro 5-6.

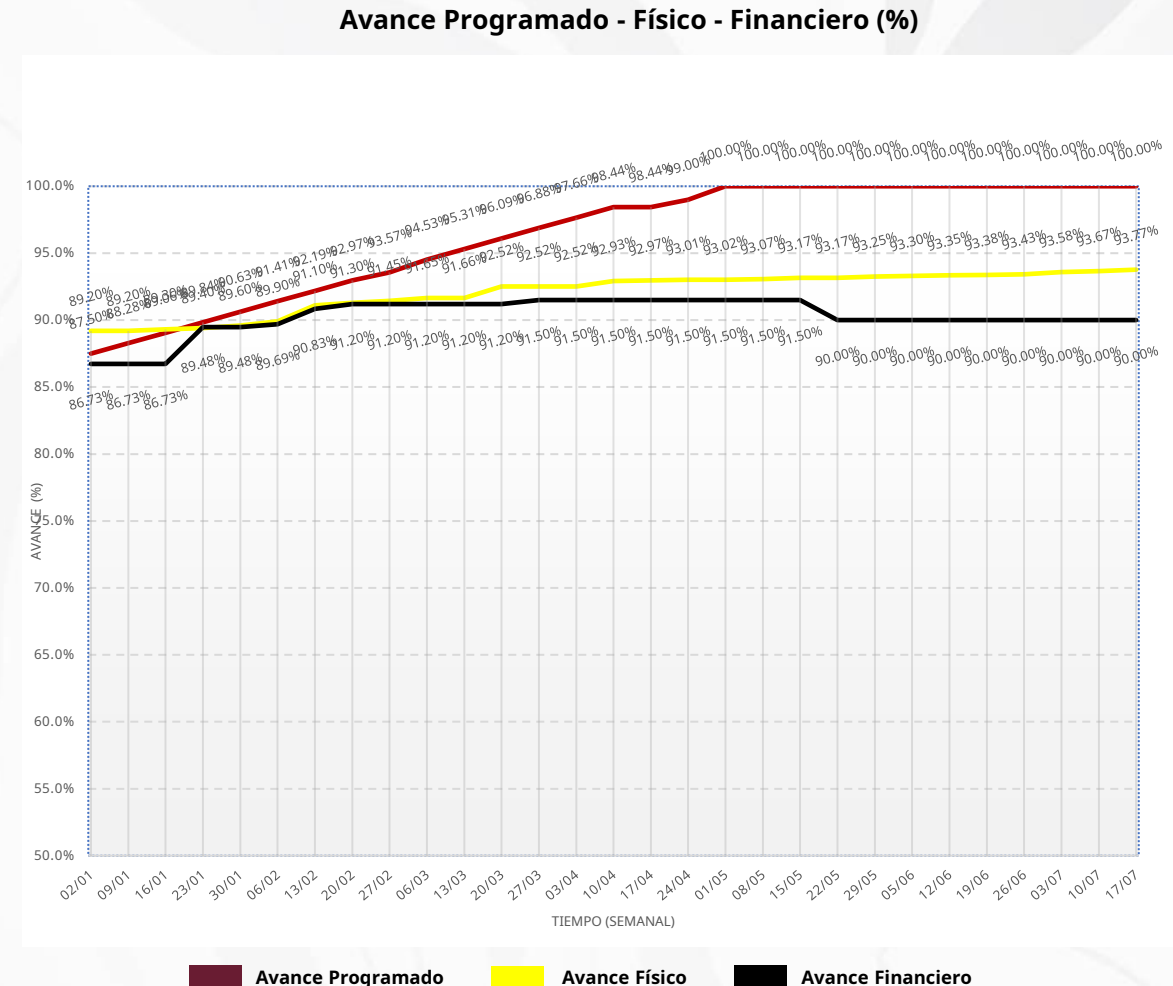

	Del 04 de julio al 10 de julio	Del 11 de julio al 17 de julio
Fuerza de Trabajo (personas)	298	301
Maquinaria	22	22
