


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro - Maravatío

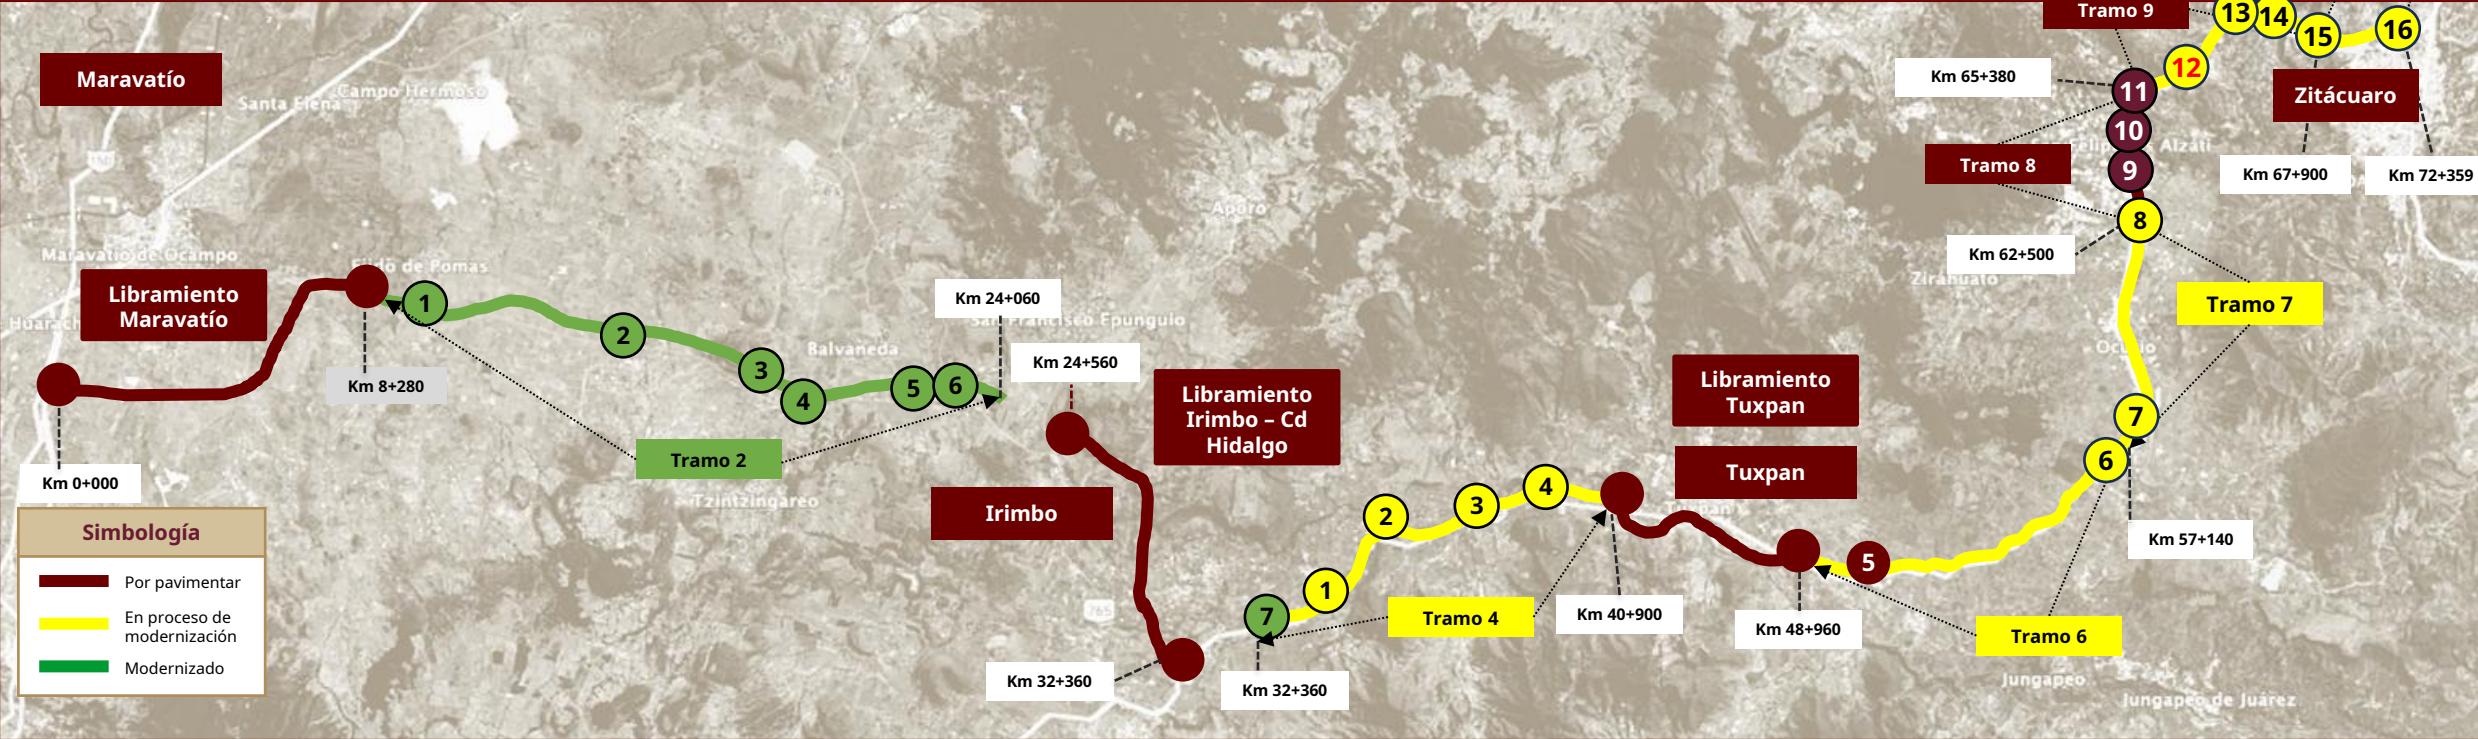

Descripción		Descripción	
1	Entronque Ziranda-Jaripeo km 32+420 (99.99%)	10	Entronque San Felipe II Km 64+640 (0.00%), Sin Iniciar
2	Puente Turundeo Km 36+460 (99.95%)	11	Entronque Macutzio km 65+620 (0.00%), Sin Iniciar
3	Entronque Turundeo I km 37+550 (99.90%)	12	Entronque Valle Verde km 67+220 (69.04%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
4	Entronque Turundeo II km 38+780 (99.55%)	13	Entronque Curungueo I Km 68+240 (69.87%)
5	Puente Obispo Km 50+400 (0.00%), Sin Iniciar	14	Entronque Curungueo II Km 68+780 (69.87%)
6	Entronque Jungapeo km 56+700 (71.59%)	15	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (76.14%)
7	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (66.28%)	16	PSV Zitácuaro Km 72+160 (82.65%)
8	Entronque Zirahuato km 62+500 (29.81%)	Nota: Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal, o no han iniciado.	
9	Entronque San Felipe I km 64+400 (0.00%), Sin Iniciar		

Avance físico

- Programado: 57.45%
- Real: 54.42%
- Semanal: 0.50%
- Financiero: 8.11%



Inversión: 4,575.3 mdp



Meta: 71.3 Km



Inicio: septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: Diciembre de 2026



4,800 empleos generados



126,000 habitantes beneficiados



Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán


Modernización Carretera Zitácuaro - Maravatío



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

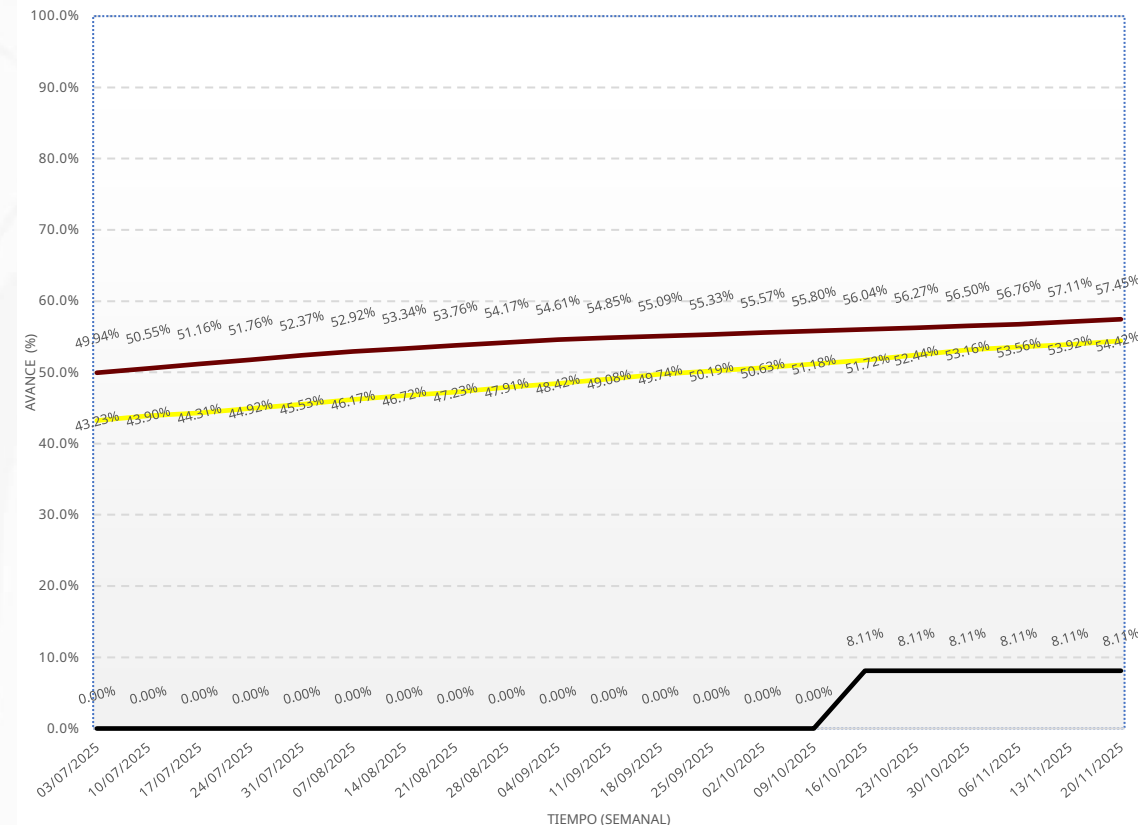

Avance Programado

Avance Físico

*Avance Financiero

* No presenta avance financiero

	07 AL 13 NOVIEMBRE 25	14 AL 20 NOVIEMBRE 25
Fuerza de Trabajo (personas)	288	290
Maquinaria	188	192

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 14 nov al 20 nov 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	712,170.81	-6,612.81	2,706.96	942.20	NO SE HAN INICIADO TRABAJOS EN TRAMO 8
Terraplén (m3)	445,687.00	359,473.31	86,213.69	3,108.00	1,044.64	NO SE HAN INICIADO TRABAJOS EN TRAMO 8
Subyacente (m3)	256,097.00	242,218.50	13,878.50	252.96	1,163.75	
Subrasante (m3)	170,688.00	159,536.83	11,151.17	551.28	615.88	NO SE HAN INICIADO TRABAJOS EN TRAMO 8
PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 14 nov al 20 nov 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	106,083.40	19,575.64	1,351.25	945.56	NO SE HAN INICIADO TRABAJOS EN TRAMO 8
Bacheo (m3)	1,800.00	1,312.00	488.00	12.00	0.00	NO SE HAN INICIADO TRABAJOS EN TRAMO 8
Fresado (m3)	10,676.00	10,054.38	621.62	33.60	38.63	
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	24.99	5.25	0.57	0.16	NO SE HAN INICIADO TRABAJOS EN TRAMO 8
Geomalla (m2)	84,520.00	73,307.40	11,212.60	0.00	1,387.60	
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	104,787.81	15,626.24	576.12	625.45	
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	22,575.60	22,672.20	84.72	1,008.62	
ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 14 nov al 20 nov 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PUENTE TURUNDEO	1.00	1.45	0.00	0.00	0.05	TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA
PIV JUNGAPEO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.10	CONTINÚA EL CORTE DE TN EN GASAS Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.52	0.48	0.00	0.00	ARMADO DE TRABES EN SITIO, CONFORMACIÓN DE APROCHES DE ESTRIBOS.
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.89	0.11	0.00	0.01	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE ACCESO Y SALIDA.
BALIZAMIENTO	157,137.60 ml	52,248.06 ml	104,889.54 ml	0.00 ml	39.00 ml	
CUNETAS	12,028.95 ml	9,728.00 ml	2,300.95 ml	0.00 ml	34.40 ml	
BOTONES	12,041.00 pza	3,969.00 pza	8,072.00 pza	0.00 pza	15.00 pza	
