

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia


Avance físico

• Programado: 9.97 %

• Semanal: 0.12 %

• Real: 9.58 %

• Financiero: 0%

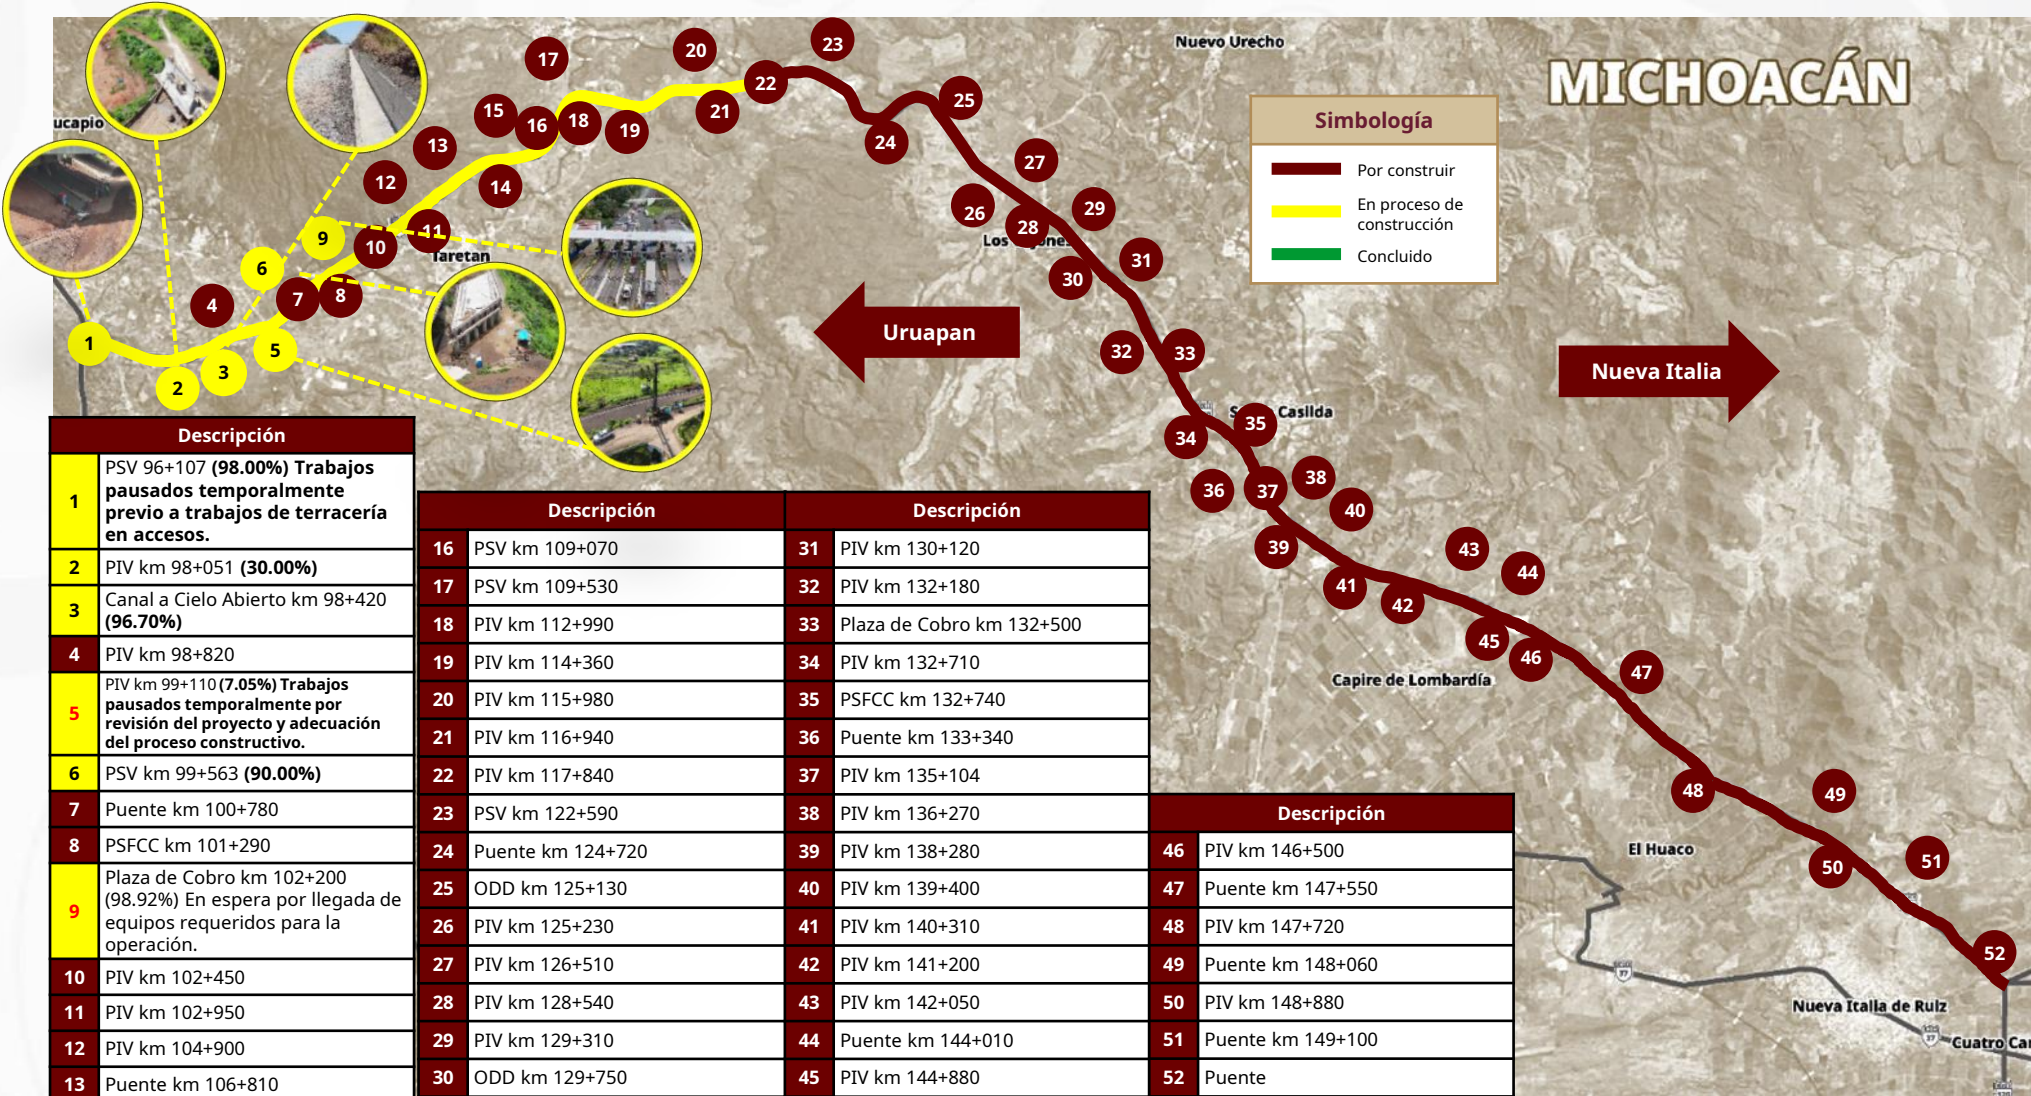

Descripción	
1	PSV 96+107 (98.00%) Trabajos pausados temporalmente previo a trabajos de terracería en accesos.
2	PIV km 98+051 (30.00%)
3	Canal a Cielo Abierto km 98+420 (96.70%)
4	PIV km 98+820
5	PIV km 99+110 (7.05%) Trabajos pausados temporalmente por revisión del proyecto y adecuación del proceso constructivo.
6	PSV km 99+563 (90.00%)
7	Puente km 100+780
8	PSFCC km 101+290
9	Plaza de Cobro km 102+200 (98.92%) En espera por llegada de equipos requeridos para la operación.
10	PIV km 102+450
11	PIV km 102+950
12	PIV km 104+900
13	Puente km 106+810
14	PIV km 107+000

Descripción	Descripción
16	PSV km 109+070
17	PSV km 109+530
18	PIV km 112+990
19	PIV km 114+360
20	PIV km 115+980
21	PIV km 116+940
22	PIV km 117+840
23	PSV km 122+590
24	Puente km 124+720
25	ODD km 125+130
26	PIV km 125+230
27	PIV km 126+510
28	PIV km 128+540
29	PIV km 129+310
30	ODD km 129+750

Descripción	Descripción
31	PIV km 130+120
32	PIV km 132+180
33	Plaza de Cobro km 132+500
34	PIV km 132+710
35	PSFCC km 132+740
36	Puente km 133+340
37	PIV km 135+104
38	PIV km 136+270
39	PIV km 138+280
40	PIV km 139+400
41	PIV km 140+310
42	PIV km 141+200
43	PIV km 142+050
44	Puente km 144+010
45	PIV km 144+880

Descripción	
46	PIV km 146+500
47	Puente km 147+550
48	PIV km 147+720
49	Puente km 148+060
50	PIV km 148+880
51	Puente km 149+100
52	Puente

- Inversión: 7,049 mdp
- Inicio: noviembre de 2023

Término: agosto de 2027
- Meta: 67.09 km

65 km (troncal)

2.09 km (estructuras)

2 plazas de cobro, 10 puente,

6 entronques, 54 cruces y

múltiples obras de drenaje.
- 21,147 empleos generados

7,049 Directos

14,098 Indirectos
- 1,800,000 habitantes

beneficiados
- 25 minutos de ahorro


en tiempo
- Concesionaria : PINFRA.

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	25/09/2025 al 02/10/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidraulica	65 km	6.60 km	58.40 km	.200 km	.200 km	
Subbase	65 km	7.40 km	57.60 km	.250 km	.250 km	
Subyacente	65 km	9.10 km	55.90 km	.300 km	.300 km	
PSV 98+051 Demoliciones	1	0	1	1	1	Demolición de apoyo C2
PSV 99+563 Parapeto de concreto	2	1	1	1	1	Perfilado de remate de parapetos

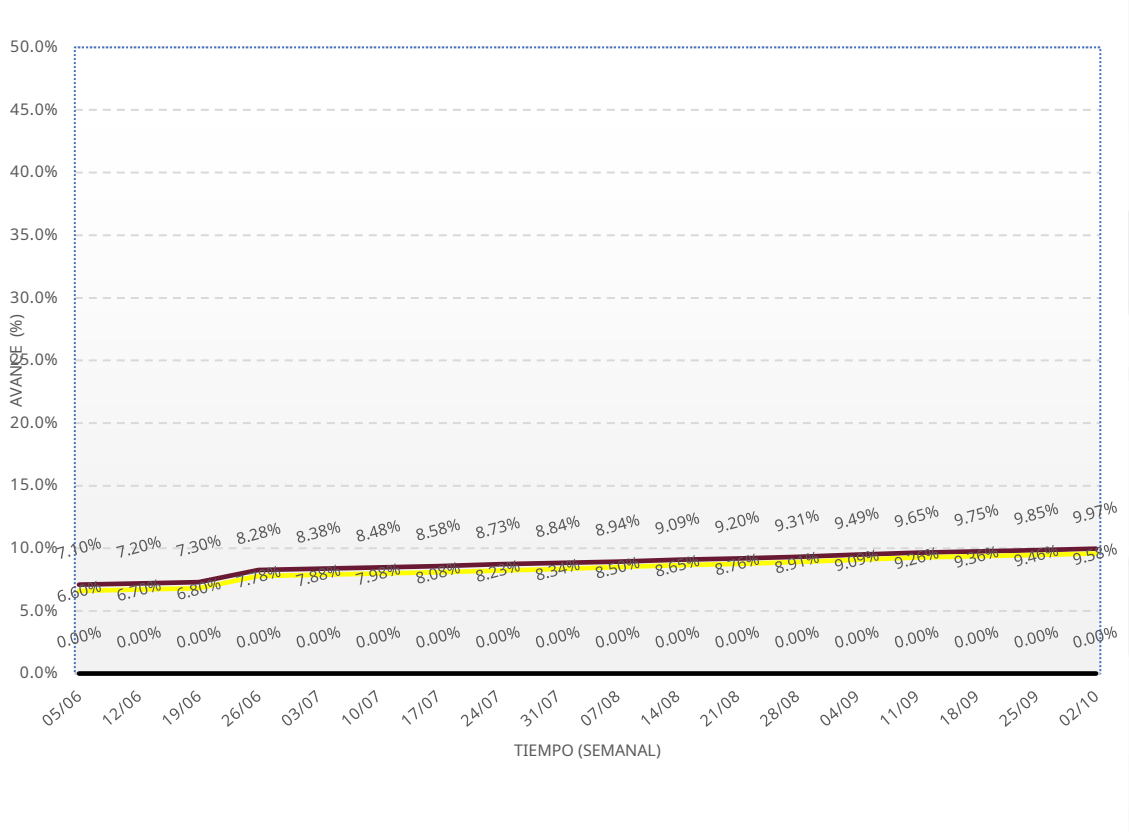

	19 de septiembre al 25 de septiembre	26 de septiembre al 02 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	570	7,000
Maquinaria	240	245



2025
Año de
La Mujer
Indígena
