


Nayarit

Tramo Tepic - Compostela



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

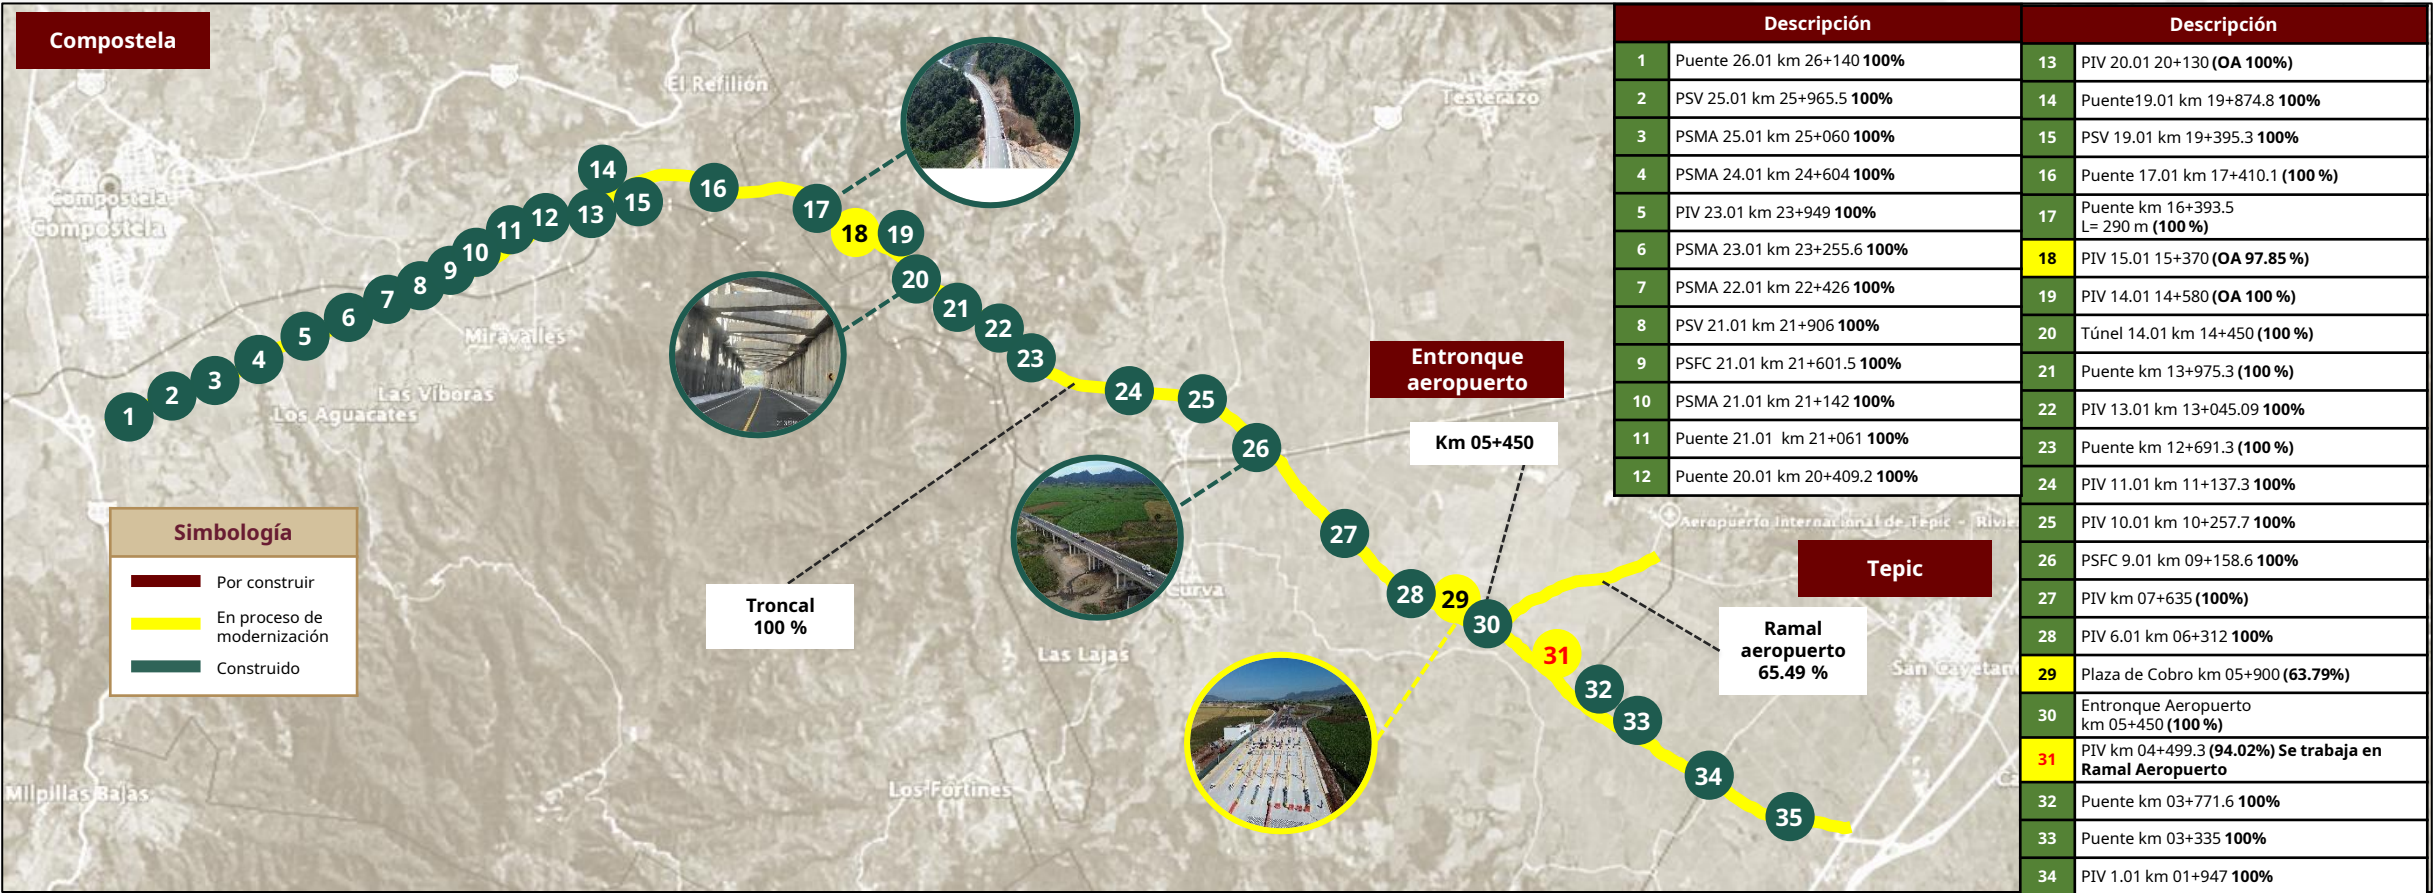

2025
Año de
La Mujer Indígena

Avance físico

- Programado: 100 %
- Real: 99.95 %
- Financiero: 96.70 %
- Semanal: 0.06 %

Concesionaria: FONADIN



Inversión: 2,473.43 mdp



Meta: 28 km. 1 Túnel Falso, 1 Plaza de cobro, 10 Puentes, 2 PSFC, 1 Entronque (solo gazas) y 1 Entronque completo (Aeropuerto), 21 Cruces y Ramal Aeropuerto



Inicio: Marzo 2023
Término: 31-Oct-2025



2,473 empleos directos generados P/MDI
4,946 empleos indirectos generados P/MDI



490 mil habitantes beneficiados



35 minutos de ahorro en tiempo

Nayarit

Tramo Tepic - Compostela


Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	14/11/25 al 20/11/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m3)	2,095,966.26	2,082,399.62	13,566.64	6,000.00	6,400.00	
Subyacente (m³)	290,689.00	278,186.49	12,502.51	1,350.00	1,500.00	



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

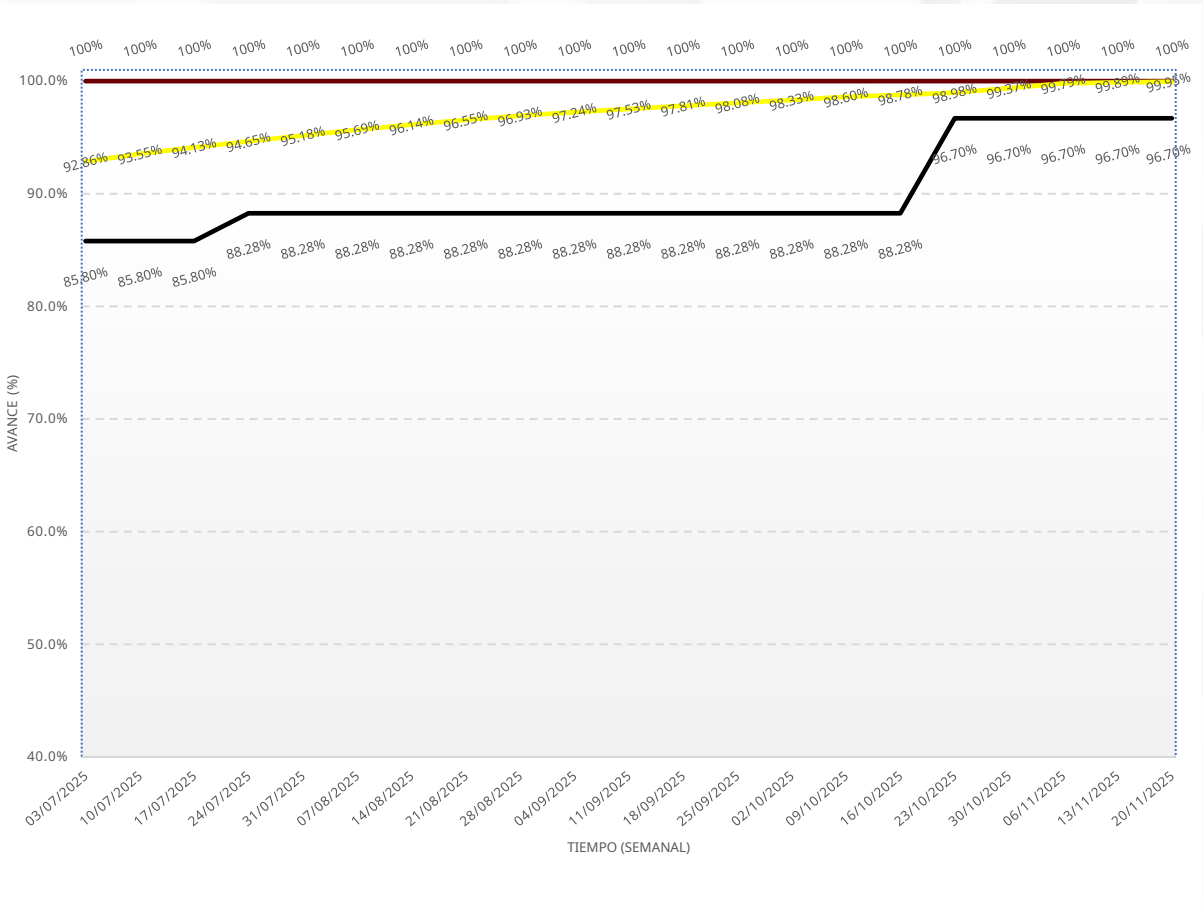

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	07 de noviembre al 13 de noviembre	14 de noviembre al 20 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	450	450
Maquinaria	71	68
