

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde - La Mancha



Gobierno de
México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

VERACRUZ

PIV 6.8 estribo 02 trabajos de colado de plantilla.

Puente 7.8 eje 02 Se realizaron trabajos de colado de cabezal.

Puente 8.7 en espera de montaje de trabes.



Soyacuautila



Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080
8	PIV 6.8 Km 6+806 (10.00%)
9	PIV 7.04 Km 7+040 (5.00%) Se esta evaluando la reubicación de la estructura.
10	PUENTE 7.3 Km 7+330
11	PUENTE 7.8 Km 7+860, (45.00%)
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%) El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC, solicitaron se ejecuten unos PCA adicionales, se ejecutarán en esta semana..
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (40.00%)
14	PSMA 8.9 Km 8+960, (96.00%)
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Simbología	
—	Por construir
—	En proceso de construcción
—	Concluido

Avance físico

- Programado: 38.73%
- Real: 21.22% Incluye Ent. Chapachapa
- Financiero: 9.16%
- Semanal: 0.78%



Inversión: 2,252.78 mdp



Inicio: Marzo de 2025
Término: Agosto de 2026



Meta: 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMA, 59 ODTs y el Entronque Chapachapa



6758 empleos generados (2253 empleos directos y 4,506 empleos indirectos generados/millón de inversión)



128,000 habitantes beneficiados



45 minutos de ahorro en tiempo, Tramo 4

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica


Laguna Verde - La Mancha



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

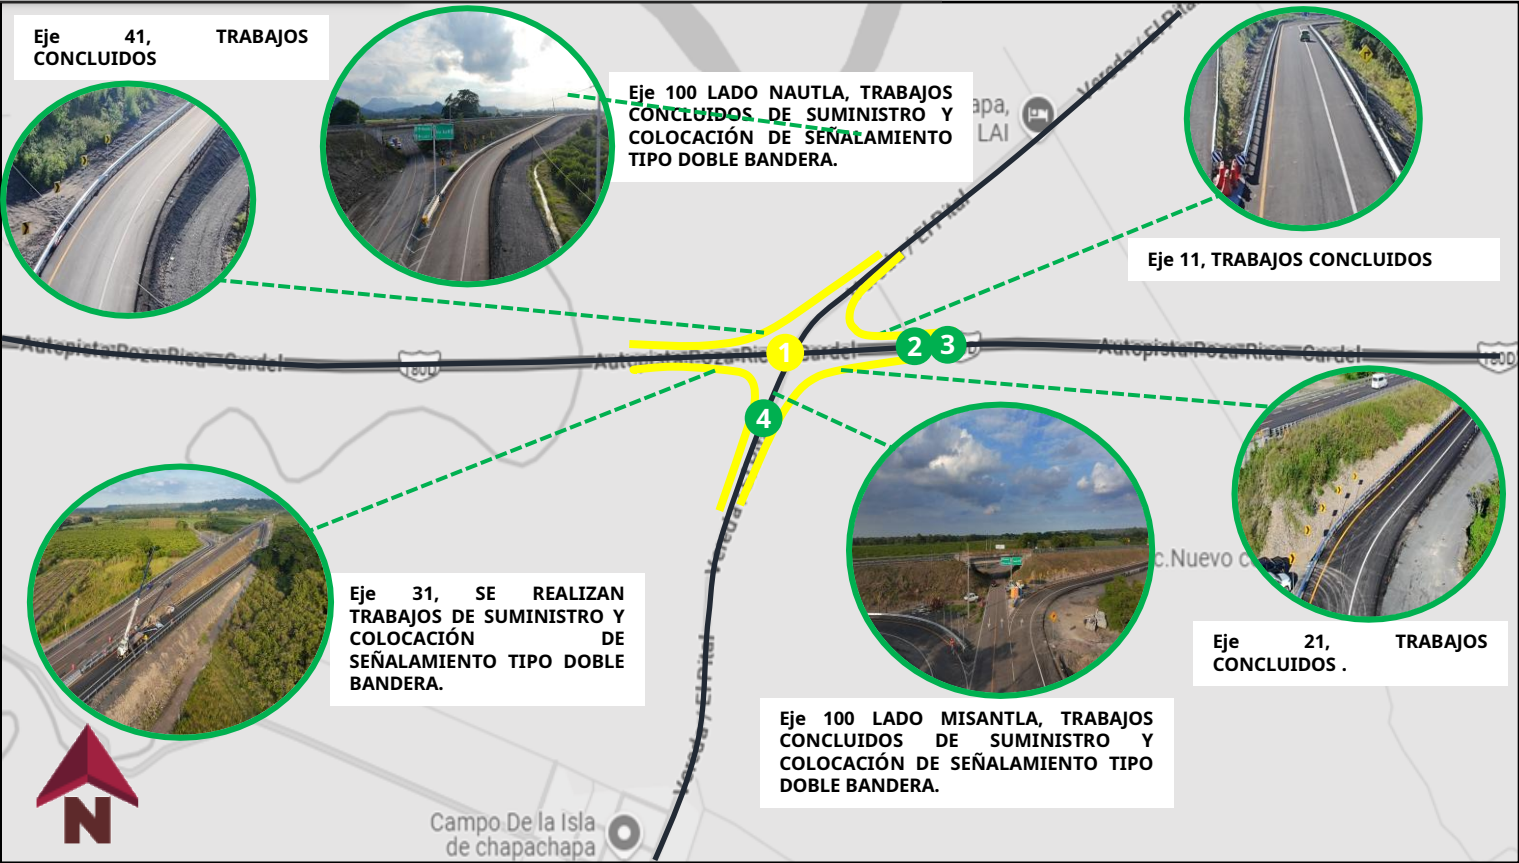

Simbología	
	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512) (99.92%)
2	ODT 92+827.25 (100%)
3	PSPyG 92+832.22 (100%)
4	Ampliación de ODT 100+102, (100%)

Avance físico

- Real: 99.92%
- Programado: 100%
- Financiero: 28.29%
- Semanal: 0.13%

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde - La Mancha



Gobierno de
México


Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	13/11/25 al 20/11/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volúmenes de obra						
Pedraplén	97,038.03	32,673.22	64,364.81	4,043.25	2,340.00	Solo falta el tramo del 11+240 al 11+500 pero existe un bloqueo en este punto
Subyacente	162,462.20	45,733.74	116,728.46	27,077.03	8,734.48	El volumen programado corresponde a los 19. 8km y solo se trabaja en 5 km
Subrasante	124,961.00	430.00	124,531.00	17,851.57	430.00	El volumen programado corresponde a los 19. 8km y solo se trabaja en 5 km
Estructuras Laguna Verde - La Mancha						
Zapata	2	0	2	1	0	PIV 6.8 Km 6+806 trabajos de armado de acero de refuerzo en zapata y muro de estribo 02
Cabezal	6	6	0	0	0	Se realizaron los trabajos de colado de cabezal en eje 02 del Pte. 7,8, Km 7+860
Cabezal	3	3	0	0	0	Trabajos de colado de bancos en cabezal del eje 02 y se continua a la espera de montaje de trabes del Pte. 8,7, km 8+665
Entronque Chapachapa						
Volúmenes de obra						
Carpeta Asfáltica	657.00¹	566.34²	90.64	164.25	0.00	Carpeta Asfáltica

¹ Volumen total incluyendo rotondas que no se ejecutaron

² Volumen total real ejecutado.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

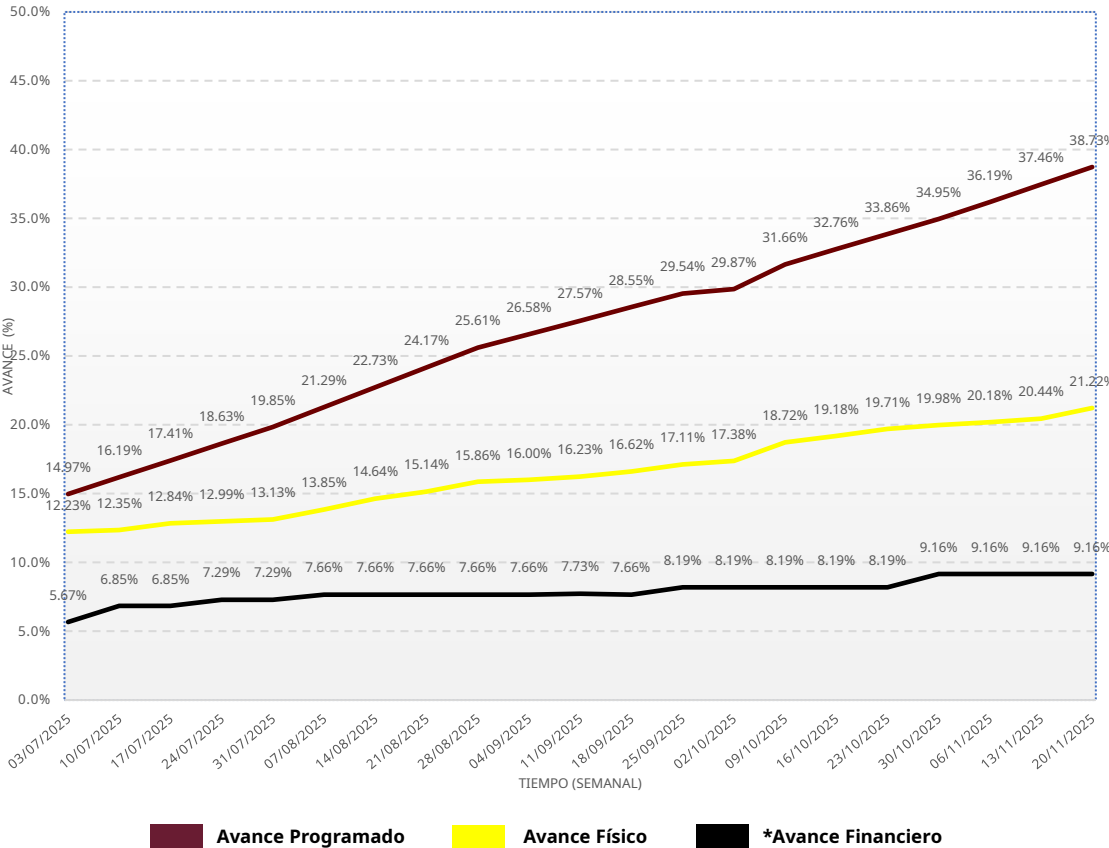

	07 de noviembre al 13 de noviembre	14 de noviembre al 20 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	103	86
Maquinaria	14	18
