

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío




Descripción	
1	Entronque Santa Rosa km 32+420 (78.00%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
2	Entronque Ziranda-Jaripeo km 32+420 (76.32%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
3	Puente Turundeo Km 36+460 (87.49%)
4	Entronque Turundeo I km 37+550 (76.37%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
5	Entronque Turundeo II km 38+780 (86.85%)
6	Entronque Jungapeo km 56+700 (62.81%)
7	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (54.10%), Se solicitó a Concesionaria reactivar el frente.
8	Entronque Valle Verde km 67+220 (55.42%)
9	Entronque Curungueo I Km 68+240 (41.48%)
10	Entronque Curungueo II Km 68+780 (41.48%)
11	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (11.24%)
12	PSV Zitácuaro Km 72+160 (51.26%)


Descripción	
1	Puente Obispo Km 50+400
2	Entronque Zirahuato km 62+620
3	Entronque San Felipe I km 64+400
4	Entronque San Felipe II Km 64+640
5	Entronque Macutzio km 65+620


Nota:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

Avance físico


- Programado: 52.92%
- Real: 46.17 %
- Semanal: 0.64 %
- Financiero: 0.00%


 **Inversión:** 4,575.3 mdp
Inversión 2020-2025:3,321 mdp


 **Meta:** 71.3 Km
Meta 2020-2025: 41 km

 **Inicio:** septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 30 de enero de 2027

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

 4,800 empleos generados

 126,000 habitantes beneficiados


 Ahorro en tiempo: 25 min

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 01 ago al 07 ago 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m³)	705,558.00	653,822.68	51,735.32	3,206.57	11,363.14	CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9
Terraplén (m³)	445,687.00	310,728.16	134,958.84	8,069.64	5,398.63	EL AVANCE DEPENDE DE LOS FRENTE DE TRABAJOS DISPONIBLES. SE ABRIERON FRENTE DE TRABAJO EN TRAMOS 6 Y 7.
Subyacente (m³)	256,097.00	218,233.40	37,863.60	1,016.65	2,997.85	CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9
Subrasante (m³)	170,688.00	144,312.30	26,375.70	918.37	1,868.83	CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9
PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 01 ago al 07 ago 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m³)	125,659.04	87,909.66	37,749.38	420.20	1,260.17	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7
Bacheo (m³)	1,800.00	1,065.00	735.00	44.44	39.00	SE REALIZAN BACHEOS EN TRAMO 7 Y 9. LOS TRABAJOS DEPENDEN DE LA DISPONIBILIDAD DE FRENTE.
Fresado (m³)	10,676.00	9,546.80	1,129.20	30.22	39.75	SE REALIZAN BACHEOS EN TRAMO 10.
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	20.18	10.06	0.21	0.71	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7
Geomalla (m²)	84,520.00	51,802.80	32,717.20	353.19	3,688.00	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7
Base Asfáltica (m³)	120,414.05	92,865.72	27,548.33	475.74	1,355.20	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7
Carpeta Asfáltica (m³)	45,247.80	12,632.00	32,615.80	1,181.93	0.00	AÚN NO INICIA LA PRODUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PLANTA JUNGAPÉO. EL AVANCE SE COMPENSARÁ CON EL ALTO RENDIMIENTO EN LA COLOCACION DE LA CAPA.
ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 01 ago al 07 ago 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PUENTE TURUNDEO	1.00	1.10	0.00	0.00	0.00	COLADO DE LOSA DE COMPRESIÓN EN CLARO A5 - A6. ARMADO DE GUARNICIÓN Y PARAPETO.
PIV JUNGAPÉO	1.00	0.90	0.10	0.00	0.01	CONTINUA EL CORTE DE TN EN GAZAS, COLADO DE LOSA DE COMPRESIÓN Y GUARNICIÓN EN PIV
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.11	0.89	0.00	0.00	SIN ACTIVIDAD, SE SOLICITÓ A LA CONCESIONARIA REACTIVAR EL FRENTE.
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.69	0.31	0.00	0.01	ARMADO DE LOSA DE COMPRESIÓN.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

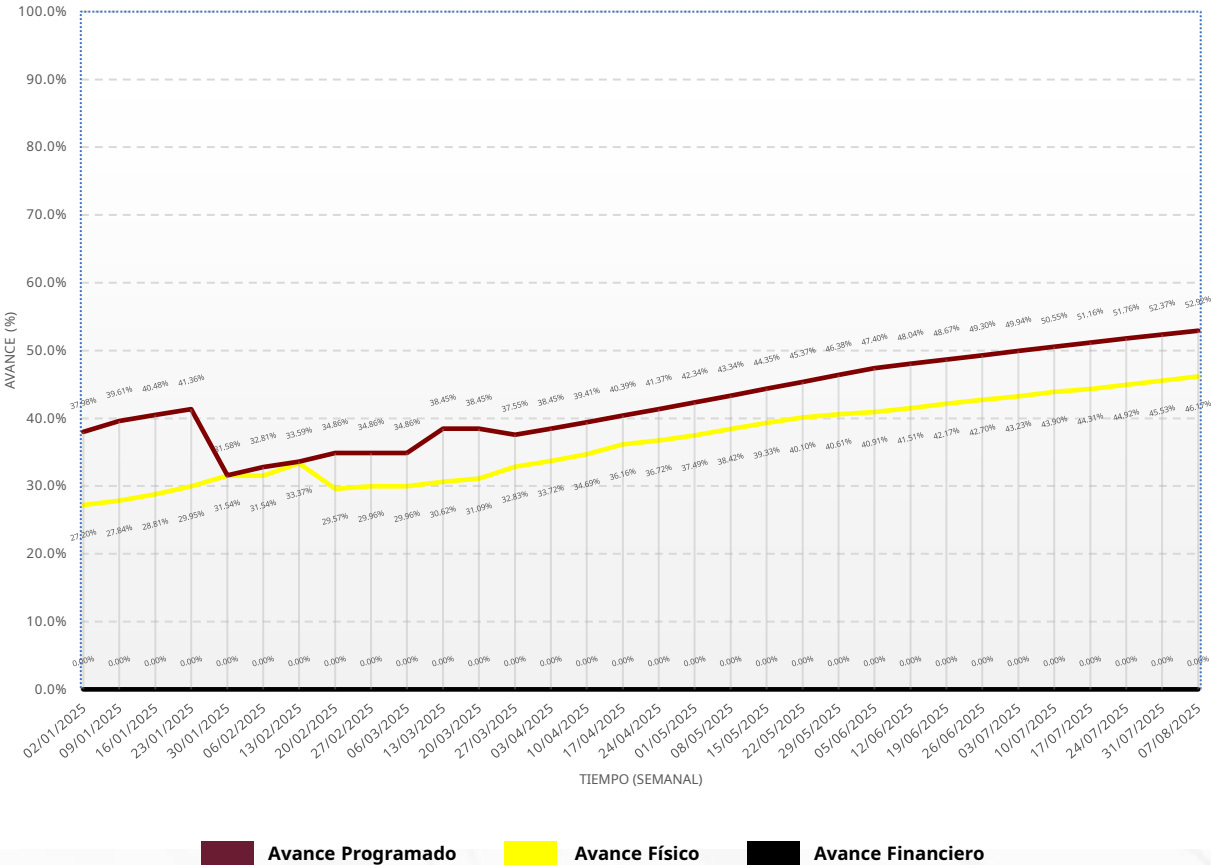

* No presenta avance financiero		
	25 AL 31 DE JULIO	01 AL 07 DE AGOSTO
Fuerza de Trabajo (personas)	278	279
Maquinaria	182	178
