


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

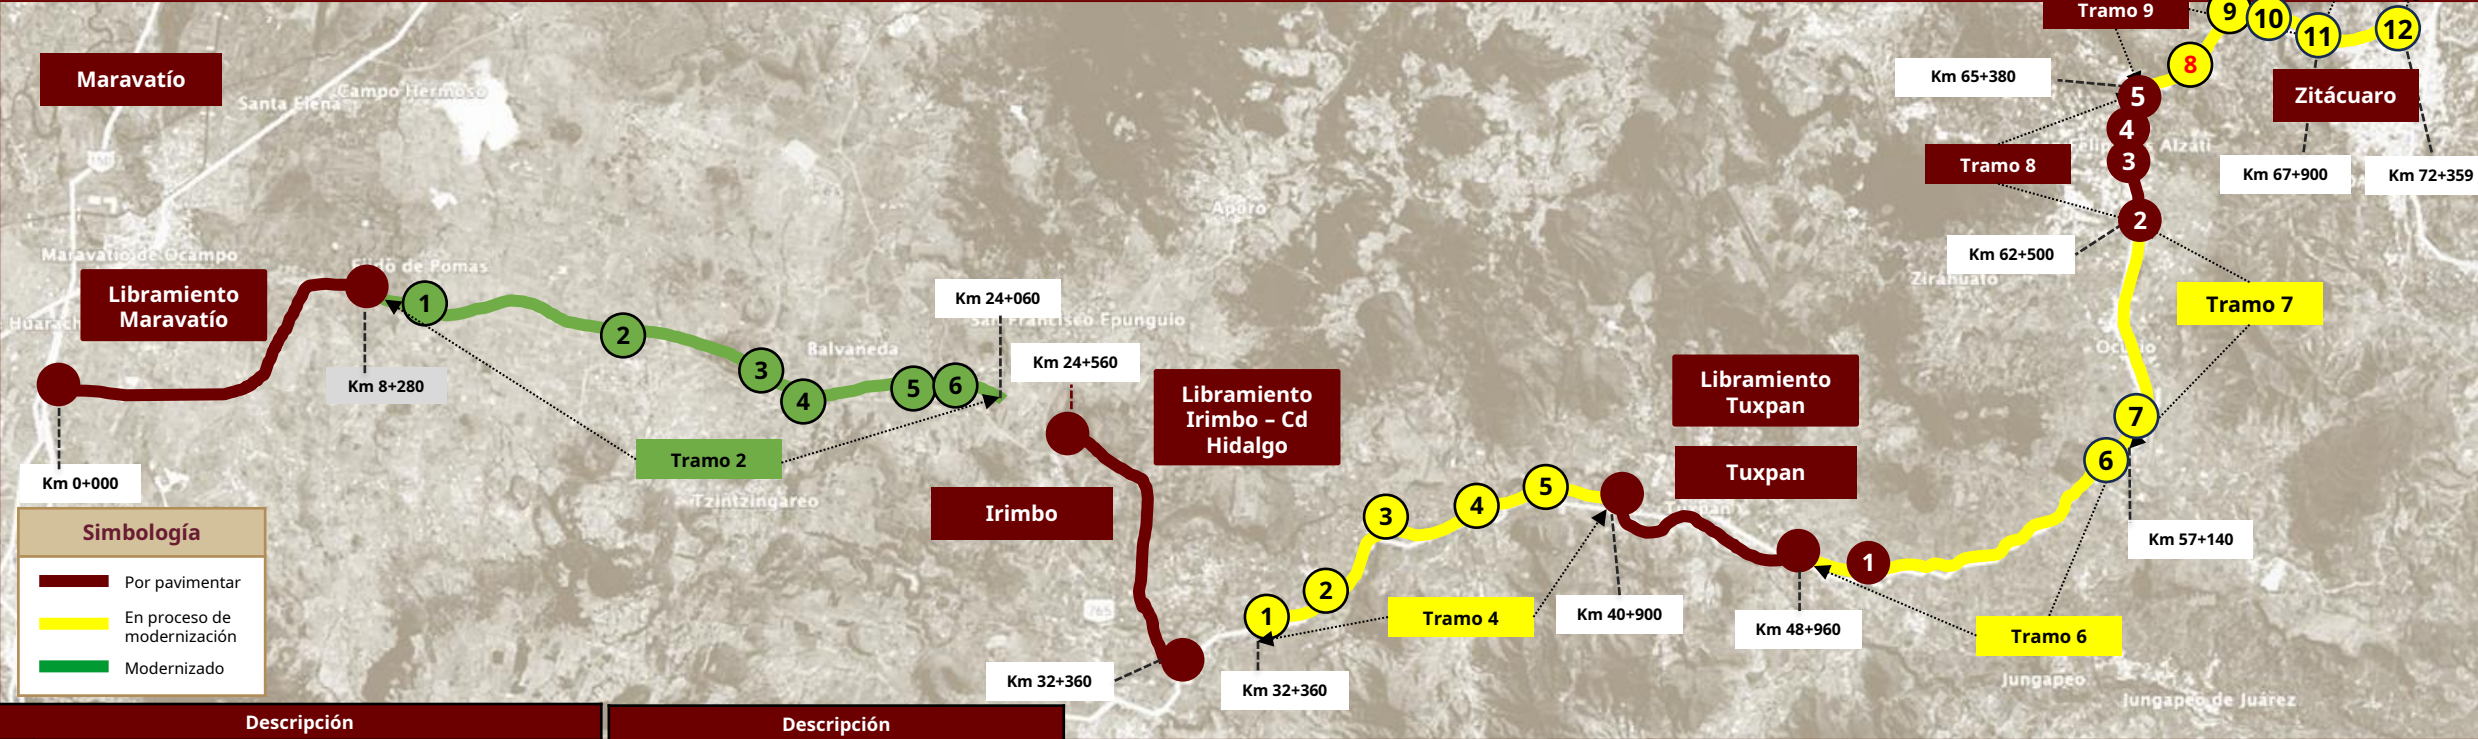

Descripción	
1	Entronque Santa Rosa km 32+420 (98.50%)
2	Entronque Ziranda-Jaripeo km 32+420 (99.95%)
3	Puente Turundeo Km 36+460 (99.65%)
4	Entronque Turundeo I km 37+550 (99.69%)
5	Entronque Turundeo II km 38+780 (96.95%)
6	Entronque Jungapeo km 56+700 (71.46%)
7	Entronque Piedras de Lumbr km 57+700 (64.90%)
8	Entronque Valle Verde km 67+220 (69.04%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
9	Entronque Curungueo I Km 68+240 (68.43%)
10	Entronque Curungueo II Km 68+780 (68.43%)
11	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (75.04%)
12	PSV Zitácuaro Km 72+160 (79.92%)

Descripción	
1	Puente Obispo Km 50+400
2	Entronque Zirahuato km 62+620
3	Entronque San Felipe I km 64+400
4	Entronque San Felipe II Km 64+640
5	Entronque Macutzio km 65+620

Nota:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

Avance físico

- Programado: 56.76%
- Real: 53.56%
- Semanal: 0.40%
- Financiero: 8.11%



Inversión: 4,575.3 mdp
Inversión 2020-2025: 3,321 mdp



Meta: 71.3 Km



Inicio: septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 30 de enero de 2027



13,726 empleos generados
(4,575 directos y 9,151 indirectos)



126,000 habitantes beneficiados



Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 31 oct al 06 nov 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	710,785.77	-5,227.77	768.35	2,417.34	
Terraplén (m3)	445,687.00	357,674.51	88,012.49	5,827.63	2,740.93	SE ABRE EL FRENTE DEL ENTRONQUE ZIRAHUATO EN TRAMO 7
Subyacente (m3)	256,097.00	240,356.64	15,740.36	718.97	1,718.96	SE ABRE EL FRENTE DEL ENTRONQUE ZIRAHUATO EN TRAMO 7
Subrasante (m3)	170,688.00	158,445.59	12,242.42	402.47	1,142.89	

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 31 oct al 06 nov 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	104,882.36	20,776.68	446.99	1,203.58	
Bacheo (m3)	1,800.00	1,312.00	488.00	2.00	0.00	NO SE TIENEN FRENTE DE BACHEO ACTIVOS EN ESTE PERIODO
Fresado (m3)	10,676.00	10,015.75	660.25	5.60	26.50	
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	24.83	5.41	0.09	0.21	
Geomalla (m2)	84,520.00	71,018.80	13,501.20	0.00	2,506.20	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	103,934.54	16,479.51	454.46	1,123.07	
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	20,350.78	24,897.02	14.12	3,275.80	

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 31 oct al 06 nov 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PUENTE TURUNDEO	1.00	1.45	0.00	0.00	0.05	COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA
PIV JUNGAPEO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.12	CONTINÚA EL CORTE DE TN EN GASAS Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.51	0.49	0.00	0.04	FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA EN TALLER
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.86	0.14	0.00	0.02	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE ACCESO Y SALIDA.
DEFENSA METÁLICA	31,302.00 ml	21,763.15 ml	9,538.85 ml	0.00 ml	970.70 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4.

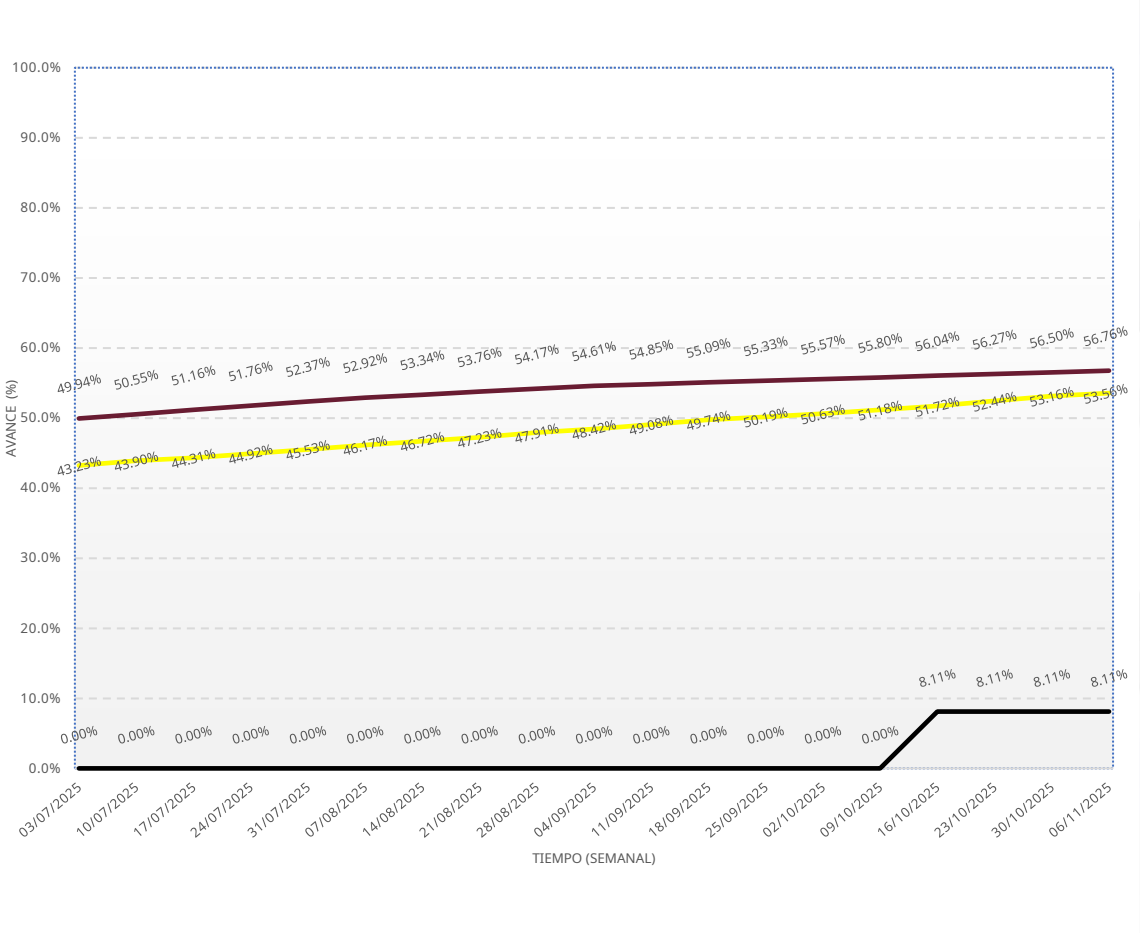

Avance Programado Avance Físico *Avance Financiero

* No presenta avance financiero

	DEL 24 AL 30 OCTUBRE 25	DEL 31 OCTUBRE AL 06 NOVIEMBRE 25
Fuerza de Trabajo (personas)	279	280
Maquinaria	183	181
