

# Colima

## Tramo Armería-Manzanillo

**Avance físico**

- Programado: 87.85%
- Real: 29.26%
- Semanal: 0.42%
- Financiero: 20.79%




# Colima

## Tramo Armería-Manzanillo

Elemento	Intervención	Ejecutado	Faltante	15/08/25 al 21/08/25		Observaciones
		acumulado		Programado	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Terraplenes (m³)	813,909	484,500	329,409	0	4,919	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Base y sub base (m³)	260,119	130,574	129,545	0	2,894	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

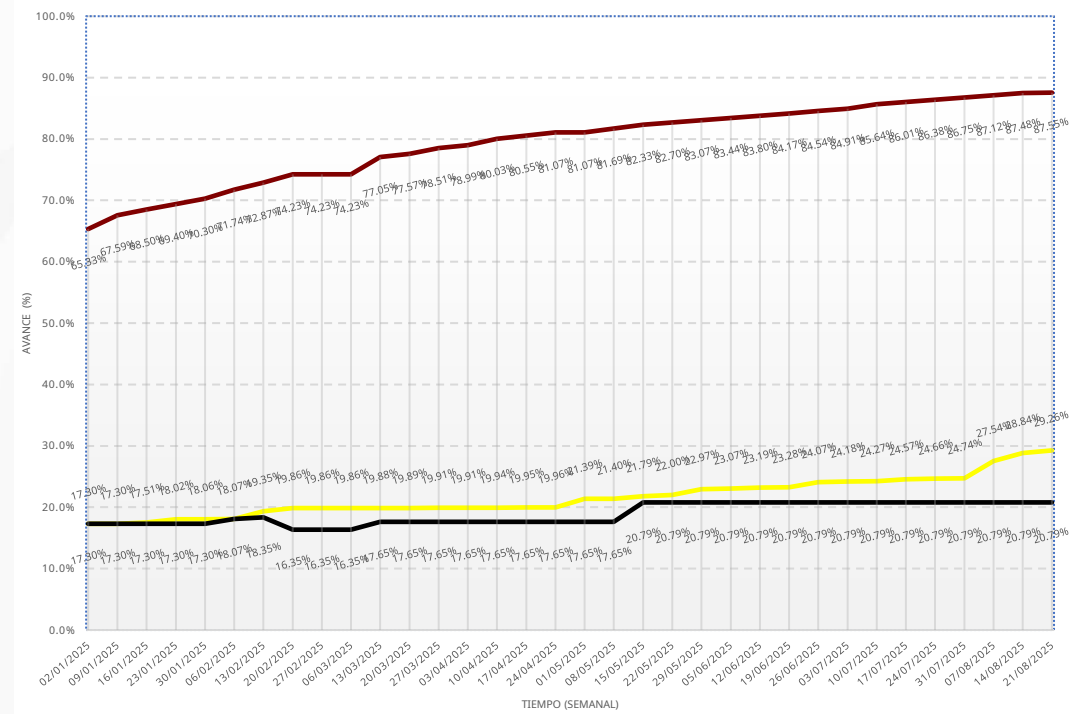

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	08 de agosto al 14 de agosto	15 de agosto al 21 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	181	178
Maquinaria	71	70

