

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío









2025
Año de
La Mujer
Indígena

Descripción	
1	Entronque Santa Rosa km 32+420
2	Entronque Ziranda-Jaripeo km 32+420
3	Puente Turundeo Km 36+460
4	Entronque Turundeo I km 37+550
5	Entronque Turundeo II km 38+780
6	Entronque Jungapeo km 56+700
7	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700
8	PSV Zitácuaro Km 72+160

Descripción	
1	Puente Obispo Km 50+400
2	Entronque Zirahuato km 62+620
3	Entronque San Felipe I km 64+400
4	Entronque San Felipe II Km 64+640
5	Entronque Macutzio km 65+620
6	Entronque Valle Verde km 67+220
7	Entronque Curungueo I
8	Entronque Curungueo II
9	Puente San Juan Viejo Km 69+860

Avance físico

- Real: 36.72%
- Financiero: 0.00%
- Programado: 41.37%
- Semanal: 0.56%

-  **Inversión:** 4,575.3 mdp
-  **Meta:** 71.3 Km
-  **Inicio:** 27 de enero de 2024
Término: 30 de enero de 2027
-  4,800 empleos generados
-  126,000 habitantes beneficiados
-  Ahorro en tiempo: 25 min

Michoacán


Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

Terracerías						
Concepto	Meta	Ejecutado	Faltante	Del 18 abr al 24 abr 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m³)	705,558.00	596,750.35	108,807.65	0.00	1,023.85	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7
Terraplén (m³)	441,517.00	255,937.07	185,579.93	2,116.96	1,712.67	SE AFECTA EL RENDIMIENTO POR PERIODO VACACIONAL
Subyacente (m³)	256,174.00	200,229.29	55,944.71	2,083.73	3,067.49	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7
Subrasante (m³)	174,781.00	132,774.58	42,006.42	1,153.62	1,837.85	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7

Pavimentos						
Concepto	Meta	Ejecutado	Faltante	Del 18 abr al 24 abr 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m³)	125,659.04	61,690.04	63,969.01	3,133.33	1,406.66	SE AFECTA EL RENDIMIENTO POR PERIODO VACACIONAL
Bacheo (m³)	1,800.00	475.00	1,325.00	58.85	21.25	SE AFECTA EL RENDIMIENTO POR PERIODO VACACIONAL
Fresado (m³)	10,676.00	8,670.68	2,005.32	176.05	50.93	SE AFECTA EL RENDIMIENTO POR PERIODO VACACIONAL
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	11.29	18.95	1.07	0.60	SE AFECTA EL RENDIMIENTO POR PERIODO VACACIONAL
Geomalla (m²)	84,520.00	19,323.00	65,197.00	2,597.54	1,212.00	SE AFECTA EL RENDIMIENTO POR PERIODO VACACIONAL
Base Asfáltica (m³)	120,414.05	68,137.74	52,276.31	2,603.43	1,666.64	SE AFECTA EL RENDIMIENTO POR PERIODO VACACIONAL
Carpeta Asfáltica (m³)	45,247.80	12,676.15	32,571.65	414.01	0.00	EN EL PERIODO ANTERIOR SOLO SE REALIZÓ UN TRAMO DE PRUEBA PARA AFINAR EL DISEÑO DE LA MEZCLA

Estructuras						
Concepto	Meta	Ejecutado	Faltante	Del 18 abr al 24 abr 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PUENTE TURUNDEO	1.00	0.88	0.12	0.02	0.00	SOLO SE TRABAJÓ EN EL ARMADO Y CIMBRADO DE COLUMNAS Y CABEZALES
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.27	0.73	0.00	0.06	COLADO DE COLUMNAS DE APOYO 03
MURO DE CONTENCIÓN MT4	200.00 ml	168.94 ml	31.06 ml	0.00 ml	1.81 ml	CIMBRADO Y COLADO DE MURO

Avance Programado-Físico-Financiero (%)

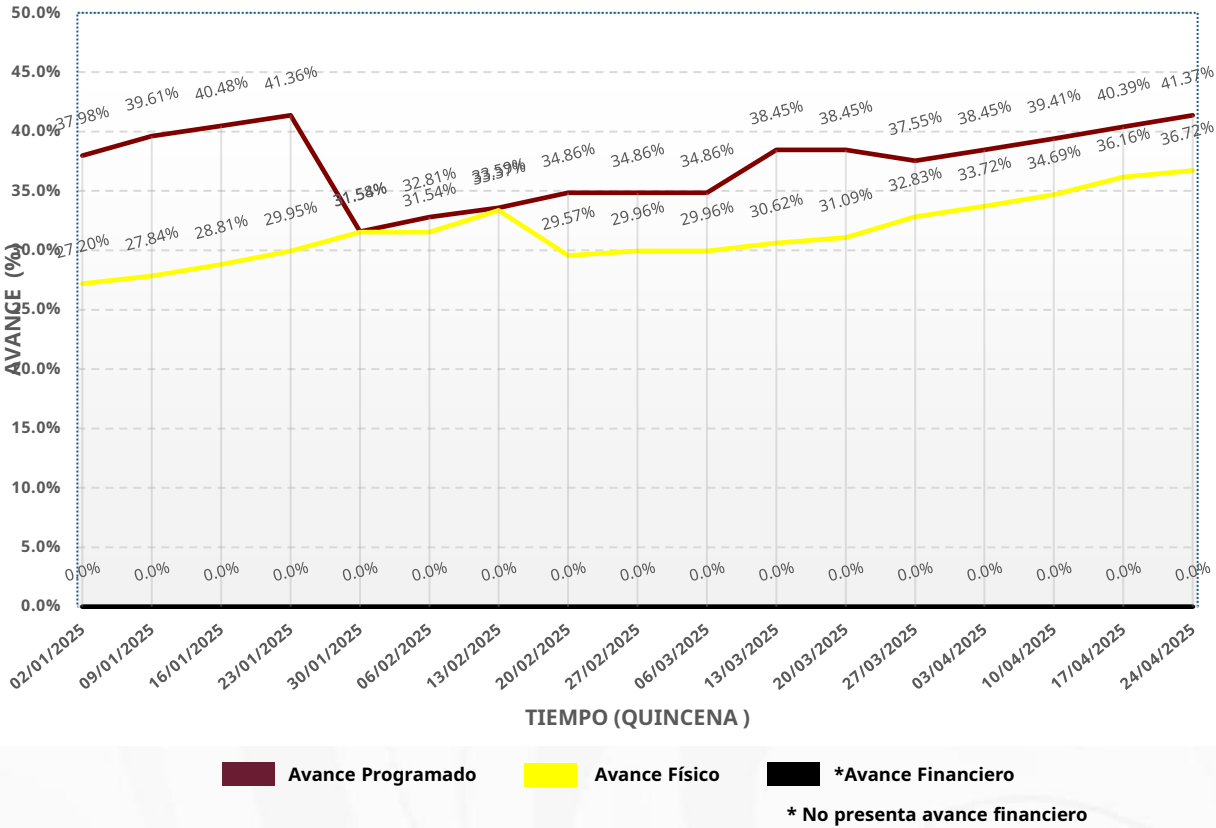

	11 de abril al 17 de abril	18 de abril al 24 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	293	295
Maquinaria	177	176
