



Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance físico: • Programado: 6.80% • Semanal: 0.1%
• Real: 6.30% • Financiero: 0%

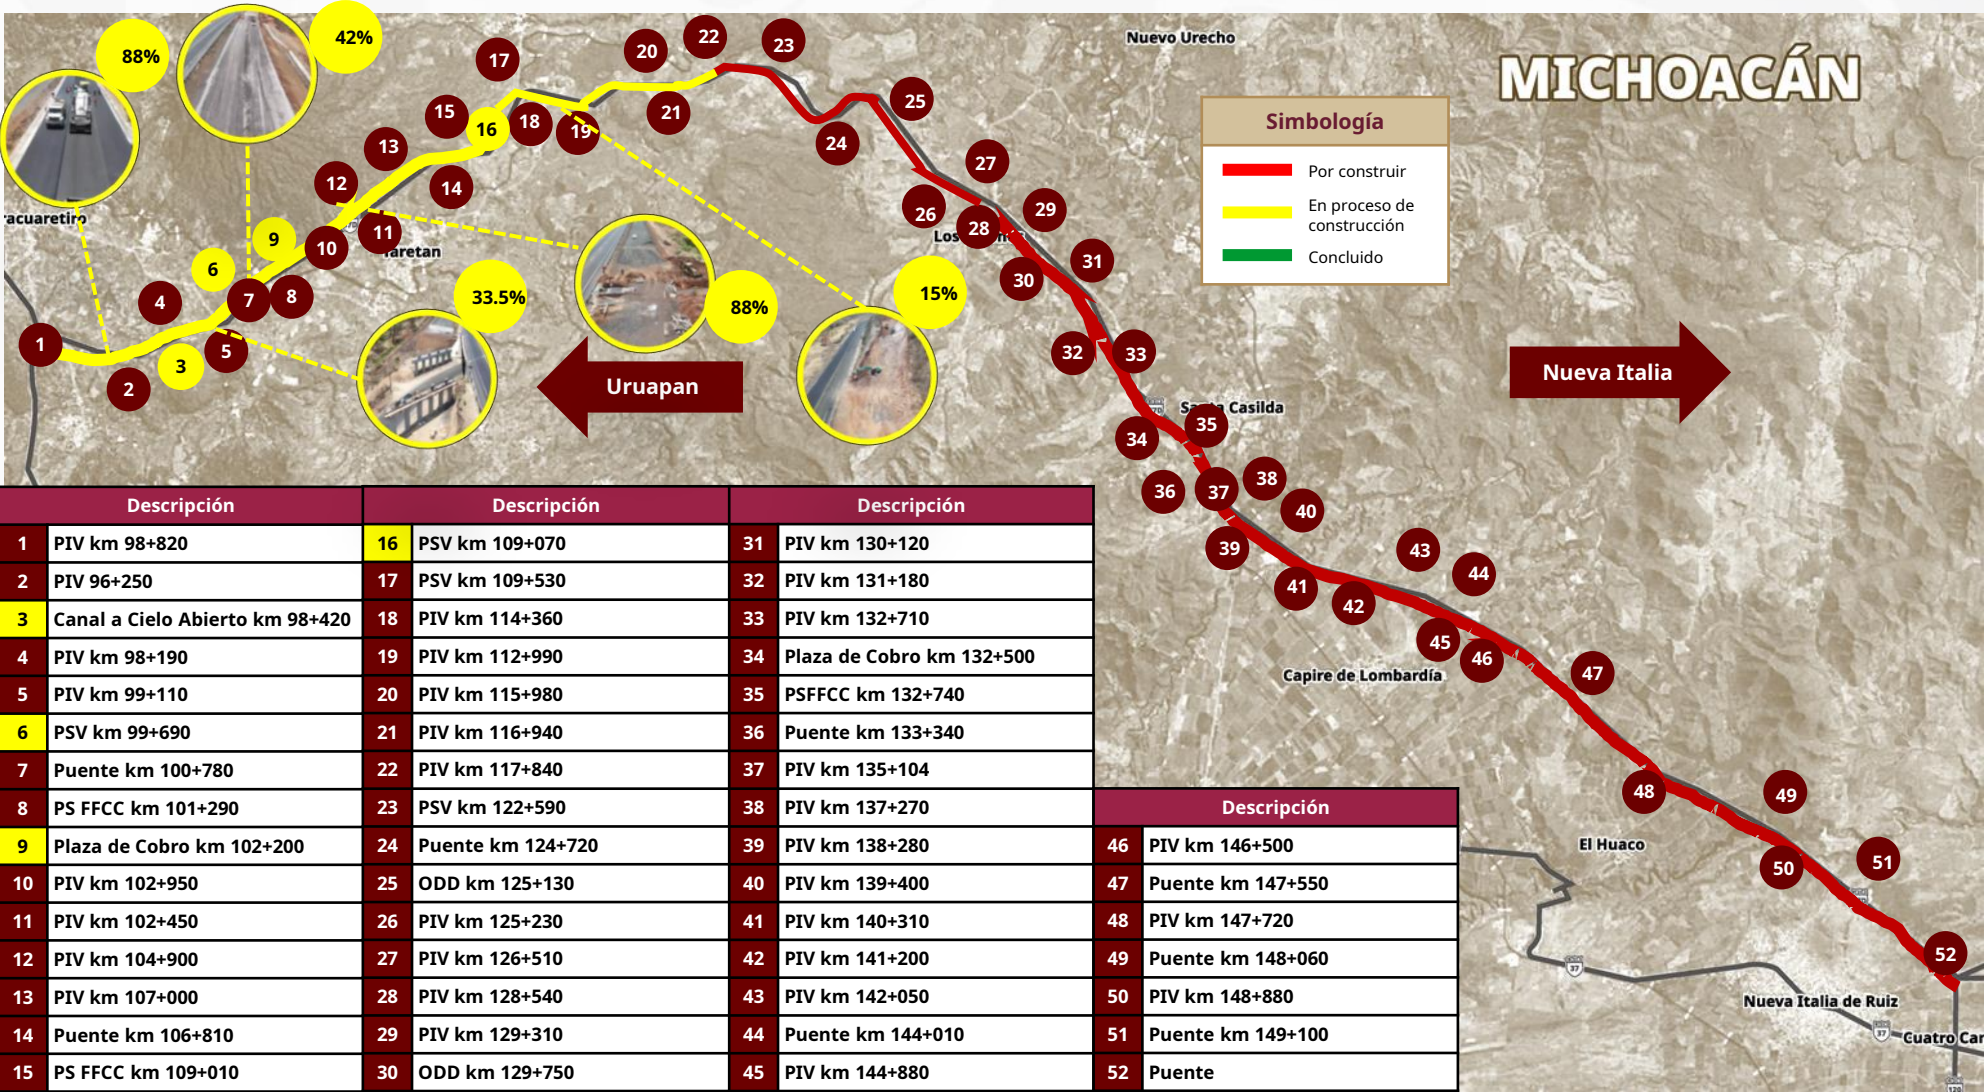


-  **Inversión: 7,049 mdp**
-  **Inicio:** noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
-  **Meta:** 65 km, 2 plazas de Cobro, 10 puentes, 6 entronques, 54 cruces, múltiples obras de drenaje
-  **12,480** empleos generados
-  **1,800,000** habitantes beneficiados
-  **10 minutos** de ahorro en tiempo
- Concesionaria :** PINFRA.

Michoacán

Uruapán-Nueva Italia

| Elemento | Meta | Ejecutado acumulable | Faltante | 09/05/25 al 15/05/2025 | | Observaciones |
|------------|-------|----------------------|----------|------------------------|-----------|------------------------------|
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| Carpeta | 65 km | 4.4 km | 60.6 km | .100 km | .100 km | En revisión programa de obra |
| Base | 65 km | 4.5 km | 60.5 km | .100 km | .100 km | |
| Subbase | 65 km | 5.3 km | 59.7 km | .200 km | .100 km | |
| Subyacente | 65 km | 5.7 km | 59.3 km | .300 km | .200 km | |

Avance Programado-Físico-Financiero (%)

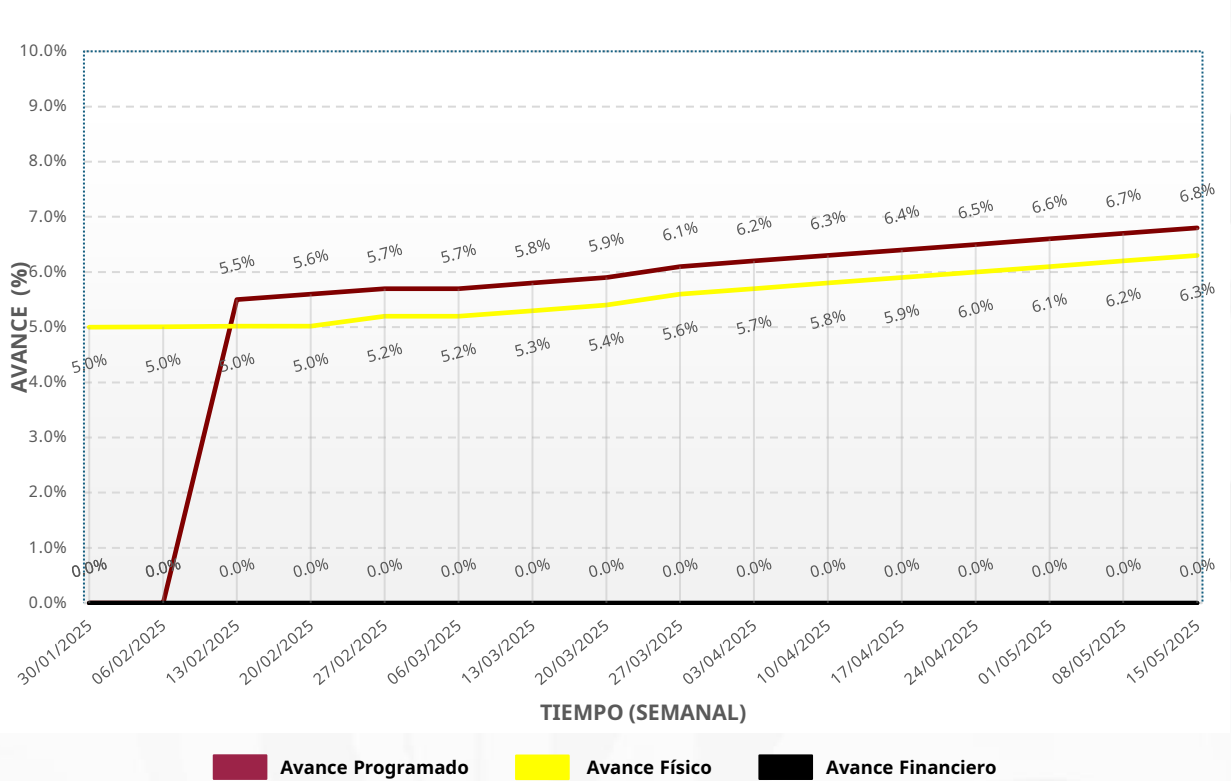

| | Del 02 de mayo al 08 de mayo | Del 09 de mayo al 15 de mayo. |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 1,500 | 1,500 |
| Maquinaria | 550 | 550 |

