

# Oaxaca

## Mitla - Entronque Tehuantepec II

**Avance físico** • Programado: 100% • Semanal: 0.02%  
• Real: 99.12%

**Avance obra pendiente** • Real: 97.37%

**Avance financiero**

- Real ejercido: 97.37%
- Real pagado: 88.53%
- Con un adeudo de: 8.84%
- *Nota: Se tiene una deuda de 2,621.89 mdp que representa el 8.84% por trabajos ejecutados, dicho monto continua en conciliaciones por lo que se podría modificar*



Descripción	
1	PIV km 87+900. <b>40% Conflicto entre sindicatos de camioneros</b>
2	PIP km 91+530. <b>100%</b>
3	PIPR km 92+436. <b>100%</b>
4	PIV km 92+438. <b>100%</b>
5	PIP km 92+680. <b>0%</b>
6	Entronque Llano Crucero km 92+690. <b>82% Problemas D.V.</b>
7	Muro de pilas km 92+700 <b>32%</b>

Descripción	
8	Entronque Llano Laguna km 98+200. <b>100%</b>
9	Entronque Cerro Pascle km 100+500. <b>100%</b>
10	PIP km 106+570. <b>100%</b>
11	PIP km 108+570. <b>100%</b>
12	PIV km 109+247. <b>100%</b>
13	PIV km 110+460. <b>100%</b>
14	Entronque Danigare km 111+600. <b>100%</b>

Descripción	
15	PIP km 112+270. <b>100%</b>
16	PIV km 114+766. <b>100%</b>
17	Entronque Agua Blanca Km 122+600. <b>100%</b>
18	Entronque Quiavicuzas Km 137+900. <b>100%</b>
TT	Túnel El Tornillo km 139+400 (Colapsado)
19	PIPG Km 146+840. <b>95%</b>
20	PIPG km159+400. <b>95%</b>

**Inversión:** 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos

**Término:** Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)

**Meta:** 65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques, 2 casetas y 17 pasos de servidumbre. En proceso: Trabajos en la troncal, 1 entronque y 8 pasos de servidumbre

❖ **Nota:** De los pasos de servidumbre 9 están terminados, 2 con un 95%, 1 al 40% y 5 sin iniciar

❖ El Túnel Tornillo se encuentra colapsado y en proceso de determinar su solución

**12,204** empleos generados

**+1 millón 400 mil** habitantes beneficiados


**2 hrs** de ahorro en tiempo

\*No hay avances debido a la falta de asignación de recursos

# Oaxaca

## Mitla - Entronque Tehuantepec II

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

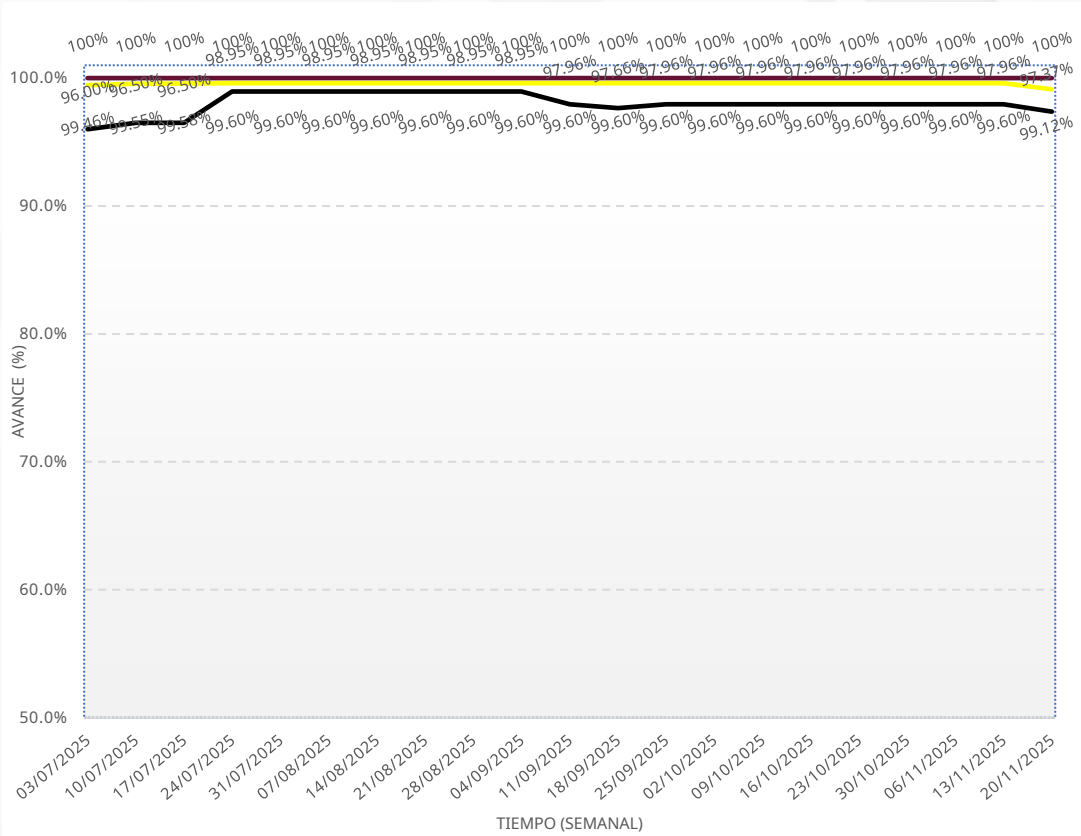

❖Nota: A partir de esta fecha, ya no existirán avances debido a la considerable deuda que se tiene con las empresas contratadas por la concesionaria a la fecha y la falta de recursos presupuestales.

- Maquinaria:
- Gruas para montaje de trabes (3) Inactivo
  - Perforadora S/M (1) Inactivo
  - Perforadora HB130 (1) Inactivo
  - Excavadora (1) Inactivo
  - Telescopica para concreto (1) Inactivo

	07 de noviembre al 13 de noviembre	14 de noviembre al 20 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	30	30
Maquinaria	9	7
