


Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

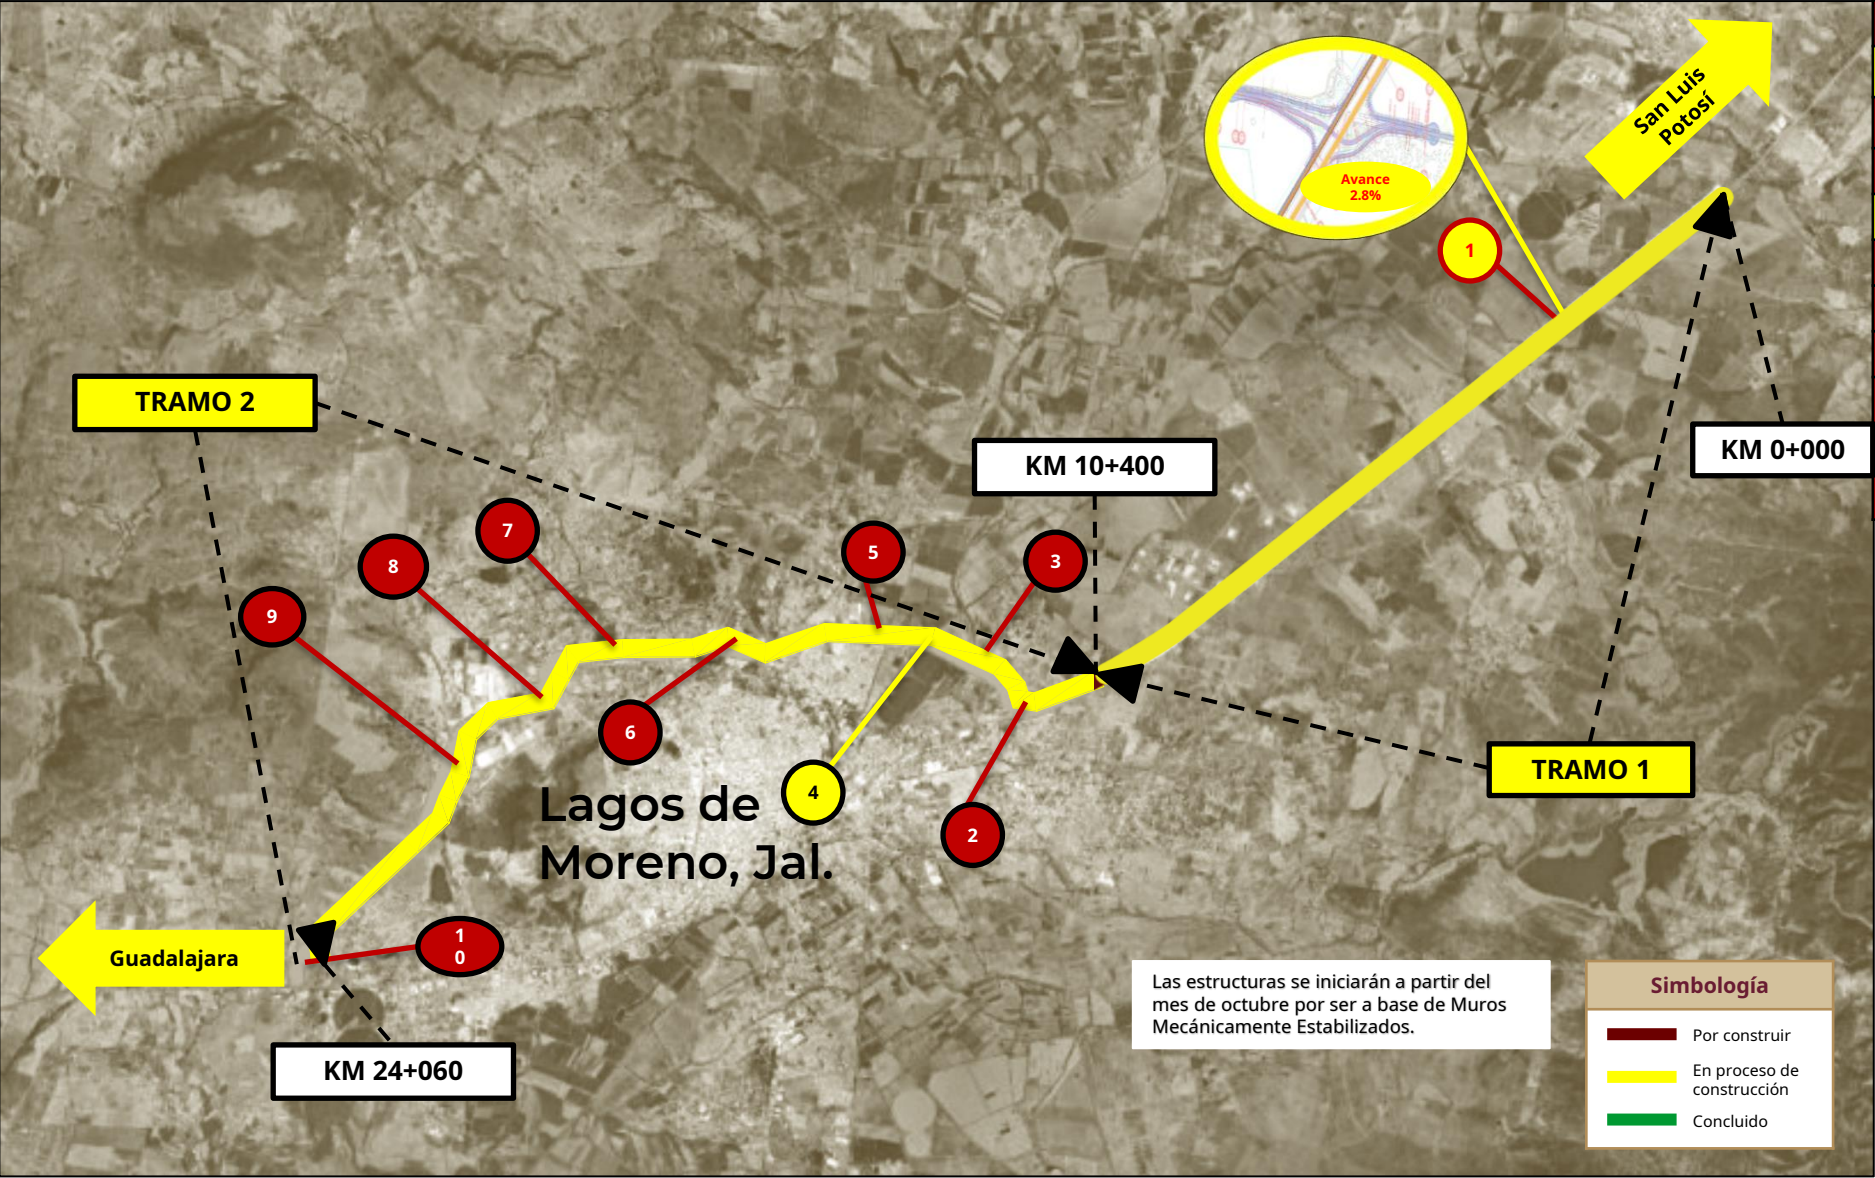

Descripción	
1	PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - Avance 2.8%. Problemas de DDV.
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)-
3	PIV con entronque "Fracc. Andalucía" km 12+120
4	Puente km 12+450 "Rio Lagos"- Avance 20.19%
5	PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620
6	PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900
7	PIV con entronque "Santorini" km 17+800
8	PIV con entronque "Encarnación" km 18+200
9	PSFC con retornos km 19+860
10	PIV con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920

Avance físico general

- Real: 28.17%
- Programado: 17.55%
- Semanal: 2.65%
- Financiero: 14.29 %

Nota:
El porcentaje varía por el incremento del monto total de la obra con el tramo 2 a \$2,345 MDP

- Inversión: 2,345 mdp**
- Inicio:** 1 de marzo de 2025
Término: 28 de febrero de 2028
- Meta:** 25 km
- 7,035 empleos generados**
(2,345 empleos directos y 4,690 empleos indirectos)
- 250,000 habitantes beneficiados**
- 20 minutos** de ahorro en tiempo

Las estructuras se iniciarán a partir del mes de octubre por ser a base de Muros Mecánicamente Estabilizados.


Simbología	
	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

PAVIMENTOS TRONCAL TRAMO 1						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	10/10/2025 al 16/10/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Carpeta asfáltica	6,617	6,417	200	0	846	En proceso
SEÑALAMIENTO TRONCAL TRAMO 1						
Defensa metálica	5,150	5,000	150	0	1,472	Se inició antes de lo programado febrero 2026)
REHABILITACIÓN DE PIV						
P.I.V. KM 4+800	1	1	0	0.14	0.86	Terminado

TERRACERIAS TRONCAL TRAMO 2						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	10/10/25 al 16/10/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Subrasante (m3)	46,635	6,438.29	40,196.71	741	821.12	En proceso
Base hidráulica (m3)	34,468	1,512	32,956	641	1,152	En proceso
O.D.T. KM 23+120	1	0.45	0.55	0.10	0.10	En proceso
O.D.T. KM 23+440	1	0.45	0.55	0.10	0.10	En proceso
O.D.T. KM 20+605	1	0.20	0.80	0.10	0.20	En proceso

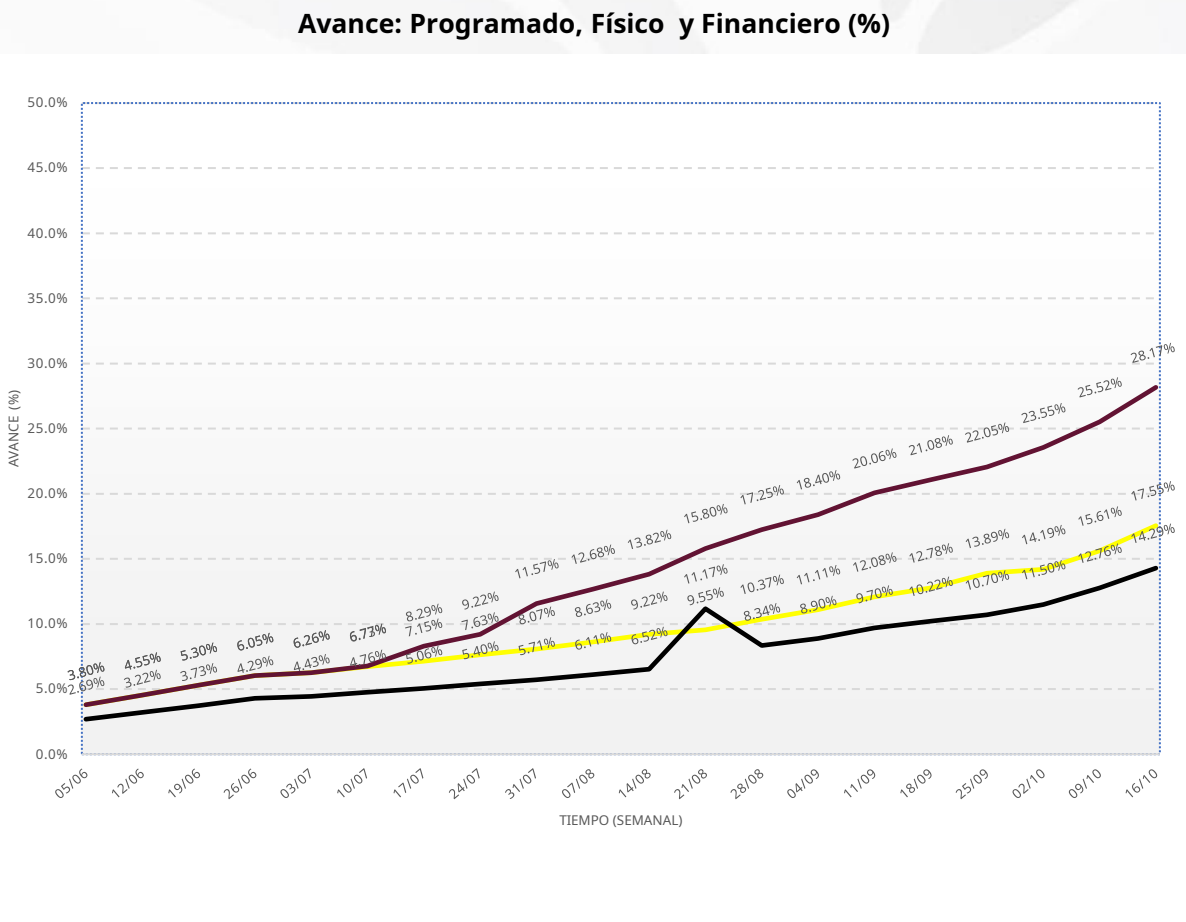

	03 de octubre al 09 de octubre	10 al 16 de octubre 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	200	200
Maquinaria	61	61

