




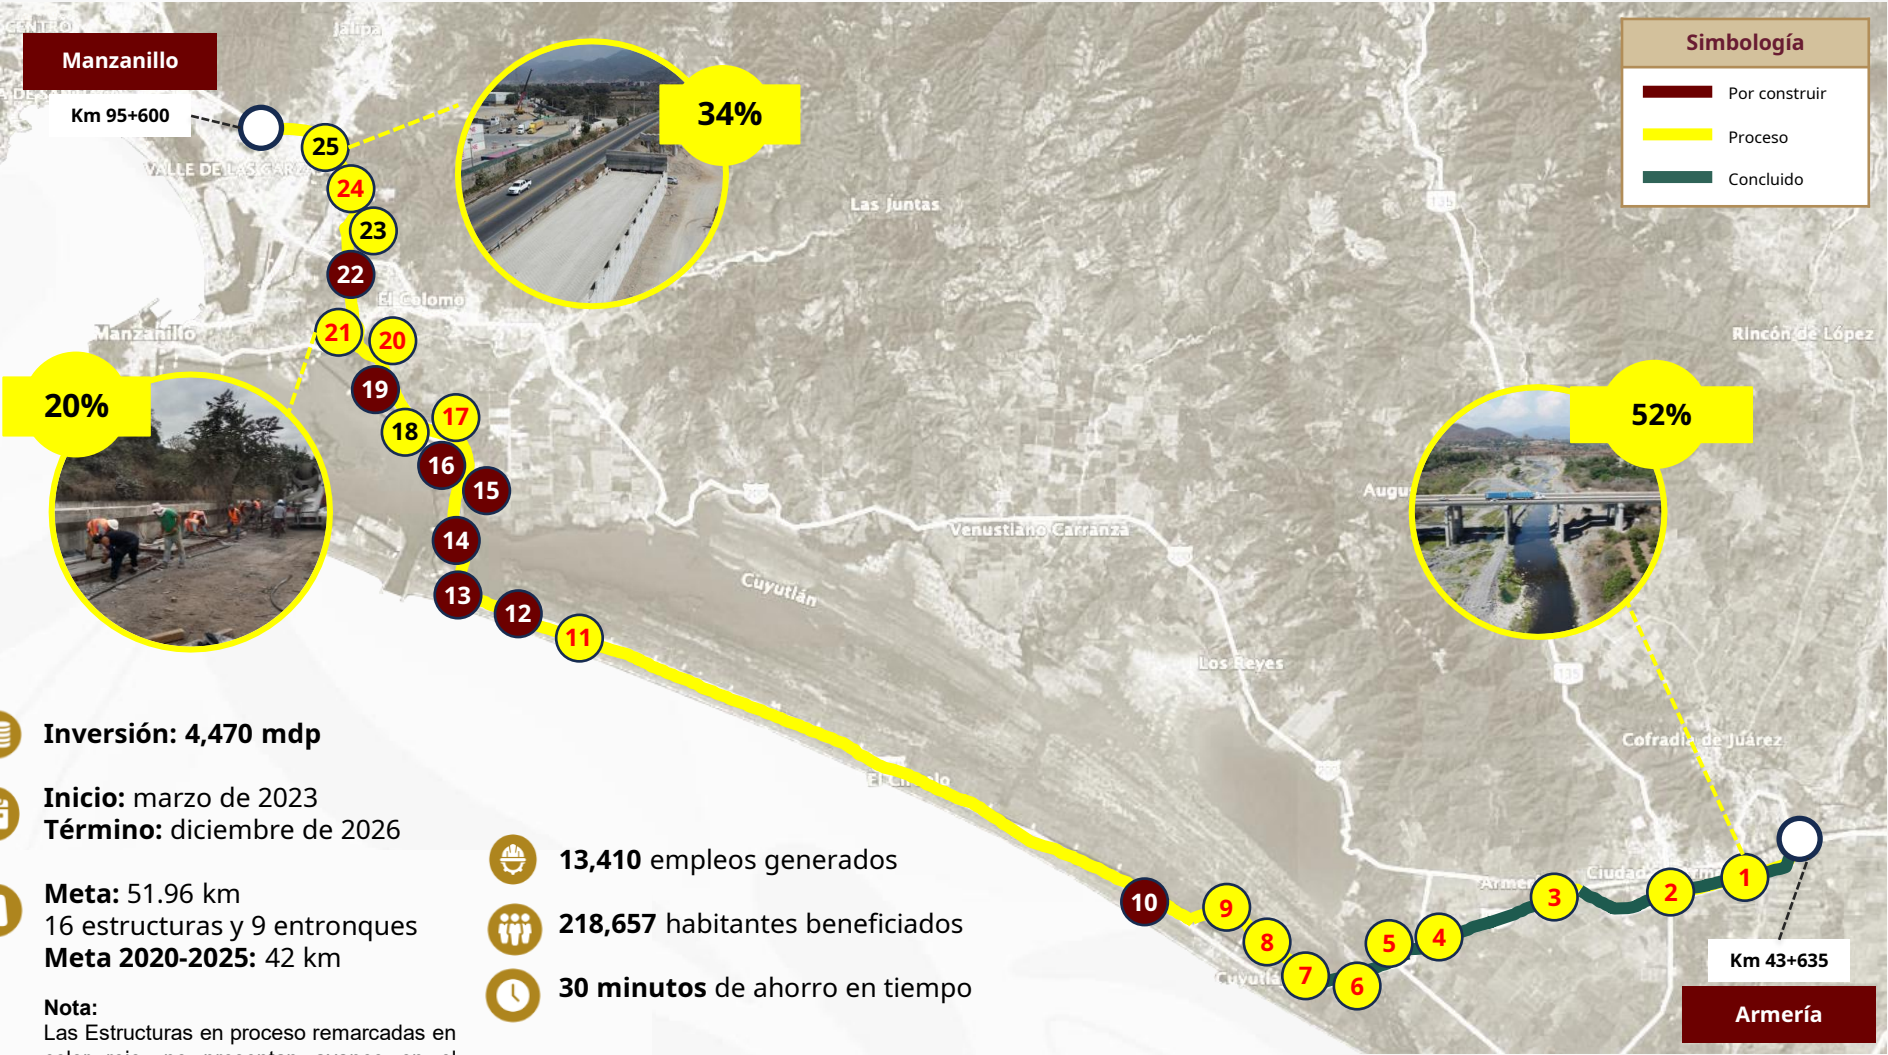

# Colima

## Tramo Armería-Manzanillo

**Avance físico**

- Programado: 86.01%
- Real: 24.57%
- Semanal: 0.10%
- Financiero: 20.79%



- **Inversión: 4,470 mdp**
- **Inicio:** marzo de 2023  
**Término:** diciembre de 2026
- **Meta:** 51.96 km  
16 estructuras y 9 entronques  
**Meta 2020-2025:** 42 km
- **13,410** empleos generados
- **218,657** habitantes beneficiados
- **30 minutos** de ahorro en tiempo

**Concesionaria:** PINFRA

NOTA: La fecha de término se obtuvo de un programa provisional entregado por concesionaria. En proceso de regularizar.

Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (52%) Falta de FT y Maquinaria
2	Entronque Paraíso km 47+741 (78%) No esta programado avance
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (81%). Falta regularizar programa
4	PSV Tilapia km 54+350 (72%) No esta programado avance
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (41%) Cambió el orden del programa mas información en diap. 4
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (6%) No esta programado avance
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (9%) Falta aumentar Fuerza de trabajo y mejorar logística
8	Entronque Salineros km 59+551 (5%) Falta regularizar programa
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (79%) Se trabaja en otros frentes de esta estructura
10	Entronque Cuyutlán km 60+880
11	PIV Retorno en U km 77+600 (67%) Falta aumentar Fuerza de Trabajo
12	Entronque Retorno en U km 77+600
13	PSFFCC Tepalcates I km 79+900
14	Entronque Tepalcates I km 80+100
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+323
16	Entronque Tepalcates II km 83+500
17	Puente Adjuntas km 85+950 (36%) No esta programado avance
18	PSV Panteones km 87+300 (21%)
19	Entronque Panteones km 87+630
20	PIV Minatitlán Lib km 92+000 (4%) No esta programado avance
21	PIV Minatitlán Lib II km 92+000 (20%) Se trabajo en fabricación de traves de otras prioridades.
22	Entronque Minatitlán km 92+731
23	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (6%)
24	Entronque Jalipa km 94+100 (9%) Hay que cambiar el tránsito al cuerpo izquierdo del paso del puente
25	Puente Jalipa km 94+158 (34%)

# Colima

## Tramo Armería-Manzanillo




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	11/07/25 al 17/07/25		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	250,827	0	0	2,820	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	473,065	340,844	0	1,629	
Base y sub base (m³)	260,119	125,454	134,665	0	2,583	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente

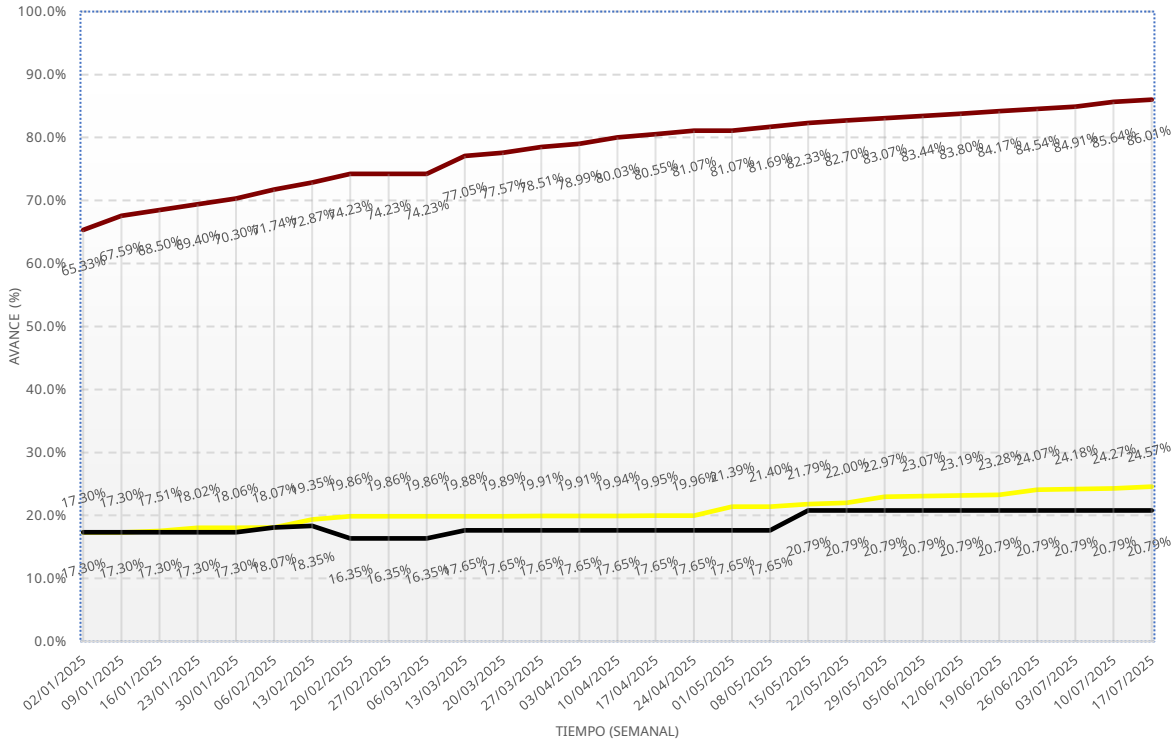

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	04 de julio al 10 de julio	11 de julio al 17 de julio
Fuerza de Trabajo (personas)	205	181
Maquinaria	82	65



**2025**  
Año de  
**La Mujer**  
**Indígena**
