

# Michoacán

## Tramo Pátzcuaro-Uruapan


**Avance físico**

• Programado: 100.00%

• Real: 98.08%

• Semanal: 0.18 %


• Financiero: 69.85%

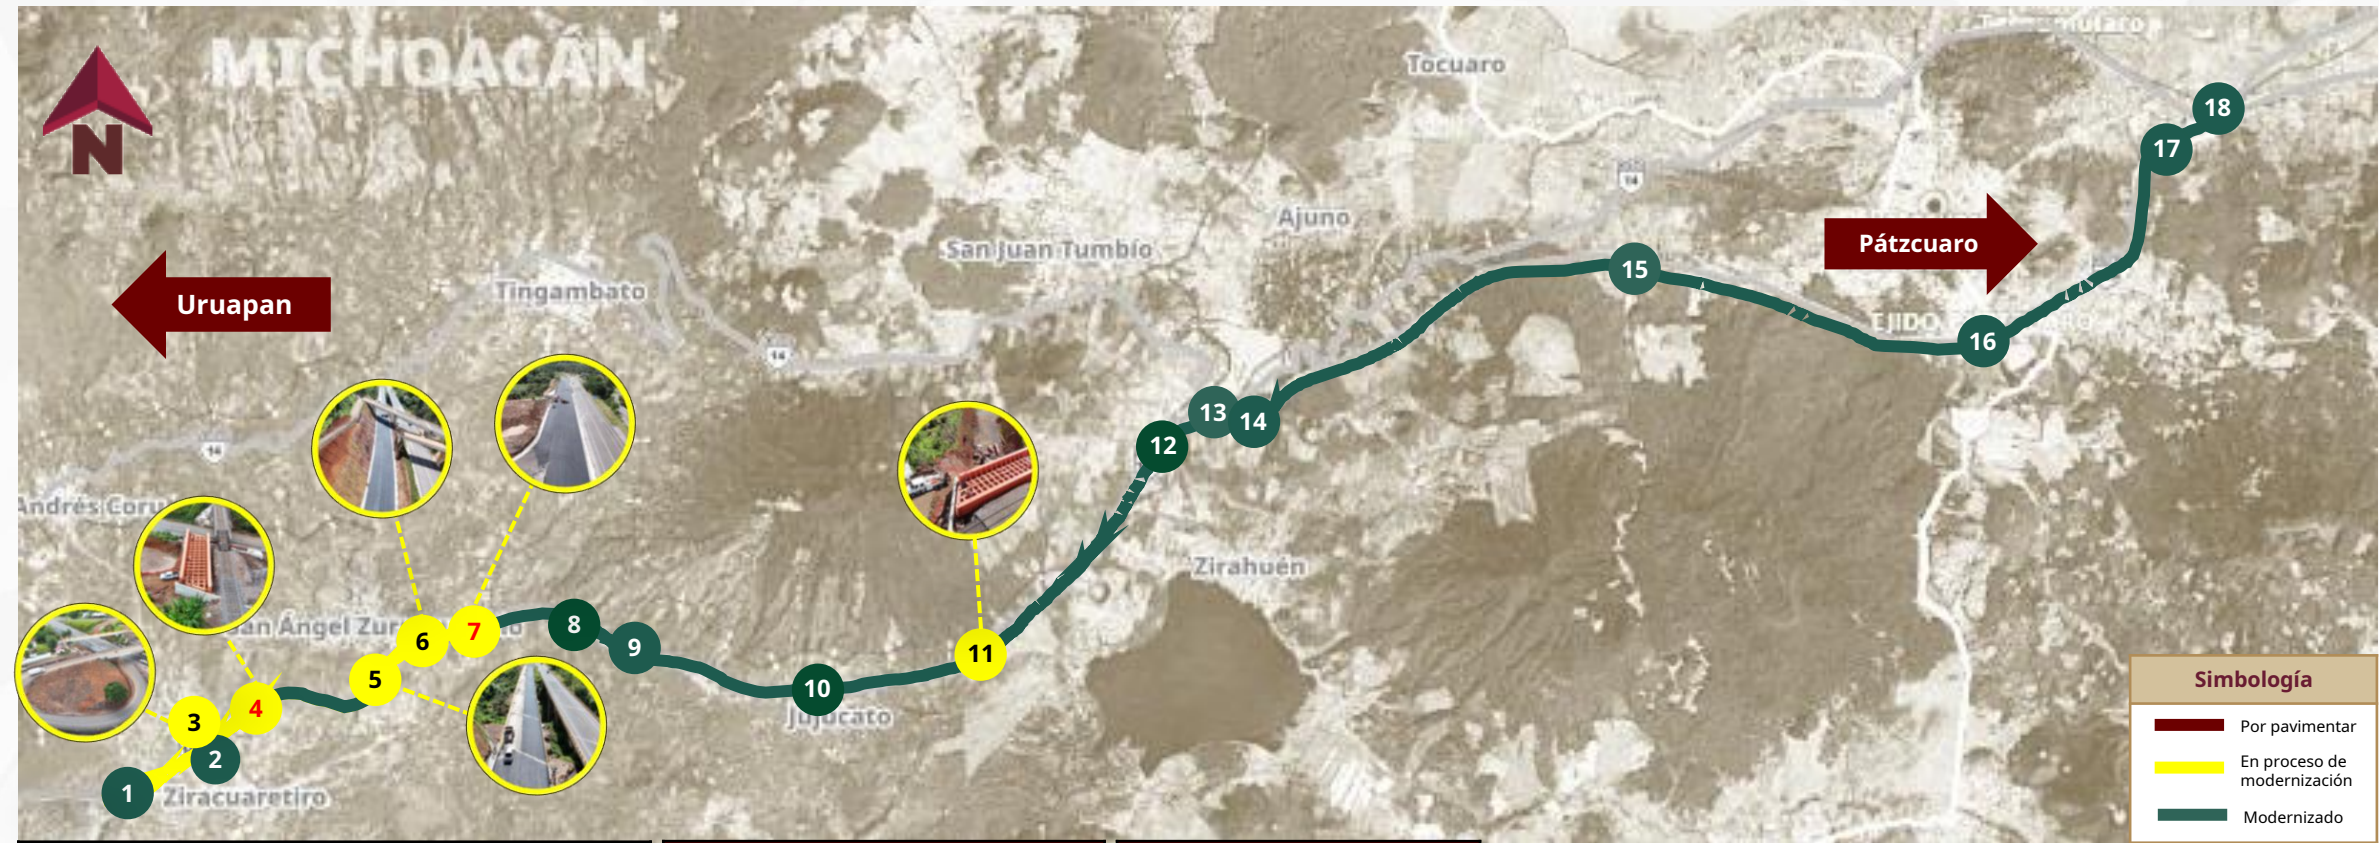


Descripción	
1	Entronque Zirimicuaro km 93+500
2	Puente canal km 92+210
3	Entronque Caracha km 92+100, (89.00%).
4	PIFFCC km 91+754, (39.60%). La continuidad de los trabajos se encuentra en pausa mientras se lleva a cabo una revisión del proyecto
5	Puente Canintzio km 88+283, (99.92%)
6	PIV km 88+054, (99.95%)


Descripción	
7	Entronque San Ángel km 87+400, (99.95%) En espera de verificación para recepción de los trabajos
8	Rampa de emergencia II km 86+500
9	Rampa de emergencia I km 84+100
10	Entronque Jucucato km 79+489
11	PIFFCC km 73+584, (40.00%)
12	Viaducto Zirahuén km 70+278
13	Entronque Zirahuén km 68+600


Descripción	
14	Caseta de cobro remota Zirahuén 68+600
15	Plaza de cobro Zirahuén km 60+500
16	Entronque Pátzcuaro II km 53+600
17	Entronque Pátzcuaro I km 47+500
18	Entronque las trojas km 47+00


 **Inversión:** 1,792 mdp

 **Inicio:** Julio 2017  
**Término:** 30 septiembre 2025

 **Meta:** 46.79 km; 58 Totales (1 plaza de cobro, 1 puente 1 viaducto, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado).

 **200 mil** habitantes beneficiados

 **25 minutos** de ahorro en tiempo.

 **1,792** empleos directos generados  
**3584** empleos indirectos generados


**Concesionaria :** PINFRA.

# Michoacán

## Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	09/10/2025 al 16/10/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Troncal						
PIFCC km 73+584. Superestructura	2	1	1	1	1	Colocación y ajuste mediante torque de tornillería en estructura metálica
PIV 88+054 Limpieza general	12	8	4	4	4	Retiro de cimbra de madera en diafragmas interiores.
Entronque Caracha Terracerías	0.200 km	0.100 km	0.100 km	0.100 km	0.100 km	Suministro y conformación de base hidráulica.
Km 92+833 Terracerías	0.200 km	0.100 km	0.100 km	0.100 km	0.100 km	Suministro y conformación de material de banco para subrasante (bajo PIV).

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

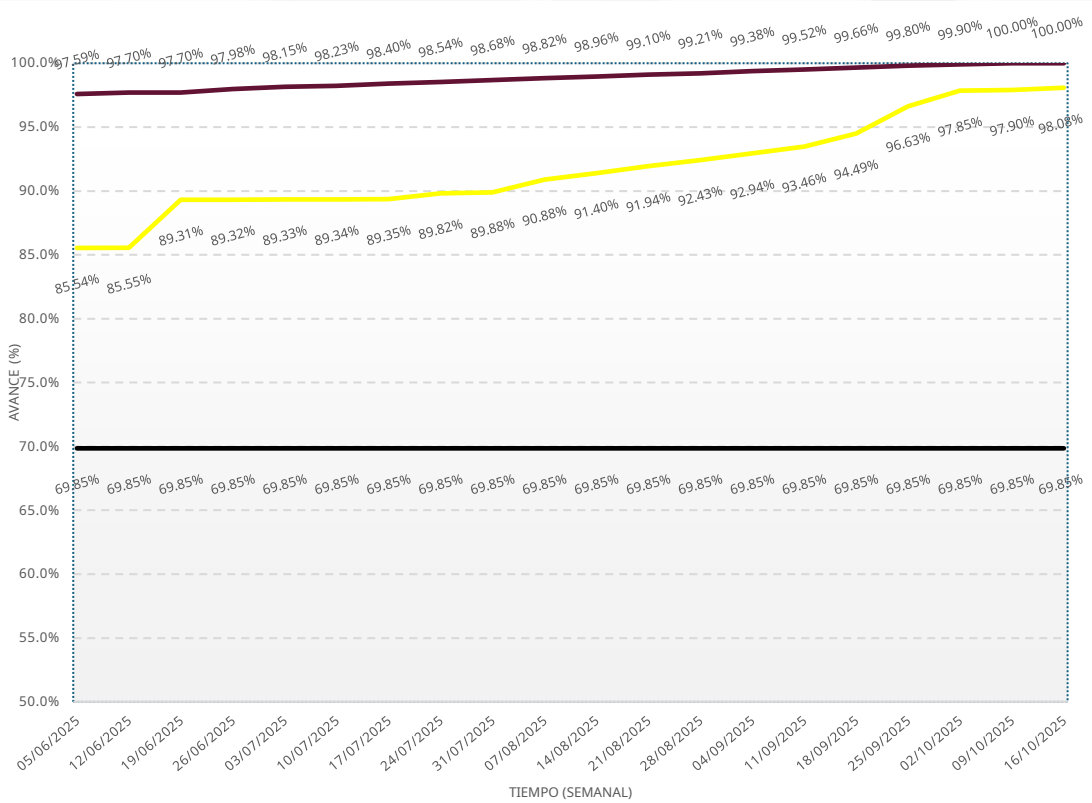

	02 de octubre al 09 de octubre	09 de Octubre al 16 de Octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	120	120
Maquinaria	32	32



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena
