

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 9.31 %
- Semanal: 0.15 %
- Real: 8.91 %
- Financiero: 0%

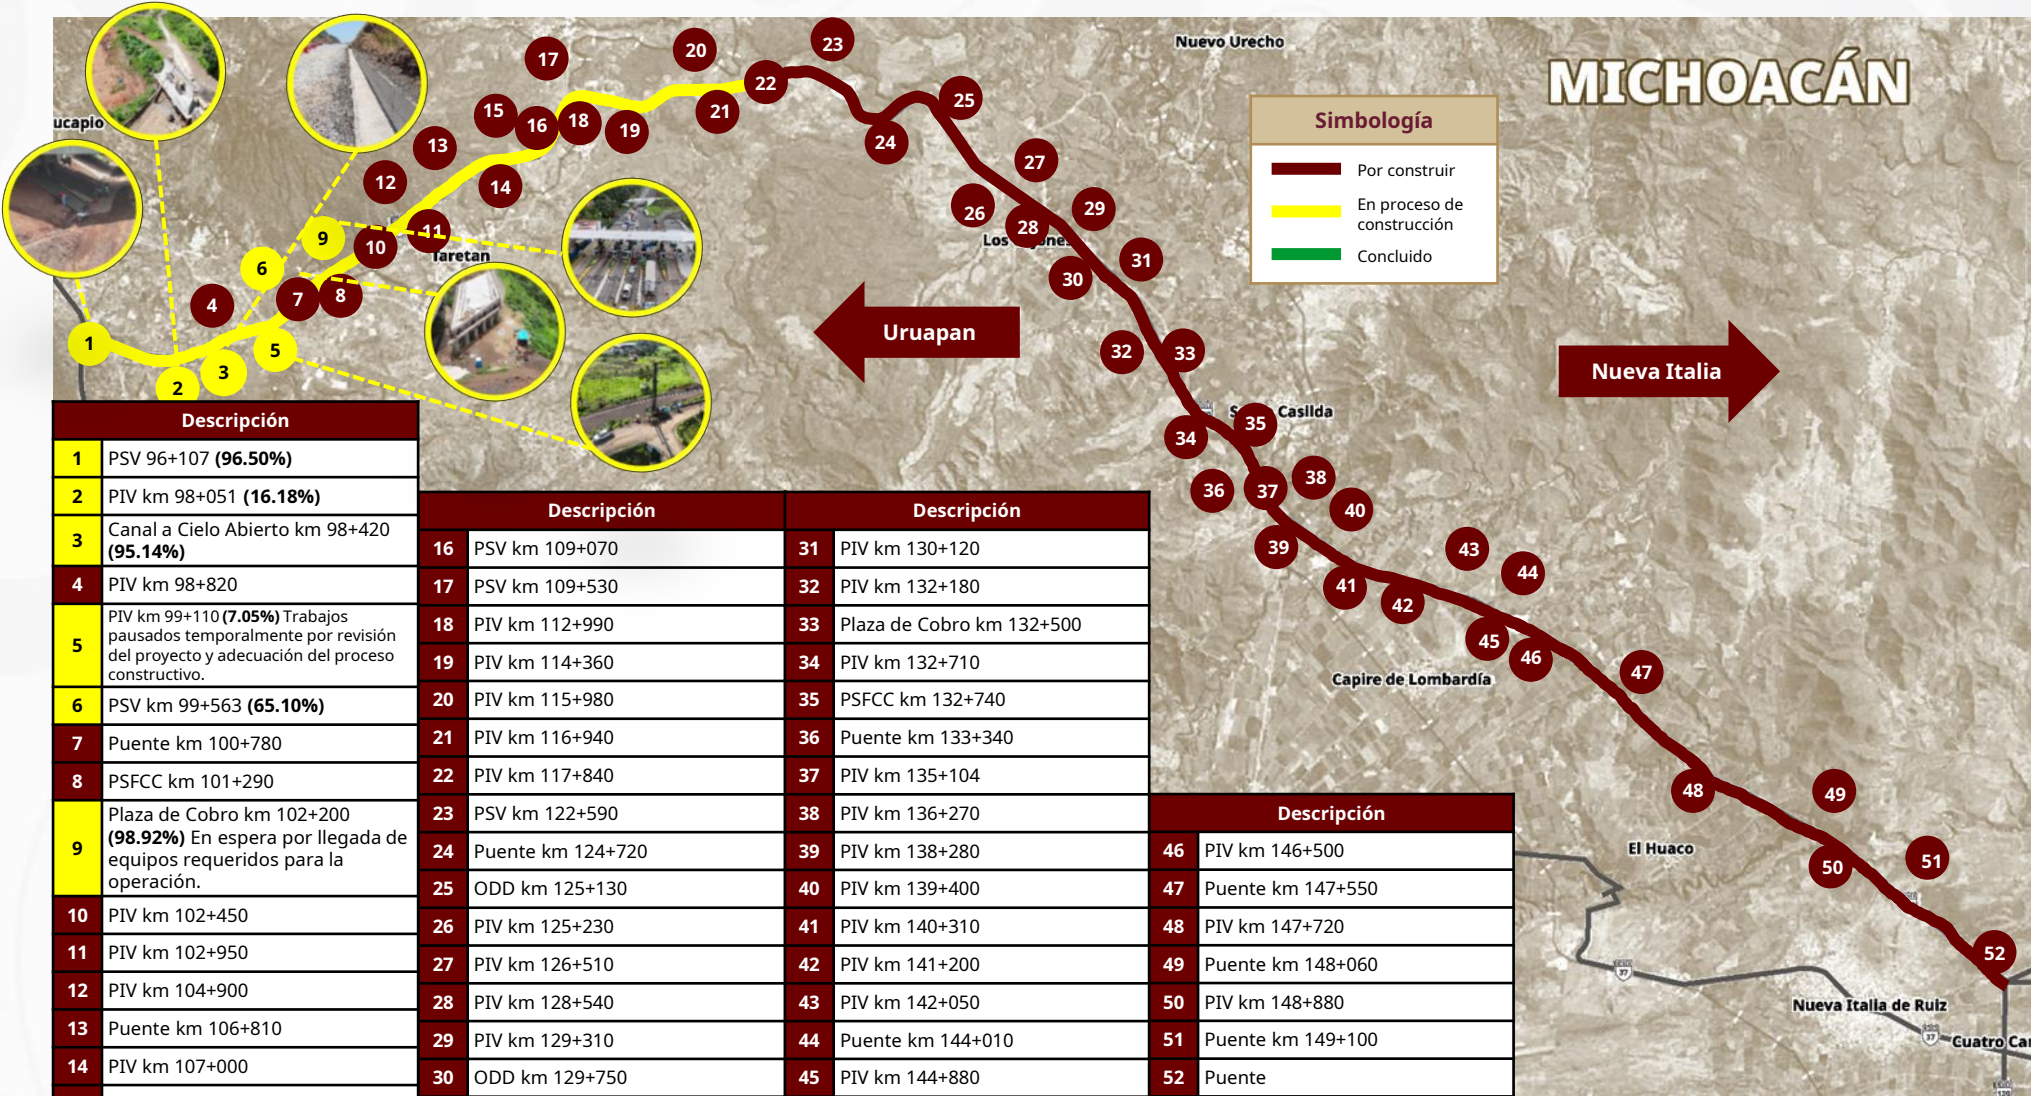


- Inversión: 7,049 mdp**
- Inicio:** noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
- Meta: 67.09 km**
 - 65 km (troncal)
 - 2.09 km (estructuras)
 - 2 plazas de cobro, 10 puente,
 - 6 entronques, 54 cruces y
 - múltiples obras de drenaje.
- 12,480 empleos generados**
- 1,800,000 habitantes beneficiados**
- 25 minutos de ahorro en tiempo**

Concesionaria : PINFRA.

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

| Elemento | Meta | Ejecutado acumulable | Faltante | 21/08/2025 al 28/08/2025 | | Observaciones |
|--------------------------------|-------|----------------------|----------|--------------------------|-----------|--|
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| Subbase | 65 km | 6.91 km | 58.09 km | .200 km | .200 km | |
| Subyacente | 65 km | 8.44 km | 56.56 km | .200 km | .200 km | |
| PSV 96+107 Conos de derrame | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Colado de losas de acceso del caballete #1 |
| PSV 99+563 Guarniciones | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Habilitado de cimbra de madera guarnición (parapeto de concreto) en el lado izquierdo. |

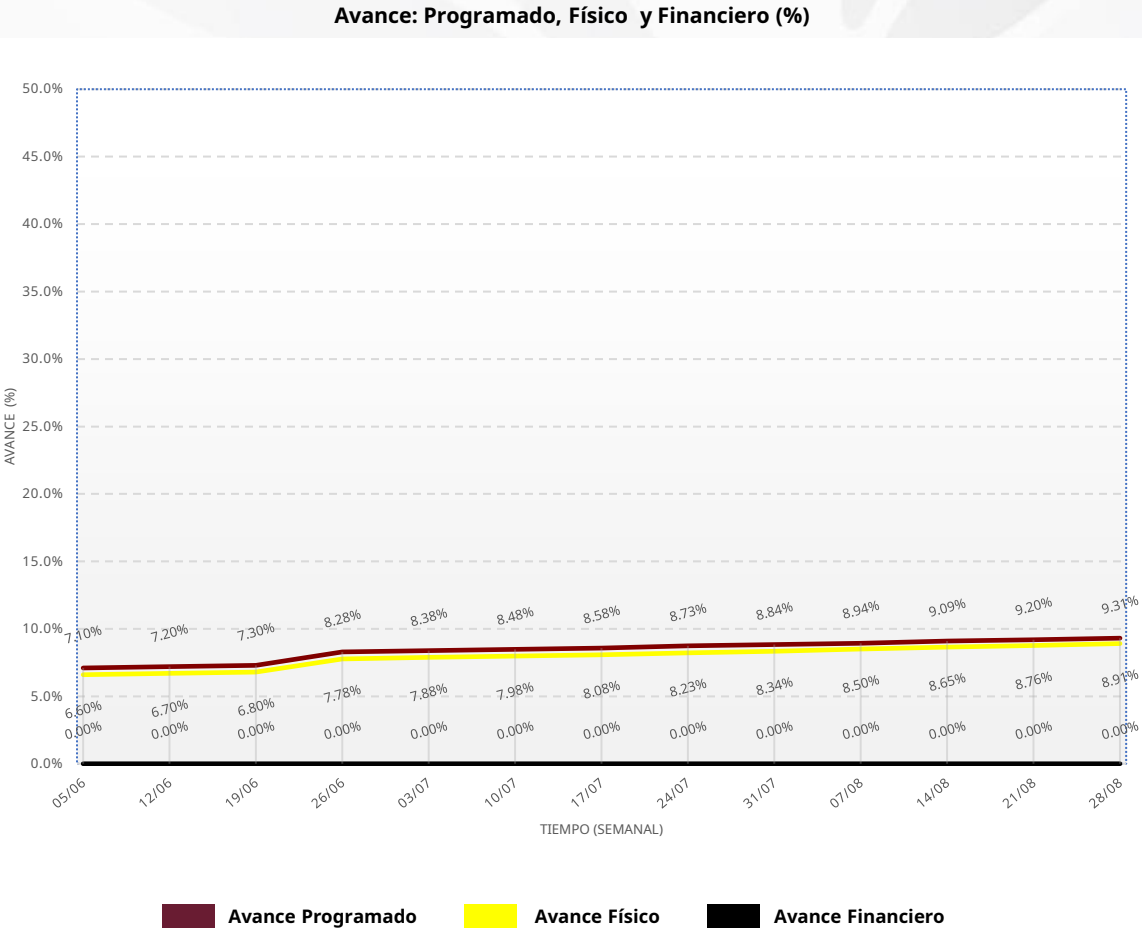

| | Del 15 de agosto al 21 de agosto | Del 22 de agosto al 28 de agosto. |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 1,500 | 323 |
| Maquinaria | 570 | 570 |

