





Estado de México




Atizapán-Atlacomulco



2025
Año de
La Mujer
Indígena

- **Inversión:** 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)
- **Meta:** 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 79 PSVyG


- **Inicio:** 01 marzo 2016
Término: 30 junio 2027
- **Avance físico:**
 - Programado: 75.25%
 - Real: 40.15%
 - Financiero: 23.24%
 - Semanal: 00.20%

- **132,909** empleos generados
- **1 millón 244 mil** habitantes beneficiados
- **60 minutos** de ahorro en tiempo

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	15/08/25 al 21/08/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	184	160	2	0.61	• Se requiere mas fuerza laboral para cumplir los programas estipulados.
Zapatas	86	39	47	1	0.47	
Columnas	96	18	78	1	0.24	
Cabezales	76	6	70	1	0.25	
Caballetes	24	4	20	1	0.24	
Trabes metálicas	29	0	29	0.5	0.64	

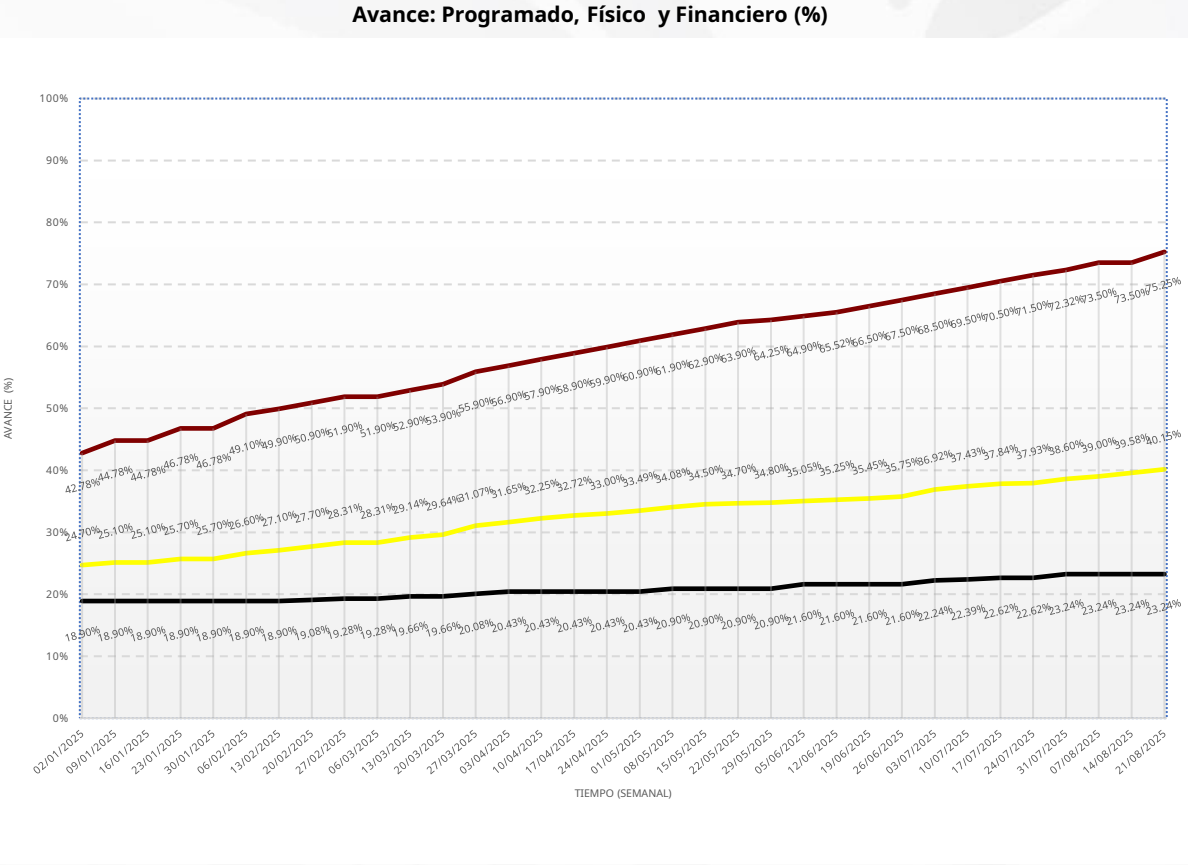

	Del 08 agosto al 14 de agosto	15 de agosto al 21 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	2,275	1,708
Maquinaria	521	440



2025
Año de
La Mujer
Indígena
