

Colima

Tramo Armería-Manzanillo


Avance físico

• Programado: 86.38%

• Real: 24.66 %

• Semanal: 0.09 %

• Financiero: 20.79%

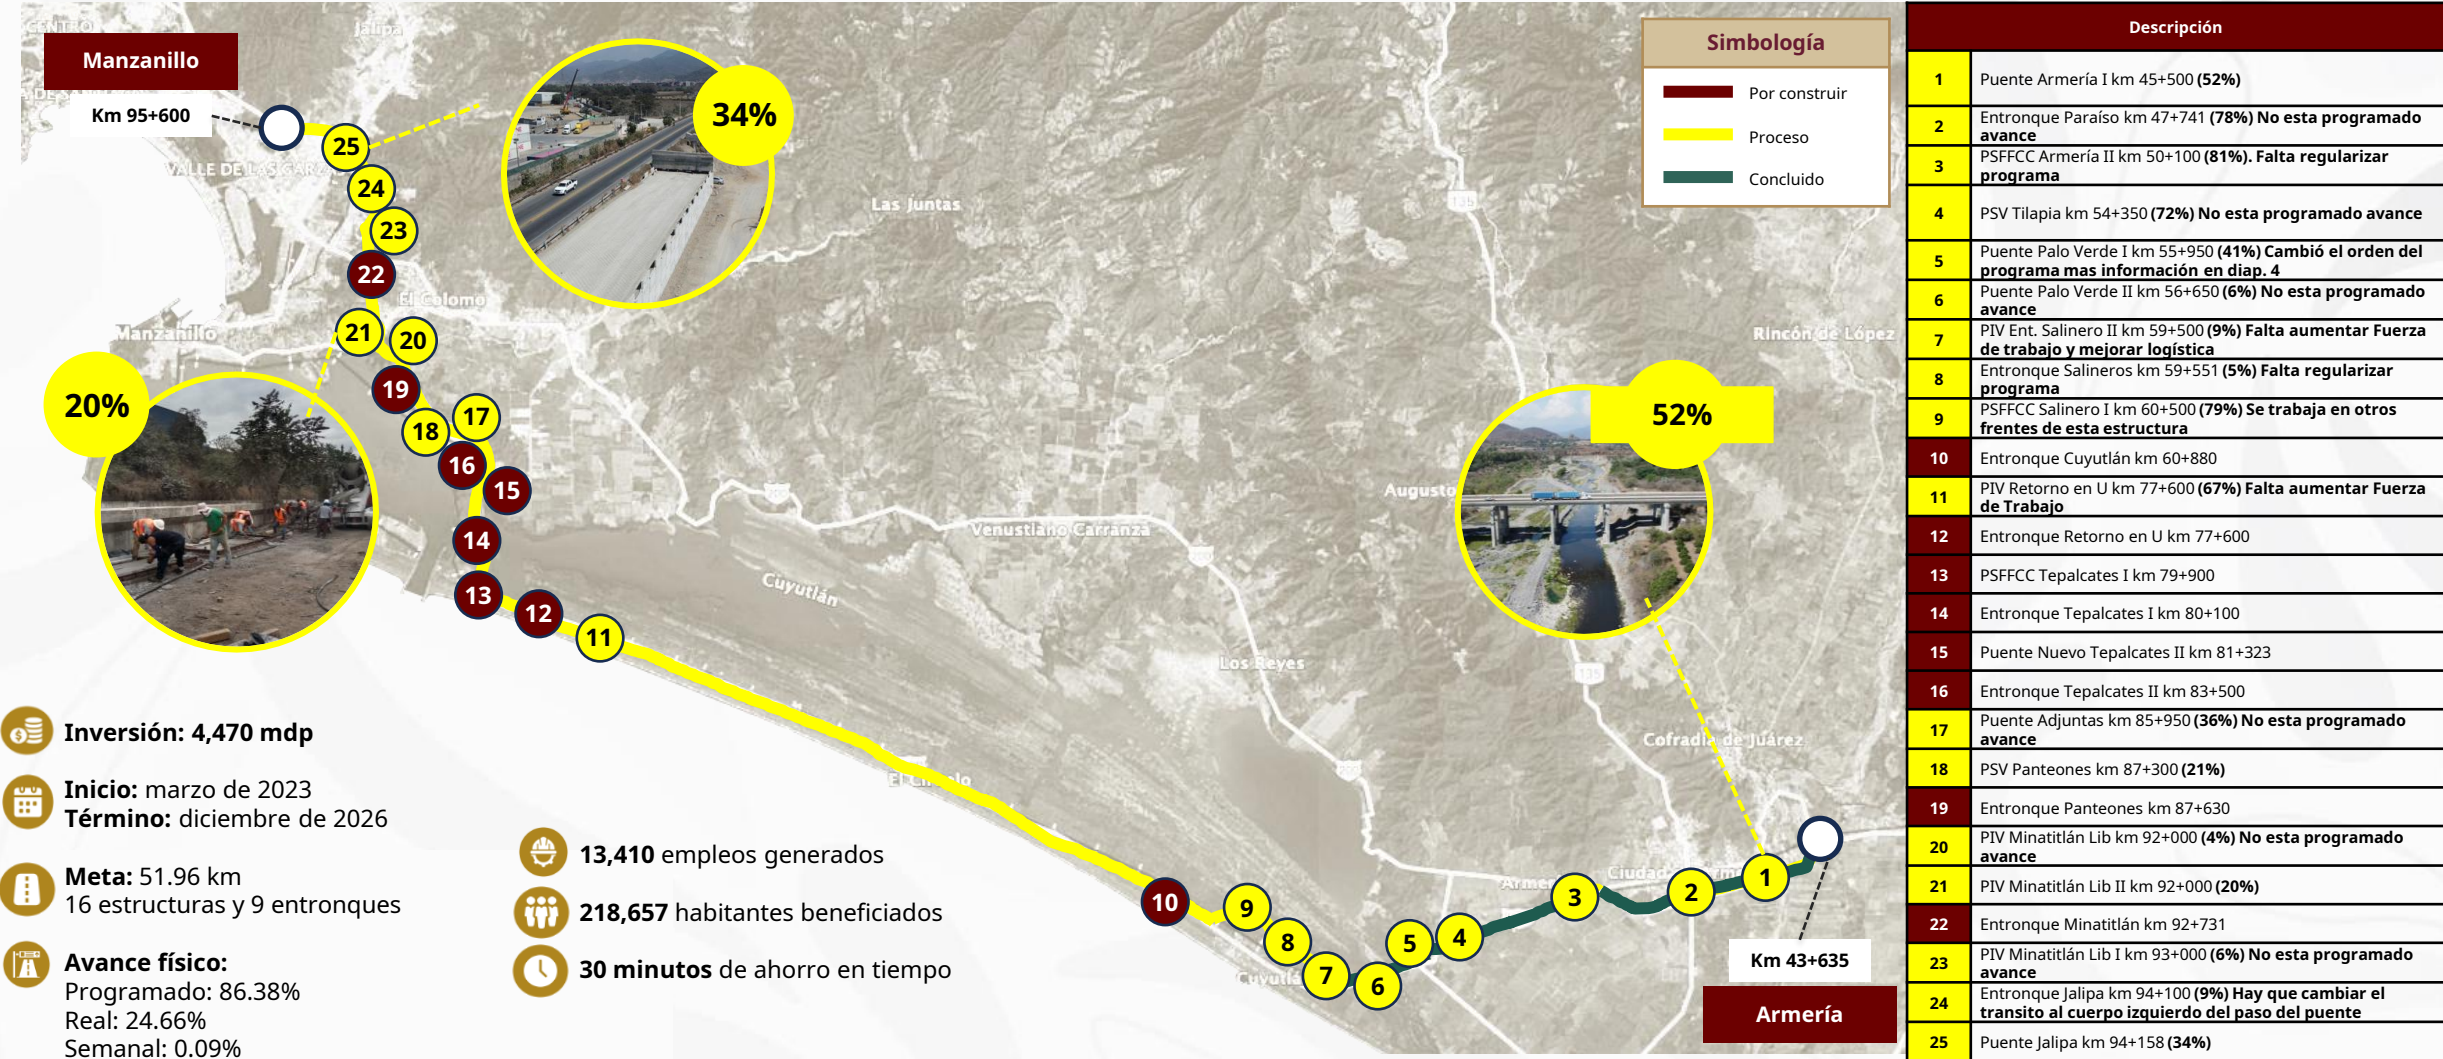



Inversión: 4,470 mdp



Inicio: marzo de 2023
Término: diciembre de 2026



Meta: 51.96 km
16 estructuras y 9 entronques



Avance físico:
Programado: 86.38%
Real: 24.66%
Semanal: 0.09%
Financiero: 20.79%



13,410 empleos generados



218,657 habitantes beneficiados



30 minutos de ahorro en tiempo

Concesionaria: PINFRA


NOTA: La fecha de término se obtuvo de un programa provisional entregado por concesionaria. En proceso de regularizar.

Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Elemento	Intervención	Ejecutado	Faltante	18/07/25 al 24/07/25		Observaciones
		acumulado		Programado	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	253,647	0	0	2,256	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	474,694	339,215	0	5,027	
Base y sub base (m³)	260,119	128,036	132,083	0	624	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente

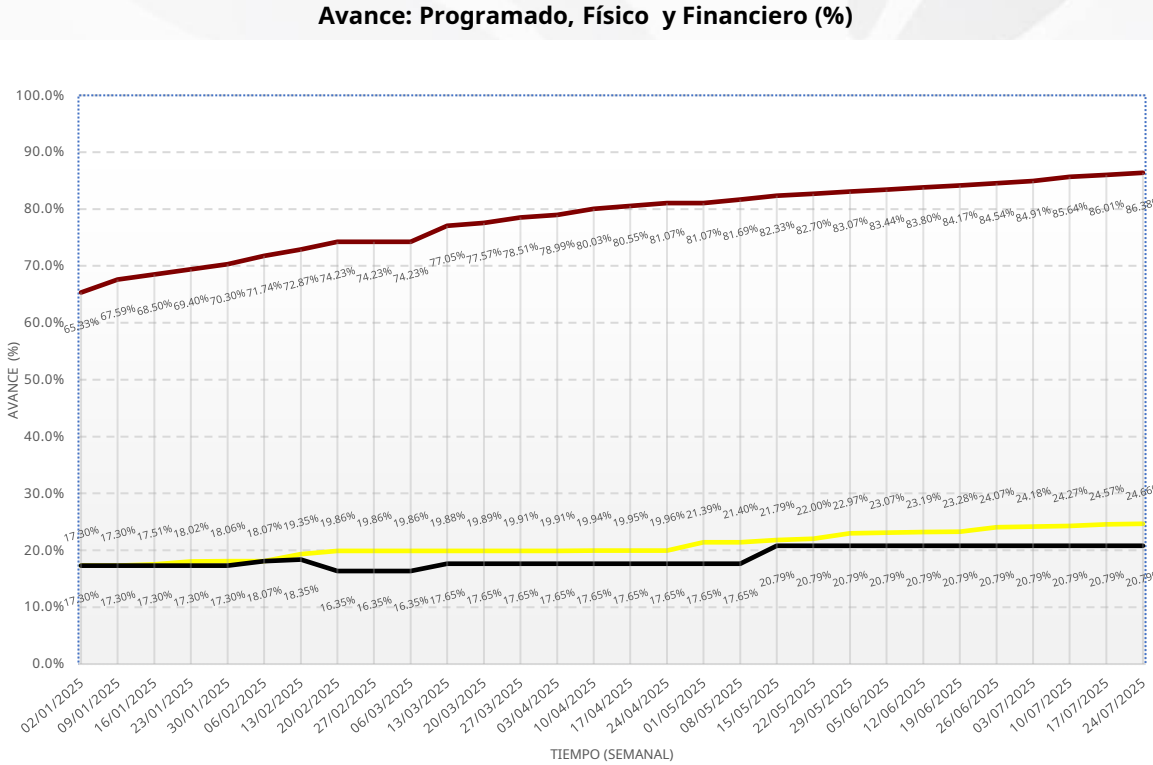

	Avance Programado	Avance Físico	Avance Financiero
	11 de julio al 17 de julio		18 de julio al 24 de julio
Fuerza de Trabajo (personas)	181		200
Maquinaria	65		81

