



Nayarit


Las Varas-Puerto Vallarta (tramo III)



Descripción	
1	Puente Rio Las Animas km 240+401
2	PIV 2V a zona agrícola km 144+237
3	PSV 1 V Sin Nombre km 146+700
4	Puente canal de riego km 146+800
5	PIV El Naranjo km 148+260
6	Plaza de cobro La Misión 148+700
7	Puente canal con camino de servicio km 149+597
8	PSV a valle de Candras km 151+496.22
9	PSV km153+225
10	PSV a San José del Valle km 153+538.25
11	Puente Rio Ameca km 154+903.25
12	Puente Canal km 156+754.01
13	PIV a San José del Valle km 157+663
14	Puente canal de riego km 158+876
15	Puente Mascota km 159+302
16	PSV Pto. Vallarta- Las Palmas km 160+427
17	Puente Santo Domingo km 162+181
18	PSV km 163+005
19	PSV km 163+452
20	Entronque Aeropuerto km 163+793, (15.0%) Sin asignación de recursos por la concesionaria.
21	Ramal Aeropuerto
22	PSV km 4+690
23	PSV km 3+018.9
24	PSV A.V. México km 1+000.13
25	Entronque Vallarta km 0+000, (82.1%)

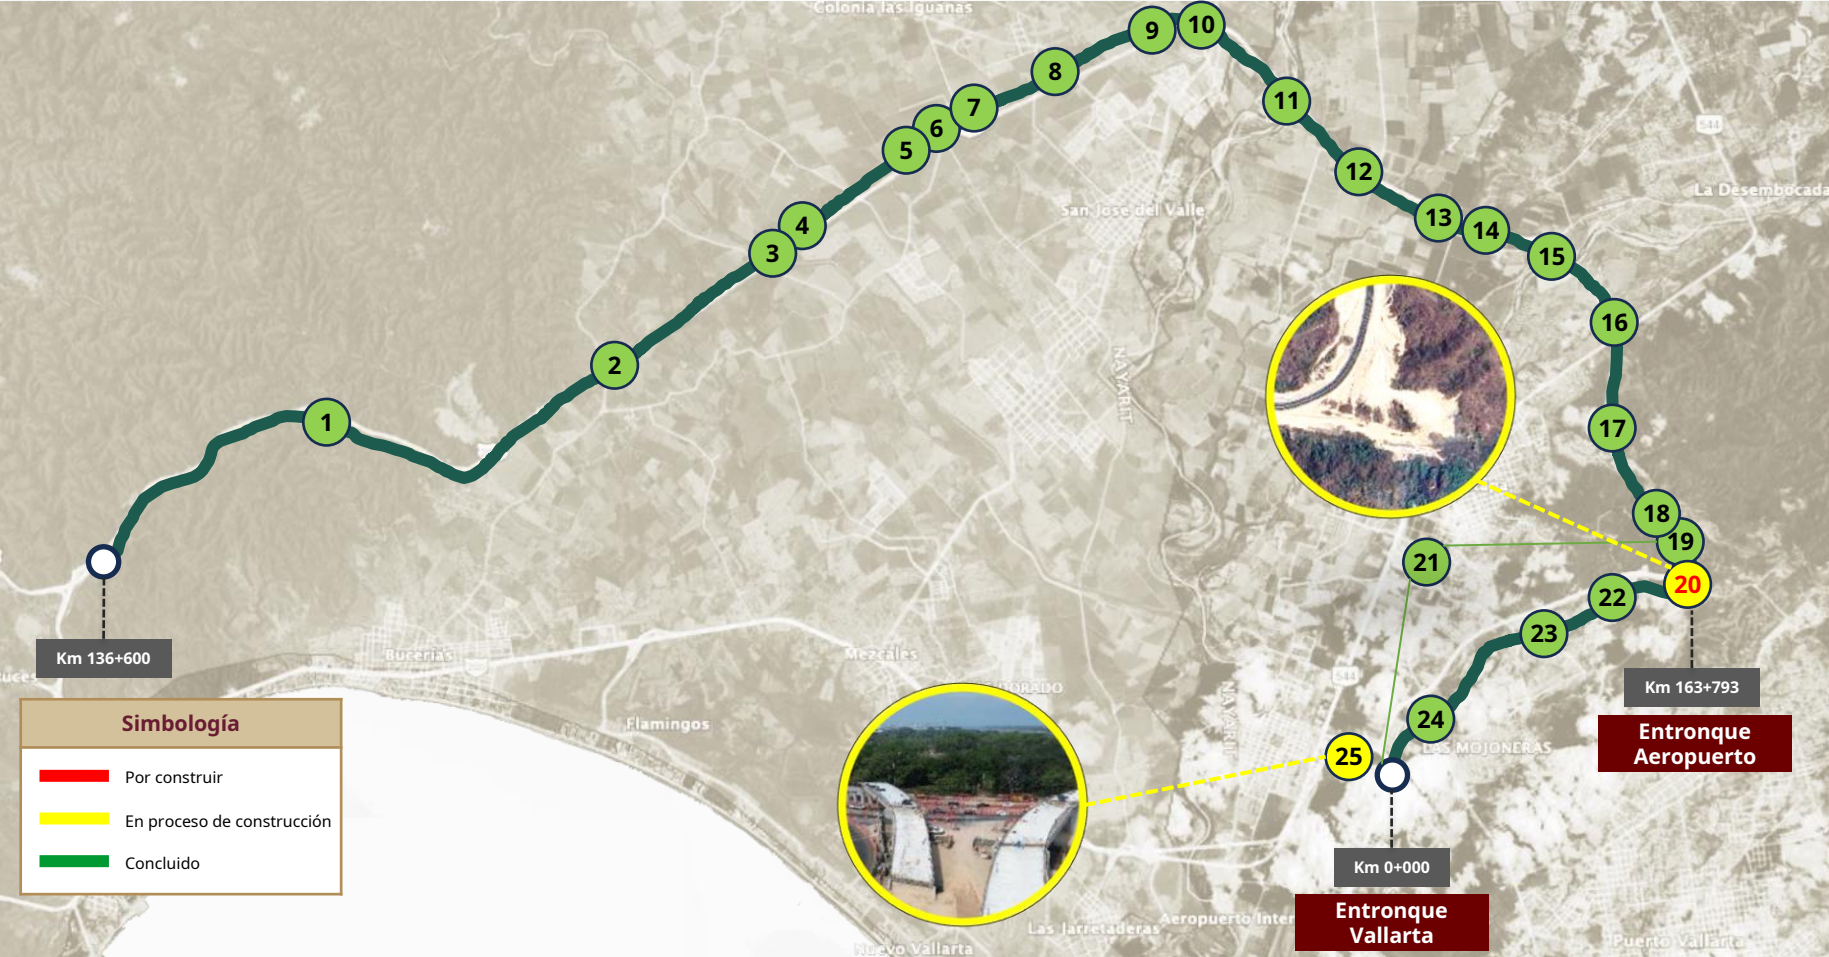


Inversión total: 2,577 mdp



Inicio: septiembre de 2022


Término: septiembre de 2025, inaugurada y puesta en operación diciembre de 2024 (pendiente complementaria)

Concesionaria: IDEAL



Meta: 34.9 km

8 puentes, 13 estructuras de cruce, 2 entronques, 1plaza de cobro y 1 ramal




Avance físico:

Programado: 100%


Real: 93.92%

Semanal: 0.03%


Financiero: 90 %




Avance de obra pendiente: Real: 6.08%



5,500 empleos generados



Más de 50,000 habitantes beneficiados




30 minutos de ahorro en tiempo

Nayarit

Las Varas-Puerto Vallarta (tramo III)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	01/08/25 al 07/08/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Entronque Vallarta. Eje 10.						
Guarnición y parapeto	611.4	212.0	399.4	0	57.6	Guarnición claro 6-7 lado izquierdo
MME	2,748	1,730.5	1,017.5	196.3	360.0	Colocación de escamas
Entronque Vallarta. Eje 20.						
Losa de rodamiento	346.0	122.0	224.0	0	54.6	Claro 5-6
Guarnición y parapeto	171.5	0	171.5			Se iniciarán trabajos al concluir colados de losas
MME	1828	0	1828	96.0		Se inician trabajos de mejoramiento de suelo

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

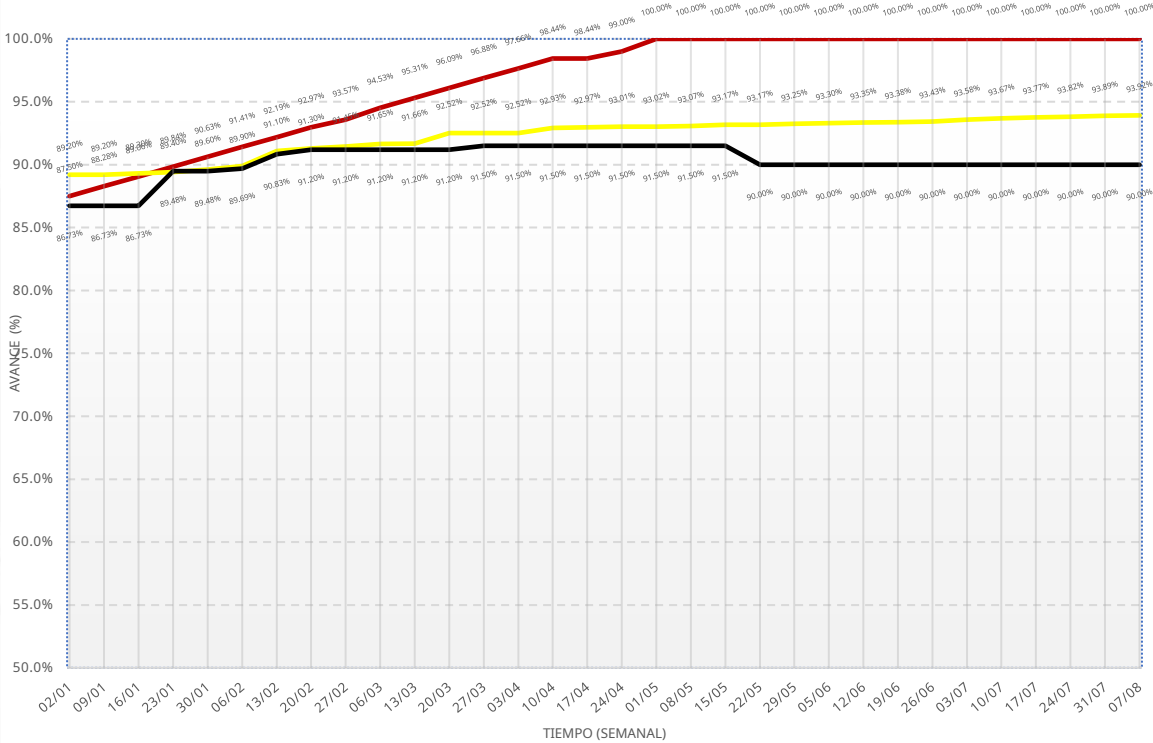

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 25 de julio al 31 de julio	Del 01 de agosto al 07 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	299	295
Maquinaria	20	18



2025
Año de
La Mujer
Indígena
