

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan


Avance físico

• Programado: 100.00%

• Real: 98.62%

• Semanal: 0.07 %

• Financiero: 69.85%

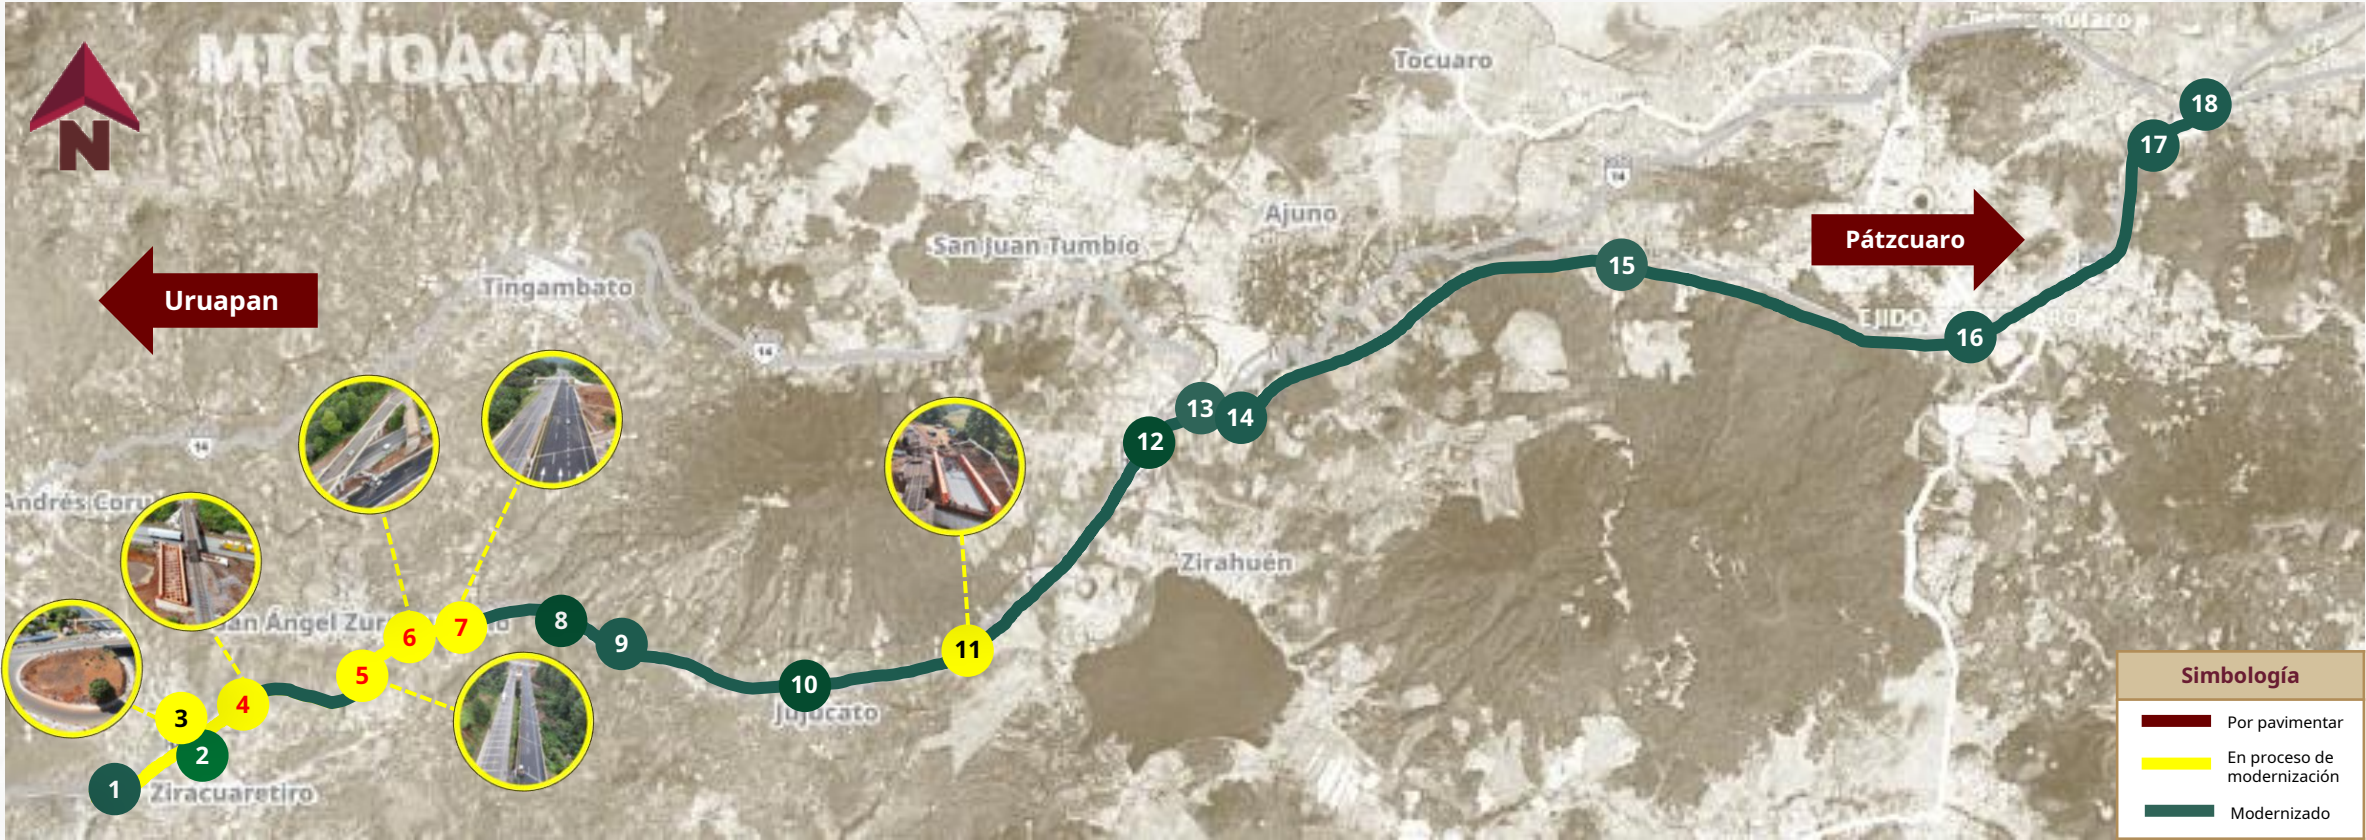

Descripción		Descripción		Descripción	
1	Entronque Zirimicuaro km 93+500	7	Entronque San Ángel km 87+400, (99.95%) En espera de verificación para recepción de los trabajos	14	Caseta de cobro remota Zirahuén 68+600
2	Puente canal km 92+210	8	Rampa de emergencia II km 86+500	15	Plaza de cobro Zirahuén km 60+500
3	Entronque Caracha km 92+100, (93.50%).	9	Rampa de emergencia I km 84+100	16	Entronque Pátzcuaro II km 53+600
4	PIFFCC km 91+754, (40.10%). La continuidad de los trabajos se encuentra en pausa mientras se lleva a cabo una revisión del proyecto	10	Entronque Jucucato km 79+489	17	Entronque Pátzcuaro I km 47+500
5	Puente Canintzio km 88+283, (99.95%) En espera de verificación para recepción de los trabajos	11	PIFFCC km 73+584, (42.80%)	18	Entronque las trojas km 47+00
6	PIV km 88+054, (99.95%) En espera de verificación para recepción de los trabajos	12	Viaducto Zirahuén km 70+278		

Inversión: 1,792 mdp

Inicio: Julio 2017
Término: 30 septiembre 2025

Meta: 46.79 km; 58 Totales (1 plaza de cobro, 1 puente, 1 viaducto, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado).

200 mil habitantes beneficiados

25 minutos de ahorro en tiempo.

1,792 empleos directos generados
3584 empleos indirectos generados

Concesionaria : PINFRA.

Michoacán


Tramo Pátzcuaro-Uruapan



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	06/11/2025 al 13/11/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Troncal						
PIFCC km 73+584. Superestructura	1	0	1	1	1	Suministro, colocación y vibrado de concreto hidráulico para losa
Entronque Caracha Km 92+197 Parapeto de concreto	1	0	1	1	1	Armado de acero para parapeto de concreto.
Entronque Caracha Km 92+197 Losa de acceso	2	0	2	2	2	Conformación y compactación de material para losa de acceso en PIV. .
Km 91+800 al 92+100 Pavimentos	0.300 km	0.0 km	0.300 km	0.300 km	0.300 km	Tendido de carpeta asfáltica

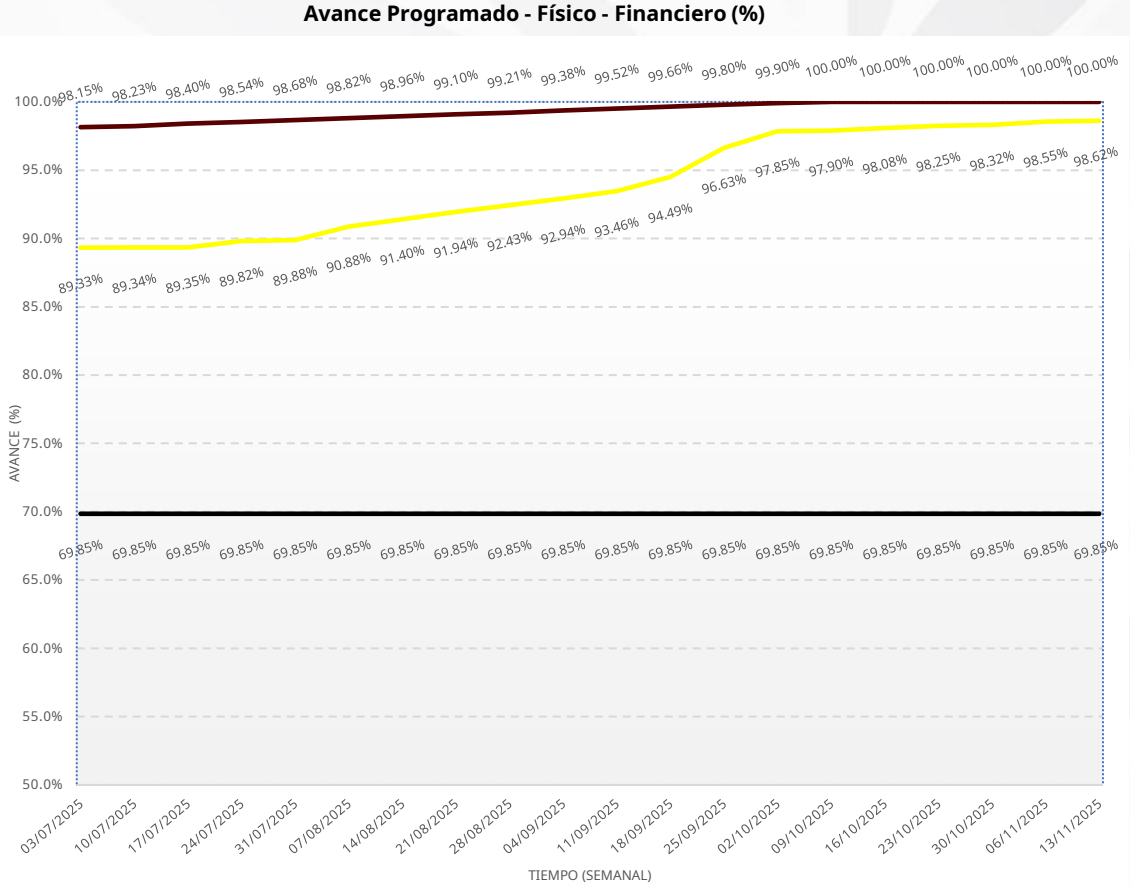

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	30 de octubre al 06 de noviembre	06 de noviembre al 13 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	120	120
Maquinaria	32	32



2025
Año de
La Mujer Indígena
