


# Michoacán

## Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

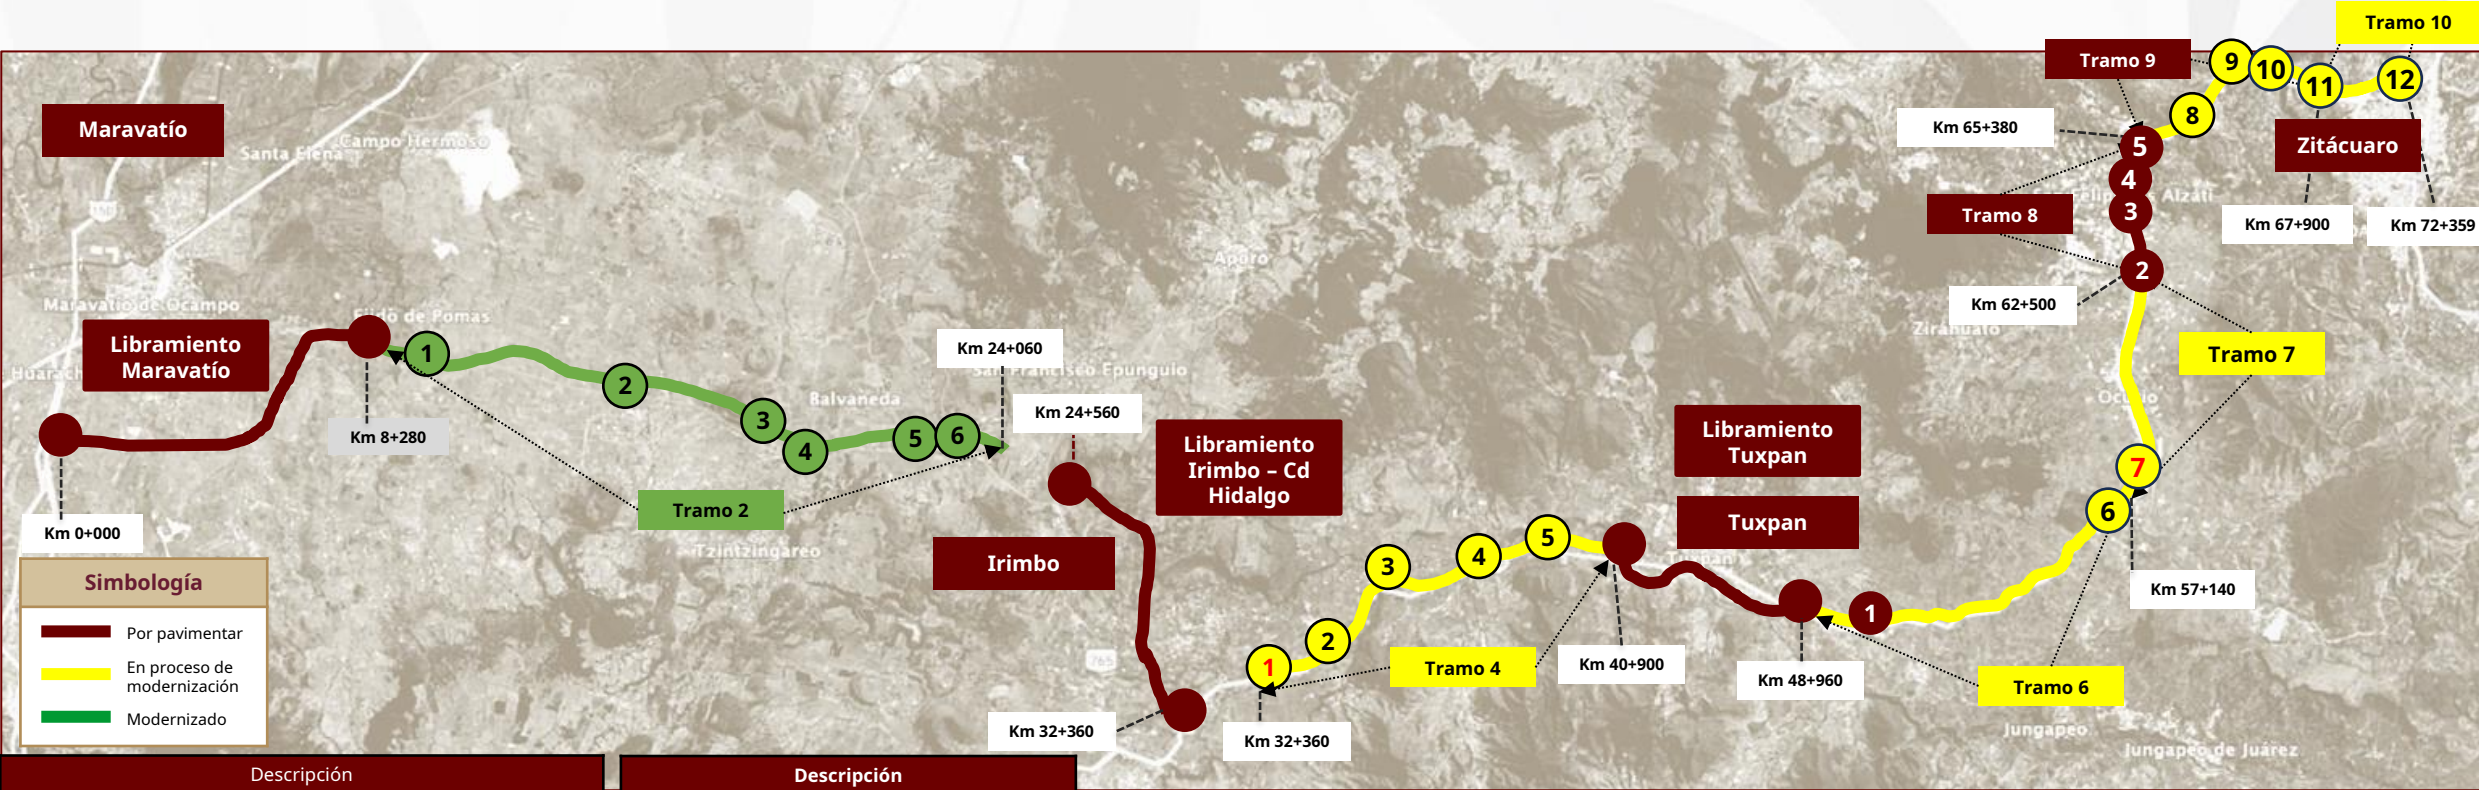


Descripción	
1	Entronque Santa Rosa km 32+420 (79.00%), Aún no inicia el tendido de carpeta asfáltica. Diseño en revisión.
2	Entronque Ziranda-Jaripeo km 32+420 (80.33%)
3	Puente Turundeo Km 36+460 (92.85%)
4	Entronque Turundeo I km 37+550 (79.36%)
5	Entronque Turundeo II km 38+780 (90.30%)
6	Entronque Jungapeo km 56+700 (63.86%)
7	Entronque Piedras de Lumbr km 57+700 (61.30%)
8	Entronque Valle Verde km 67+220 (63.25%)
9	Entronque Curungueo I Km 68+240 (63.17%)
10	Entronque Curungueo II Km 68+780 (63.17%)
11	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (43.32%)
12	P.S.V. Zitácuaro Km 72+160 (67.96%)


Descripción	
1	Puente Obispo Km 50+400
2	Entronque Zirahuato km 62+620
3	Entronque San Felipe I km 64+400
4	Entronque San Felipe II Km 64+640
5	Entronque Macutzio km 65+620


**Nota:** Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

**Avance físico:**


- Programado: 55.33%
- Real: 50.19 %
- Semanal: 0.45 %
- Financiero: 0.00%


 **Inversión:** 4,575.3 mdp  
**Inversión 2020-2025:**3,321 mdp


 **Meta:** 71.3 Km  
**Meta 2020-2025:** 41 km

 **Inicio:** septiembre 2020  
**Reinicio:** 27 de enero de 2024  
**Término:** 30 de enero de 2027

**Concesionaria:** Red de carreteras de occidente

 13,726 empleos generados  
**(4,575 Directos y 9,151 Indirectos )**

 126,000 habitantes beneficiados

 Ahorro en tiempo: 25 min

# Michoacán

## Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Terracerías						
Concepto	Meta	Ejecutado	Faltante	Del 19 sep al 25 sep 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m³)	705,558.00	693,425.38	9,651.71	2,031.69	2,480.90	
Terraplén (m³)	445,687.00	340,093.96	102,521.86	8,275.62	3,071.19	SE DEBEN INICIAR TRABAJOS EN TRAMO 8, EXISTEN INTERFERENCIAS EN EL DERECHO DE VIA.
Subyacente (m³)	256,097.00	230,075.01	24,782.83	1,049.65	1,239.16	
Subrasante (m³)	170,688.00	152,575.38	17,350.19	482.88	762.43	
Pavimentos						
Concepto	Meta	Ejecutado	Faltante	Del 19 sep al 25 sep 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m³)	125,659.04	99,674.97	25,984.07	603.69	1,514.18	
Bacheo (m³)	1,800.00	1,255.00	545.00	0.00	15.00	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Fresado (m³)	10,676.00	9,916.27	759.73	0.00	49.30	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	23.91	6.33	0.00	0.45	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Geomalla (m²)	84,520.00	62,832.60	21,687.40	0.00	1,696.00	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Base Asfáltica (m³)	120,414.05	99,701.70	20,712.35	0.00	1,202.07	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Carpeta Asfáltica (m³)	45,247.80	12,900.11	32,347.69	0.00	50.95	CONTINÚA LA REVISIÓN DEL DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA.
Estructuras						
Concepto	Meta	Ejecutado	Faltante	Del 19 sep al 25 sep 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PUENTE TURUNDEO	1.00	1.44	0.00	0.00	0.05	COLADO DE REMATES DE GUARNICIÓN Y PARAPETO, RELLENO DE CEPAS DE APOYOS.
PIV JUNGAPEO	1.00	0.95	0.05	0.00	0.11	CONTINÚA EL CORTE DE TN EN GAZAS
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.29	0.71	0.00	0.01	ARMADO Y COLADO DE ESTRIBOS EN APOYOS A1 Y A2.
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.78	0.22	0.00	0.01	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE ACCESO, ARMADO DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO

