


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

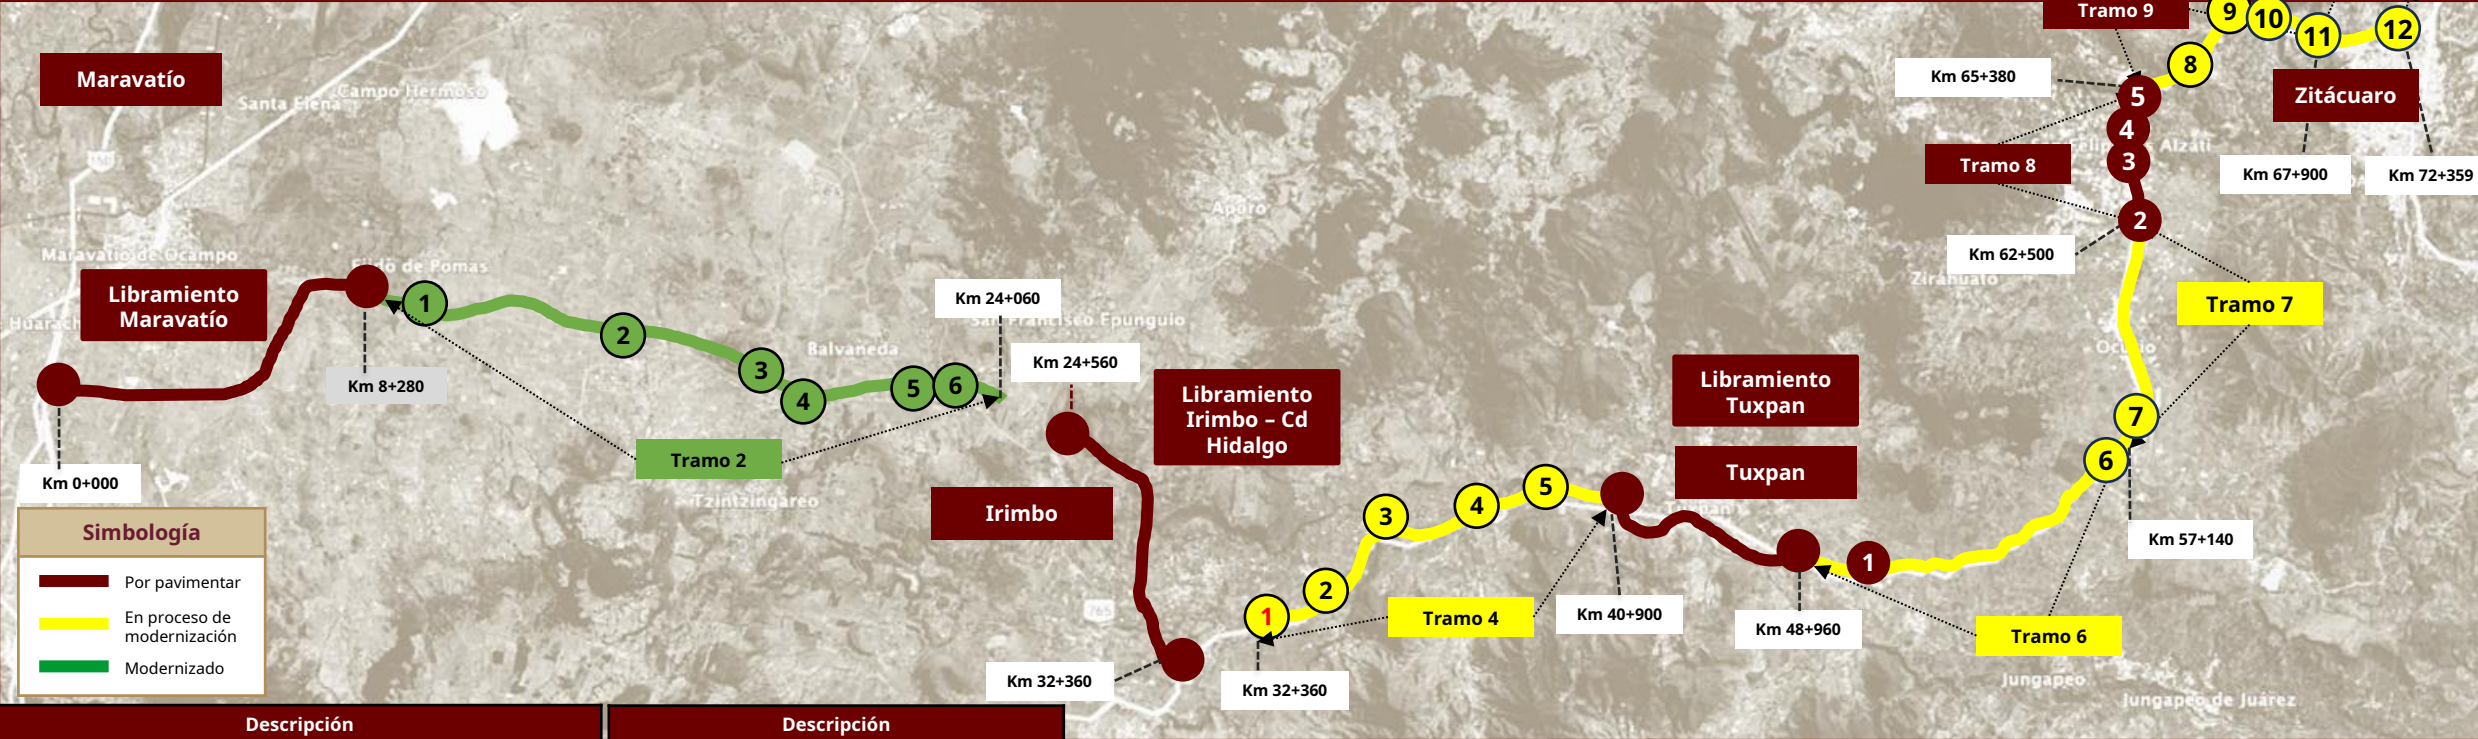


Descripción	
1	Entronque Santa Rosa km 32+420 (79.00%), Aún no inicia el tendido de carpeta asfáltica. Diseño en revisión.
2	Entronque Ziranda-Jaripeo km 32+420 (79.18%)
3	Puente Turundeo Km 36+460 (91.35%)
4	Entronque Turundeo I km 37+550 (77.92%)
5	Entronque Turundeo II km 38+780 (89.01%)
6	Entronque Jungapeo km 56+700 (63.75%)
7	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (60.54%)
8	Entronque Valle Verde km 67+220 (59.73%)
9	Entronque Curungueo I Km 68+240 (55.67%)
10	Entronque Curungueo II Km 68+780 (55.67%)
11	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (40.00%)
12	PSV Zitácuaro Km 72+160 (61.23%)


Descripción	
1	Puente Obispo Km 50+400
2	Entronque Zirahuato km 62+620
3	Entronque San Felipe I km 64+400
4	Entronque San Felipe II Km 64+640
5	Entronque Macutzio km 65+620


Nota:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.


Avance físico


- Programado: 54.85%
- Real: 49.08 %
- Semanal: 0.66 %
- Financiero: 0.00%


**Inversión:** 4,575.3 mdp
Inversión 2020-2025:3,321 mdp

**Meta:** 71.3 Km
Meta 2020-2025: 41 km

**Inicio:** septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 30 de enero de 2027

**4,800 empleos generados**

**126,000 habitantes beneficiados**

**Ahorro en tiempo: 25 min**

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán


Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 05 sep al 11 sep 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	689,169.99	16,388.01	2,031.69	4,491.66	
Terraplén (m3)	445,687.00	335,338.63	110,348.37	8,275.62	7,602.73	SE DEBEN INICIAR TRABAJOS EN TRAMO 8, EXISTEN INTERFERENCIAS EN EL DERECHO DE VIA.
Subyacente (m3)	256,097.00	228,703.72	27,393.28	1,049.65	1,951.88	
Subrasante (m3)	170,688.00	151,279.02	19,408.98	482.88	1,296.32	

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 05 sep al 11 sep 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	95,868.27	29,790.77	603.69	2,330.95	
Bacheo (m3)	1,800.00	1,196.50	603.50	0.00	41.50	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Fresado (m3)	10,676.00	9,805.06	870.94	0.00	59.81	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	22.63	7.61	0.00	0.98	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Geomalla (m2)	84,520.00	60,236.60	24,283.40	0.00	942.00	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	97,046.26	23,367.79	0.00	971.49	SE TIENEN TRABAJOS ADELANTADOS EN TRAMOS 9 Y 10

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 05 sep al 11 sep 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PIV JUNGAPEO	1.00	0.94	0.06	0.00	0.01	CONTINÚA EL CORTE DE TN EN GAZAS
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.26	0.74	0.00	0.03	ARMADO Y COLADO DE ESTRIBOS EN APOYOS A1 Y A2.
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.74	0.26	0.00	0.01	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE ACCESO, ARMADO DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO

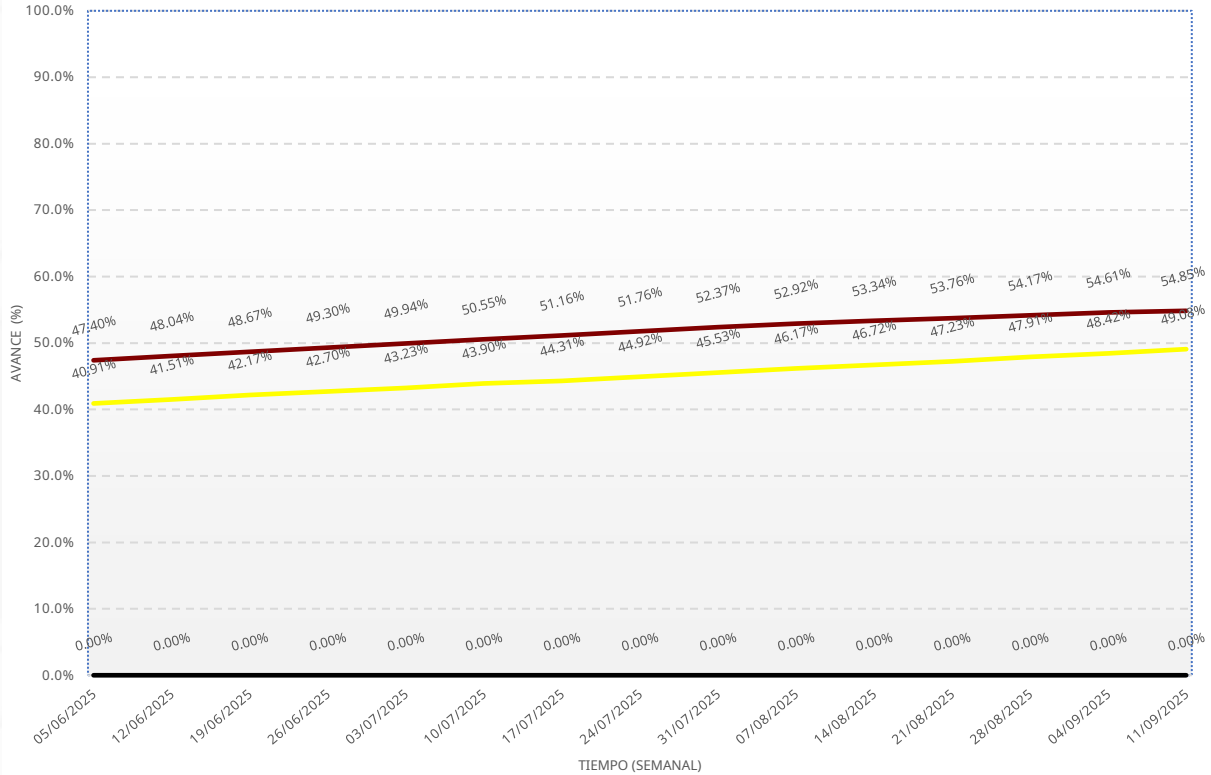

Avance Programado Avance Físico *Avance Financiero

* No presenta avance financiero

	DEL 29 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE 25	DEL 05 AL 11 SEPTIEMBRE 25
Fuerza de Trabajo (personas)	279	277
Maquinaria	177	180
