

Colima

Tramo Armería-Manzanillo




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 94.85%
- Real: 35.96%
- Semanal: 0.43 %
- Financiero: 20.79%

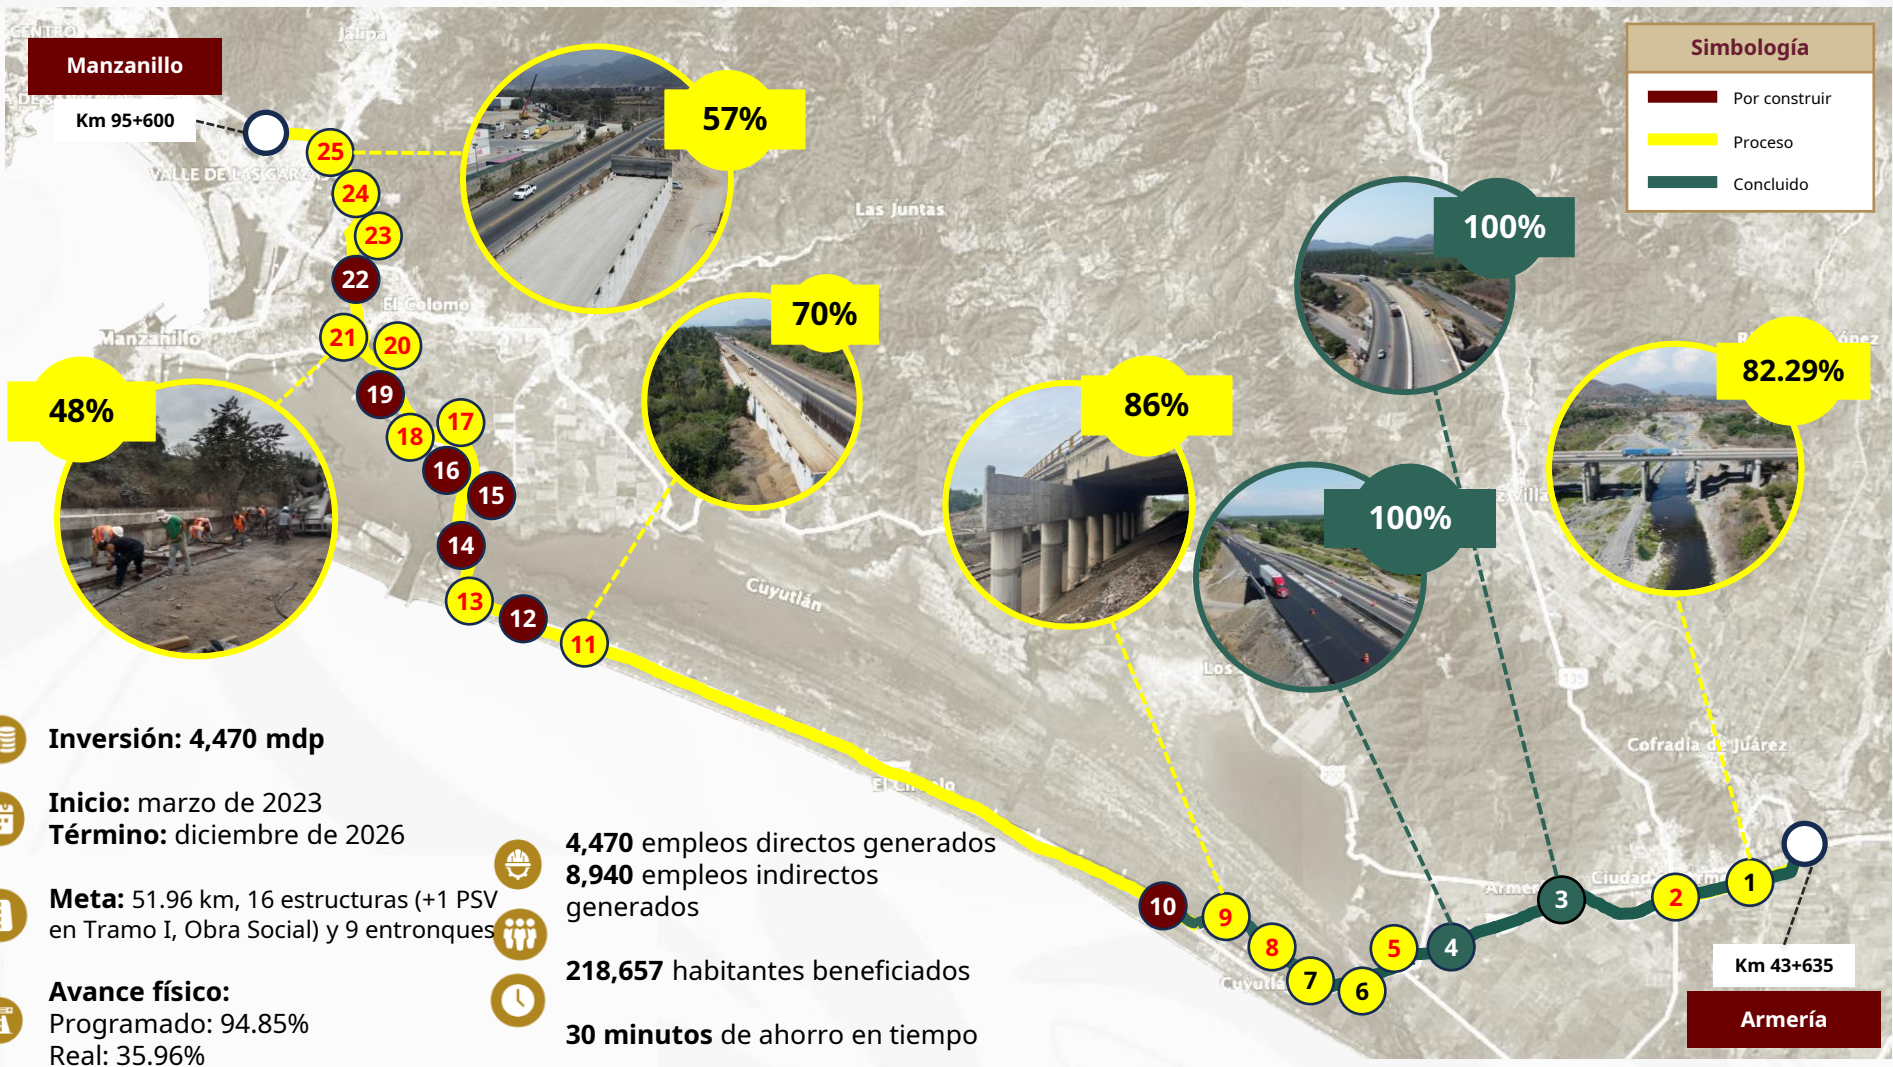

Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (82.29%)
2	Entronque Paraíso km 47+741 (78%) No esta programado avance.
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (100%)
4	PSV Tilapia km 54+350 (100%)
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (42%) Se inició habilitado de acero
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (25%)
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (65%)
8	Entronque Salineros km 59+551 (5%) Falta regularizar programa
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (86%) El trabajo programado para esta semana, está concluido
10	Entronque Cuyutlán km 60+880
11	PIV Retorno en U km 77+600 (70.66%) No se tuvieron trabajos programados
12	Entronque Retorno en U km 77+600
13	PSFFCC Tepalcates I km 79+900 (52%) Sin actividades programadas
14	Entronque Tepalcates I km 80+100
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+323
16	Entronque Tepalcates II km 83+500
17	Puente Adjuntas km 85+950 (67%) El trabajo programado para esta semana, está concluido
18	PSV Panteones km 87+300 (21%) Falta de Fuerza de Trabajo
19	Entronque Panteones km 87+630
20	PIV Minatitlán Lib. km 92+000 (4%) Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.
21	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 (48%) Trabajo programado para esta semana concluido
22	Entronque Minatitlán km 92+731
23	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (16%) No hay trabajos por logística de programación
24	Entronque Jalipa km 94+100 (9%) Hay que cambiar el transito al cuerpo izquierdo del paso del puente
25	Puente Jalipa km 94+158 (57%) El trabajo programado para esta semana, está concluido


Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado	Faltante	05/12/25 al 11/12/25		Observaciones
		acumulado		Programa do	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	272,485	0	0	2,620	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	526,387	287,522	0	8,686	
Base y sub base (m³)	260,119	166,572	93,547	0	657	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

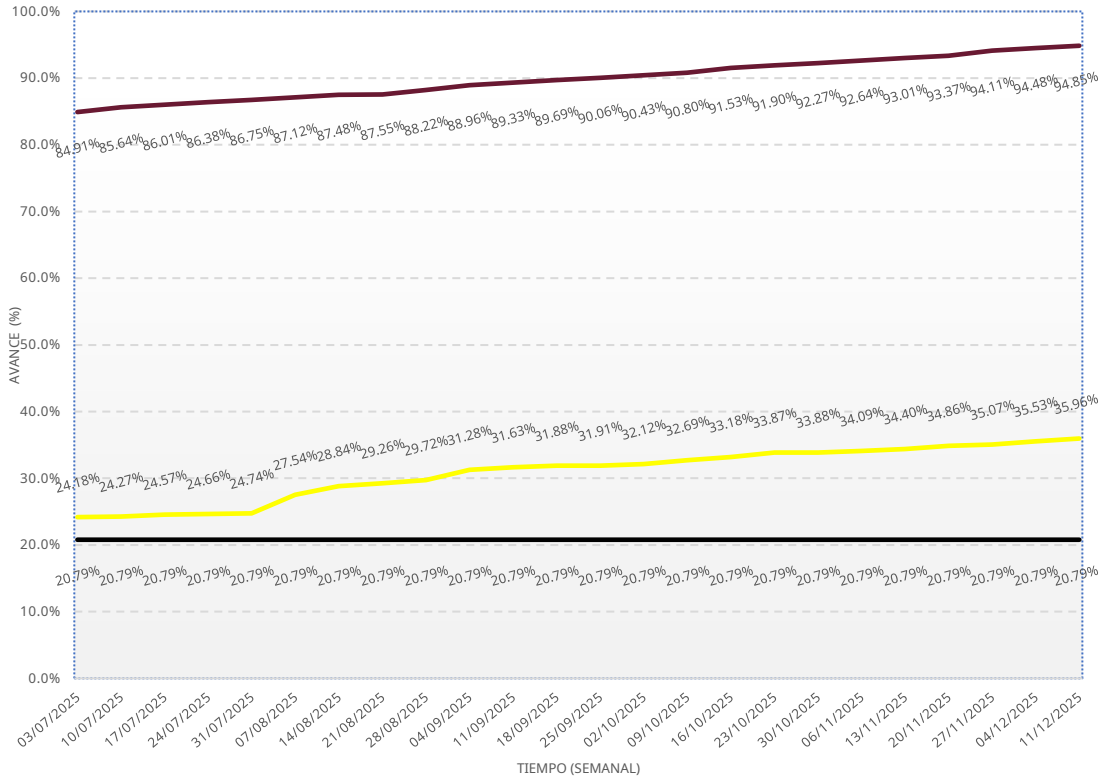

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	28 de noviembre al 04 de diciembre	05 de diciembre al 11 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	168	141
Maquinaria	70	57
Frentes de trabajo	Pavimentación Jalipa tramo 6 de 90+000 a 95+000; tramo 1 de 44+000 a 54+000	Pavimentación Jalipa tramo 6 de 90+000 a 95+000; tramo 1 de 44+000 a 54+000

