


Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Avance físico

- Programado: 95.21%
- Semanal: 0.63 %
- Real: 36.59%
- Financiero: 20.79%

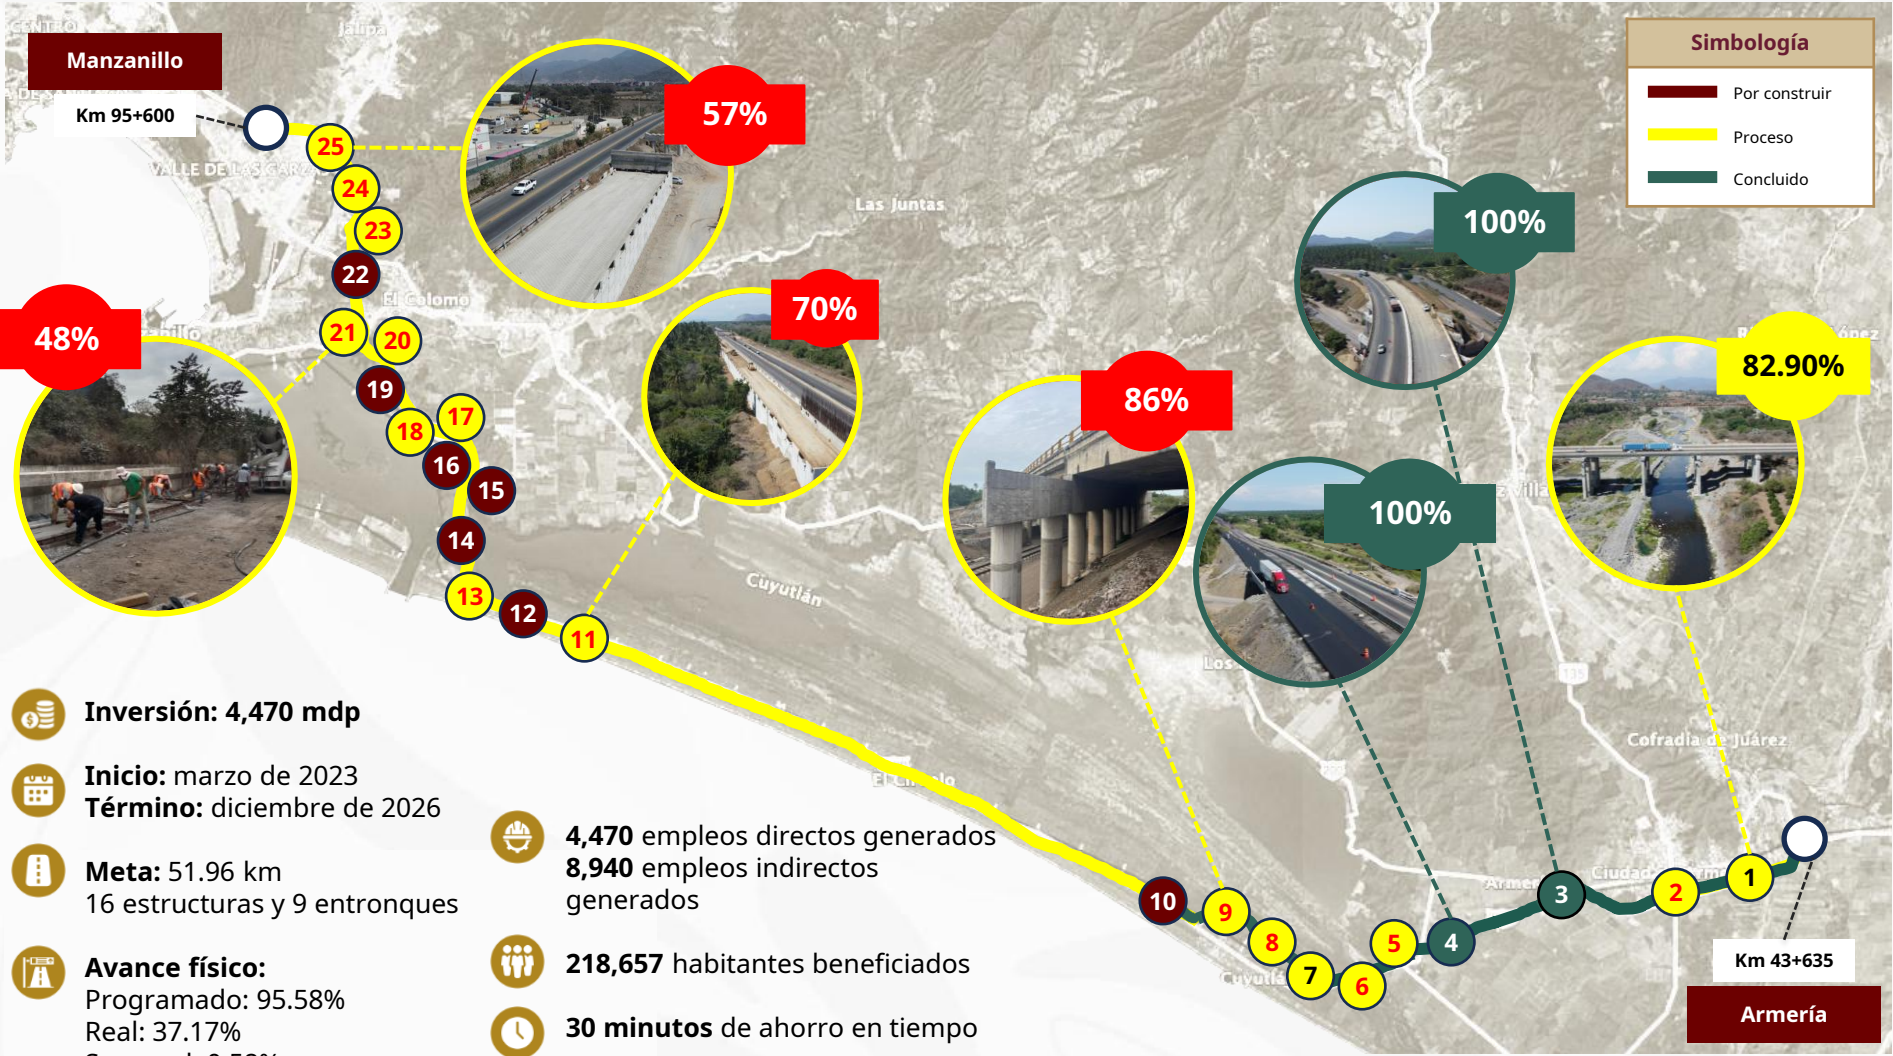

Inversión: 4,470 mdp

Inicio: marzo de 2023
Término: diciembre de 2026

Meta: 51.96 km
16 estructuras y 9 entronques

Avance físico:
Programado: 95.58%
Real: 37.17%
Semanal: 0.58%
Financiero: 20.79%

4,470 empleos directos generados
8,940 empleos indirectos generados

218,657 habitantes beneficiados

30 minutos de ahorro en tiempo

Concesionaria: PINFRA

Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (82.90%)
2	Entronque Paraíso km 47+741 (78%) No esta programado avance.
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (100%)
4	PSV Tilapia km 54+350 (100%)
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (42%) Se descabezaron pilas para armado de cabezales.
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (25.25%) En proceso de planeación para montajes.
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (83%)
8	Entronque Salineros km 59+551 (5%) Falta regularizar programa
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (86%) El trabajo programado para esta semana, está concluido
10	Entronque Cuyutlán km 60+880
11	PIV Retorno en U km 77+600 (70.66%) No se tuvieron trabajos programados
12	Entronque Retorno en U km 77+600
13	PSFFCC Tepalcates I km 79+900 (52%) Sin actividades programadas
14	Entronque Tepalcates I km 80+100
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+323
16	Entronque Tepalcates II km 83+500
17	Puente Adjuntas km 85+950 (67%) El trabajo programado para esta semana, está concluido
18	PSV Panteones km 87+300 (21%) Falta de Fuerza de Trabajo
19	Entronque Panteones km 87+630
20	PIV Minatitlán Lib. km 92+000 (4%) Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.
21	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 (48%) Trabajo programado para esta semana concluido
22	Entronque Minatitlán km 92+731
23	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (16%) No hay trabajos por logística de perforación.
24	Entronque Jalipa km 94+100 (9%) Hay que cambiar el transito al cuerpo izquierdo del paso del puente
25	Puente Jalipa km 94+158 (57%) El trabajo programado para esta semana, está concluido


NOTA: Se trabaja para actualizar el estatus financiero en la siguiente ficha

Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	19/12/25 al 25/12/25		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	275,567	0	0	0	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	539,642	274,267	0	2,679	
Base y sub base (m³)	260,119	167,922	92,197	0	3,574	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

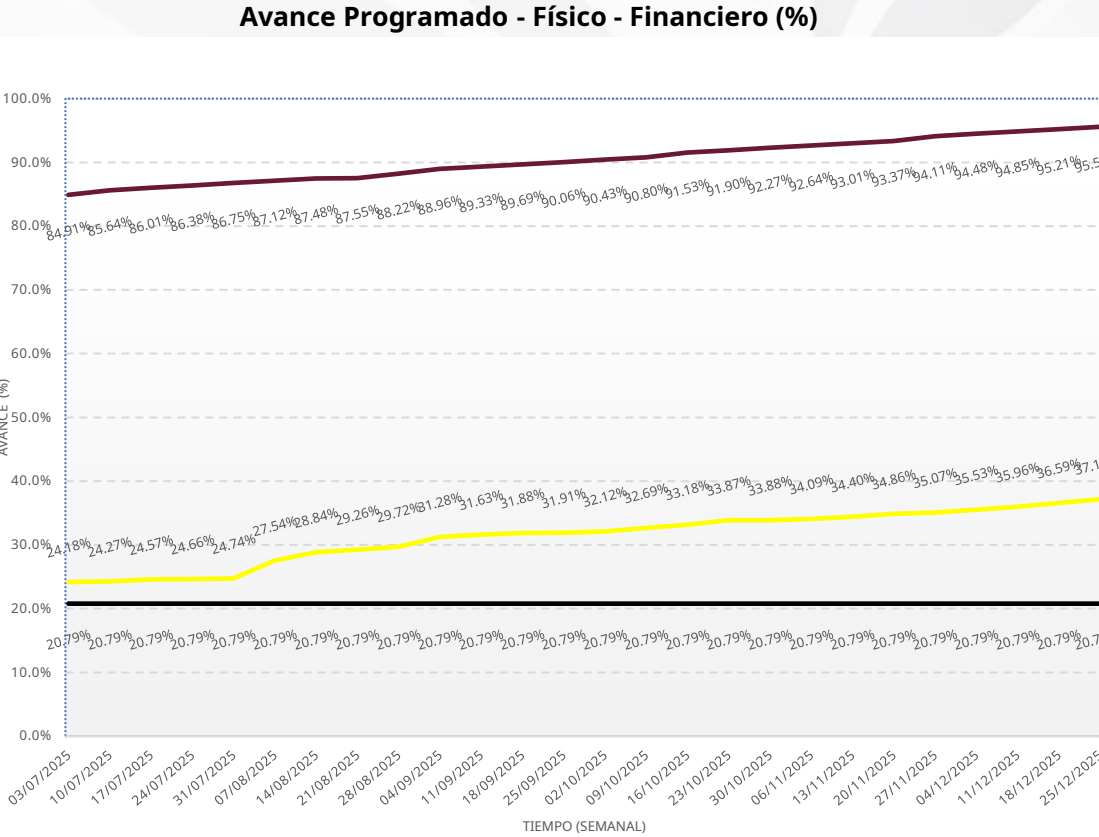

	12 de diciembre al 18 de diciembre	19 de diciembre al 25 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	157	132
Maquinaria	71	59
Frentes de trabajo	Pavimentación Jalipa tramo 6 de 90+000 a 95+000; tramo 1 de 44+000 a 54+000	Tramo 1:Armería I Tramo 2: Minatitlan, Palo Verde II, Salinero II, Minatitlan I, Salinero I, Adjuntas, Panteones, Minatitlan II, Canal
