

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia


Avance físico


• Programado: 11.50 %


• Real: 11.10 %

• Semanal: 0.96 %


• Financiero: 0%

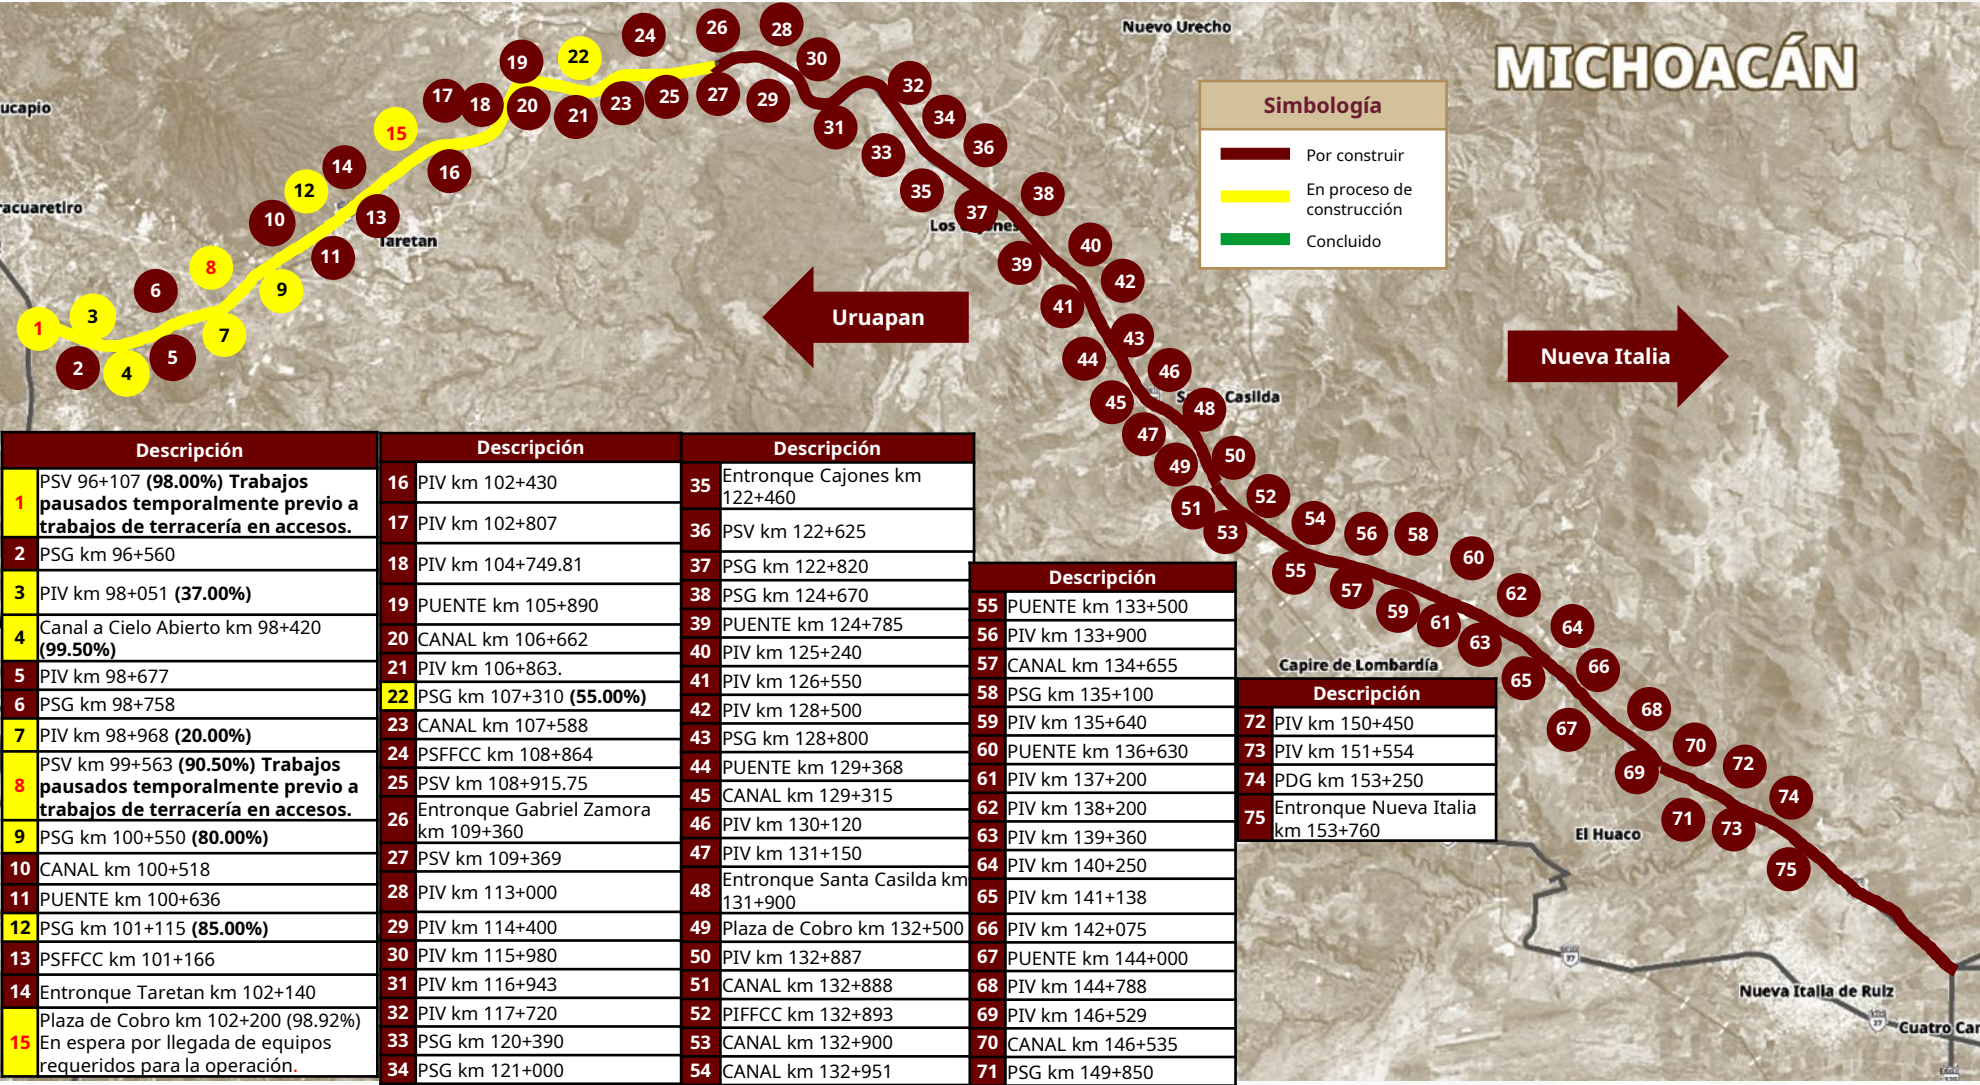

- 

Inversión: 7,049 mdp
- 

Inicio: noviembre de 2023

Término: agosto de 2027
- 


Meta: 67.09 km

65 km (tronal)

2.09 km (estructuras)


2 plazas de cobro, 10 puente,

5 entronques, 65 cruces y


múltiples obras de drenaje.
- 

21,147 empleos generados

7,049 Directos

14,098 Indirectos
- 

1,800,000 habitantes

beneficiados
- 

25 minutos de ahorro


en tiempo
- Concesionaría : PINFRA.

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	06/11/2025 al 13/11/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Asfáltica	65 km	5.60 km	59.40 km	.800 km	.800 km	
Base Hidráulica	65 km	7.40 km	57.60 km	.200 km	.200 km	
Subbase	65 km	8.30 km	56.70 km	.200 km	.200 km	
Subyacente	65 km	10.40 km	54.60 km	.200 km	.200 km	
Km 98+051 PIV Cimentación	3	1	2	1	1	Cimentación profunda para pilotes un apoyo central.
Km 98+968 PIV Cimentación	3	0	3	1	1	Trazo y nivelación previo a trabajos de cimentación profunda
Km 100+500 PSG Losa	1	0	1	1	1	Colado de concreto hidráulico en losa
Km 101+115 PSG Losa	1	0	1	1	1	Colado de concreto hidráulico en losa

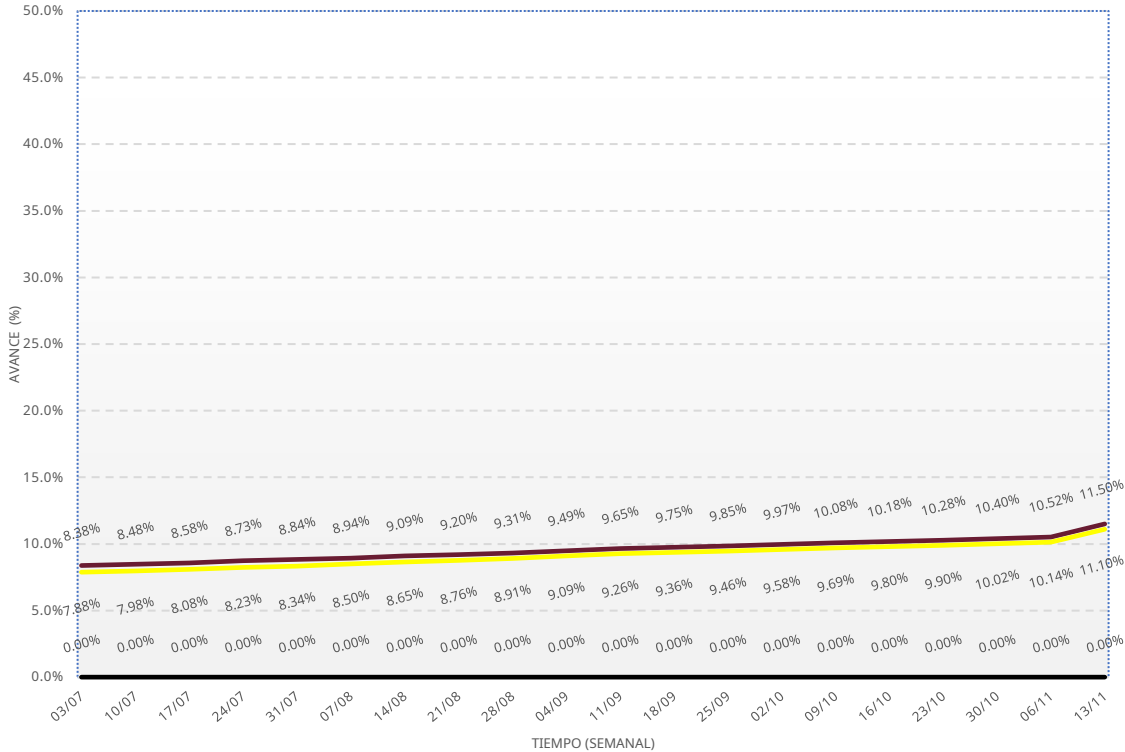

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 30 de octubre al 06 de noviembre.	Del 06 de noviembre al 13 de noviembre.
Fuerza de Trabajo (personas)	780	780
Maquinaria	245	245



2025
Año de
La Mujer
Indígena
