

Nayarit


Tramo Tepic-Compostela

Nota:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

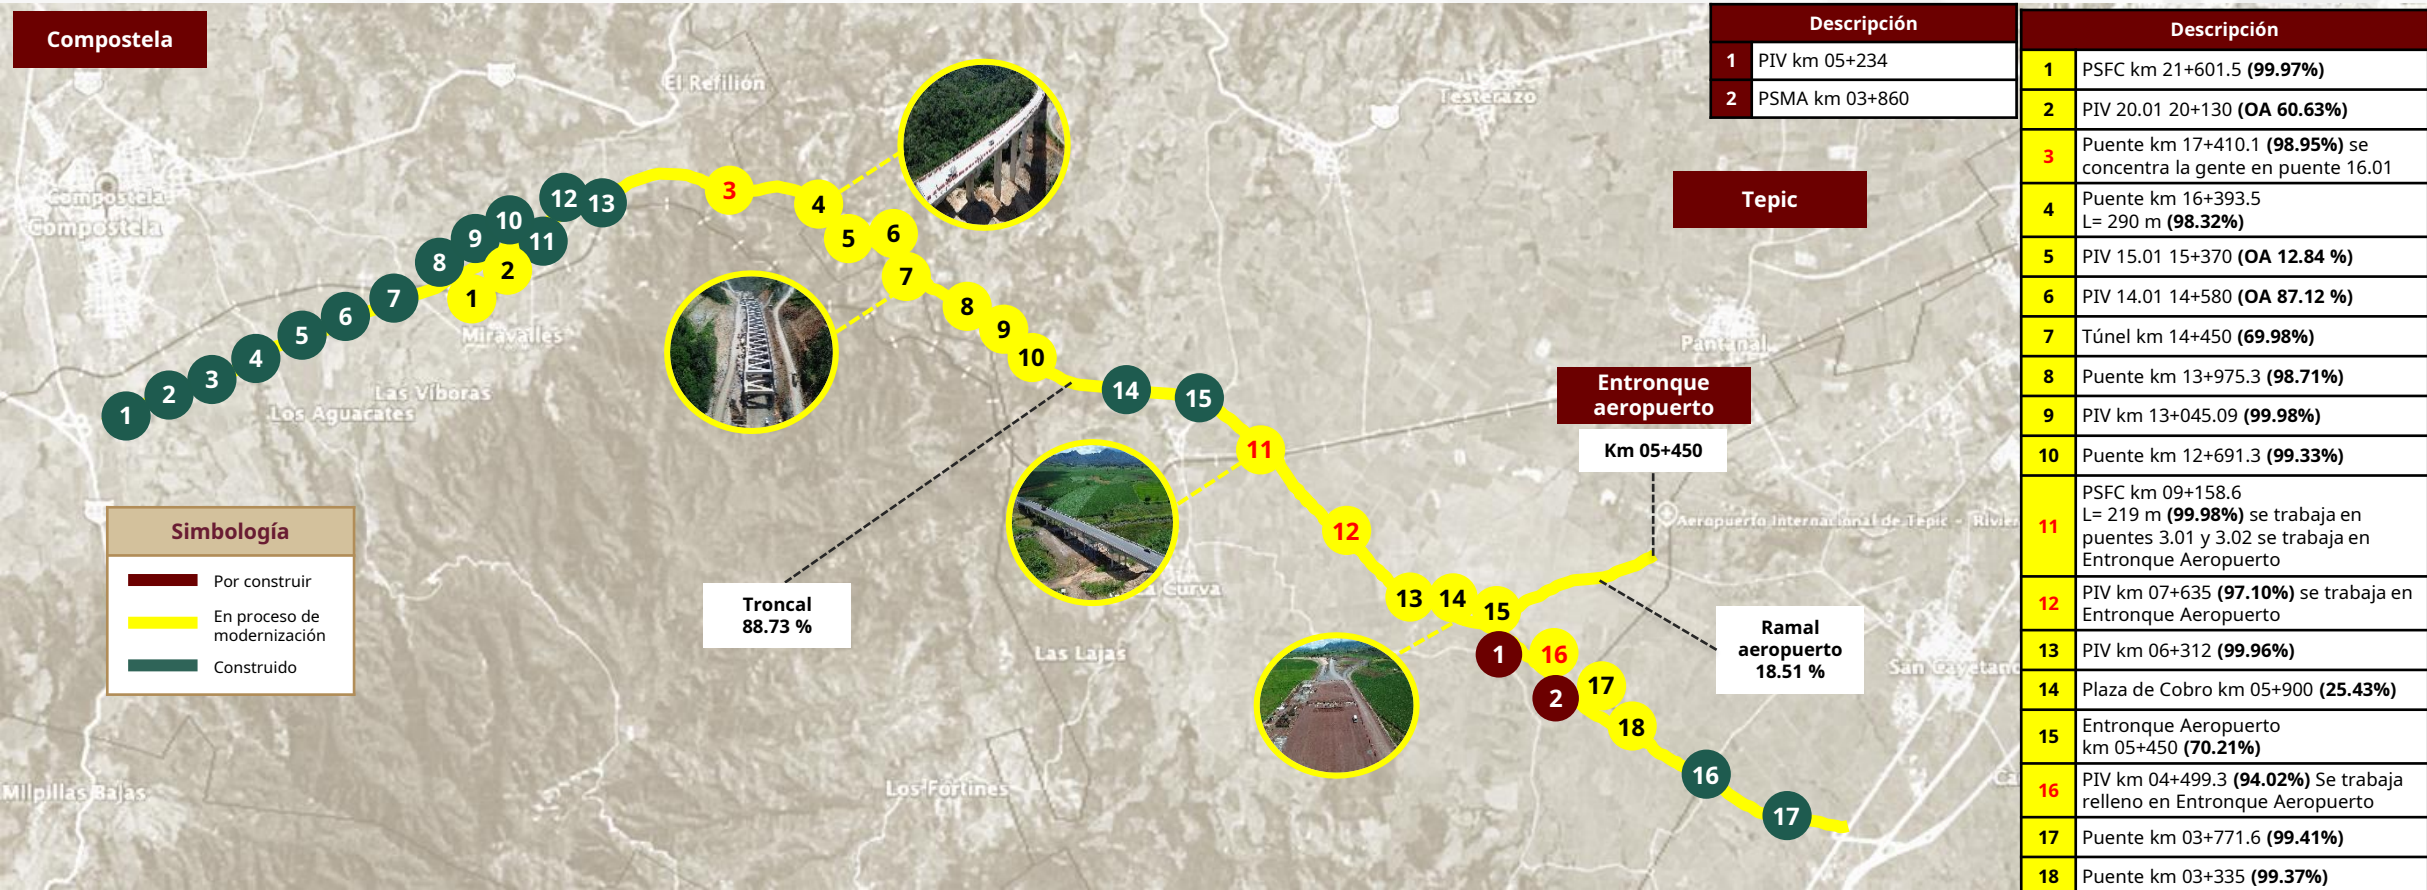

2025
Año de
La Mujer Indígena

Avance físico

- Programado: 100 %
- Real: 97.53 %
- Financiero: 88.28 %
- Semanal: 0.29 %

Concesionaria: FONADIN

Inversión: 2,473.43 mdp

- Meta:** 28 km
- 1 Plaza de cobro,
 - 10 Puentes,
 - 2 PSFC,
 - 1 Entronque (solo gazas)
 - 19 Cruces
 - Ramal Aeropuerto

Inicio: Marzo 2023
Término: 31-Oct-2025


- 5,500** empleos generados
- 490 mil** habitantes beneficiados
- 35 minutos** de ahorro en tiempo

Nayarit

Tramo Tepic-Compostela

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	05/09/25 al 11/09/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m3)	1,982,866.26	1,984,689.62	-1,823.36	7,500.00	9,800.00	
Puente 16.01 km 16+393.50						
Cortes (m³) Estabilización de taludes	2,443,497.56	2,406,372.63	37,124.93	3,000.00	3,400.00	
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50						
Junta de dilatación (pza)	2	1.45	0.55	0	0.1	Se movió personal para apoyo en las estructuras principales. En revisión fuerza de trabajo necesaria.

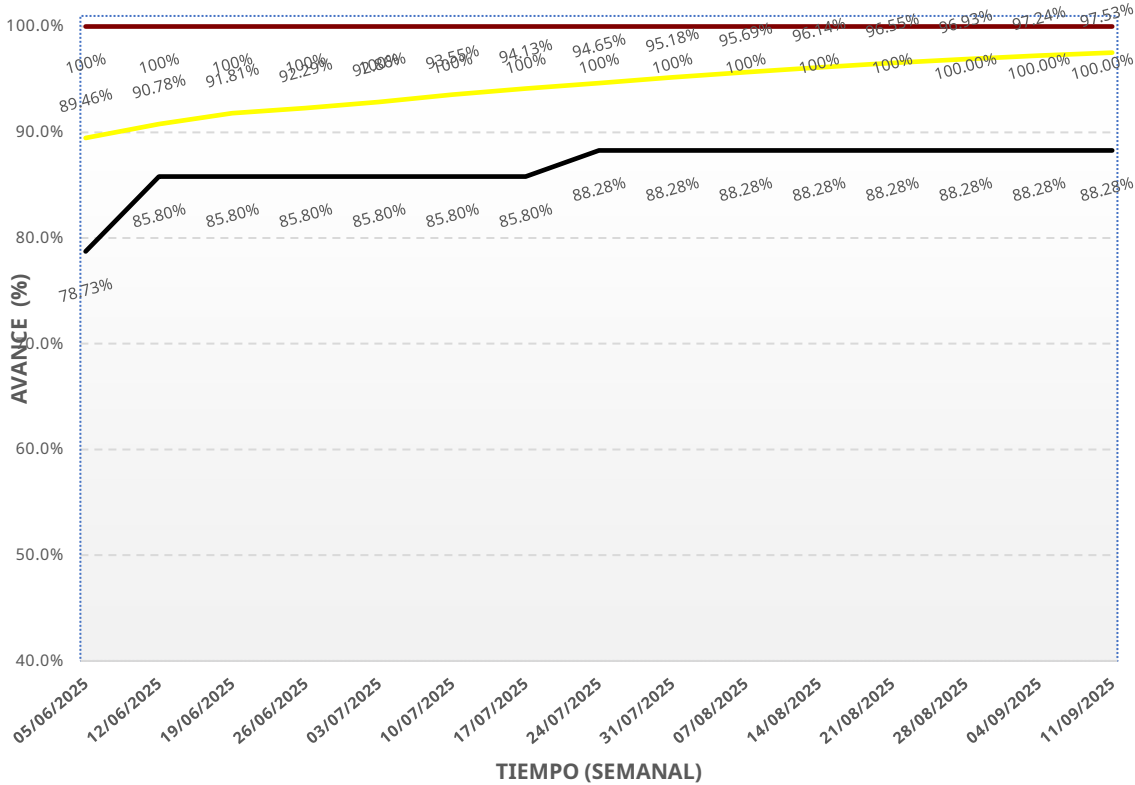

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	29 de agosto al 04 de septiembre	05 de septiembre al 11 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	450	450
Maquinaria	71	71
