

Estado de México

Atizapán - Atlacomulco



Inversión: 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)

Meta: 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 79 PSVyG

Inicio: 01 marzo 2016
Término: 30 junio 2027

Avance físico:

- Programado: 87.00%
- Real: 46.36%
- Financiero: 24.11%
- Semanal: 00.20%

132,909 empleos generados (44,303 directos y 88,606 indirectos)


1 millón 244 mil habitantes beneficiados

60 minutos de ahorro en tiempo

Estado de México

Atizapán - Atlacomulco

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

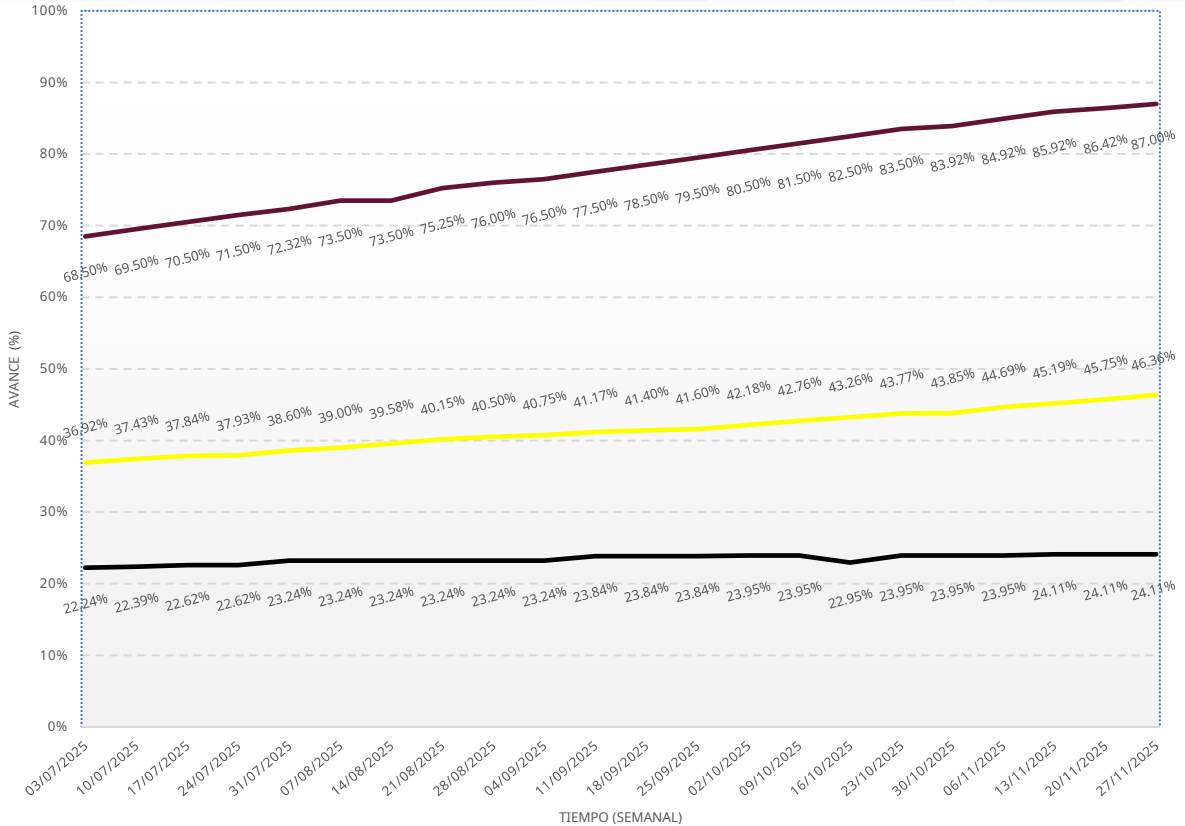

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 14 de noviembre al 20 noviembre	21 de noviembre al 27 noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	1,902	1,921
Maquinaria	501	497

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	21/11/25 al 27/11/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	188	156	2	1.53	• La mano de obra se incrementó para alcanzar las expectativas correspondientes.
Zapatas	86	42	44	1	0.94	
Columnas	96	21	75	1	1.00	
Cabezales	76	9	67	1	0.77	
Caballetes	24	6	18	1	0.51	
Trabes de concreto	395	0	395	0	0	
Trabes metálicas	29	0	29	1.0	1.00	



2025
Año de
La Mujer
Indígena
