


# Nayarit

## Tramo Tepic - Compostela

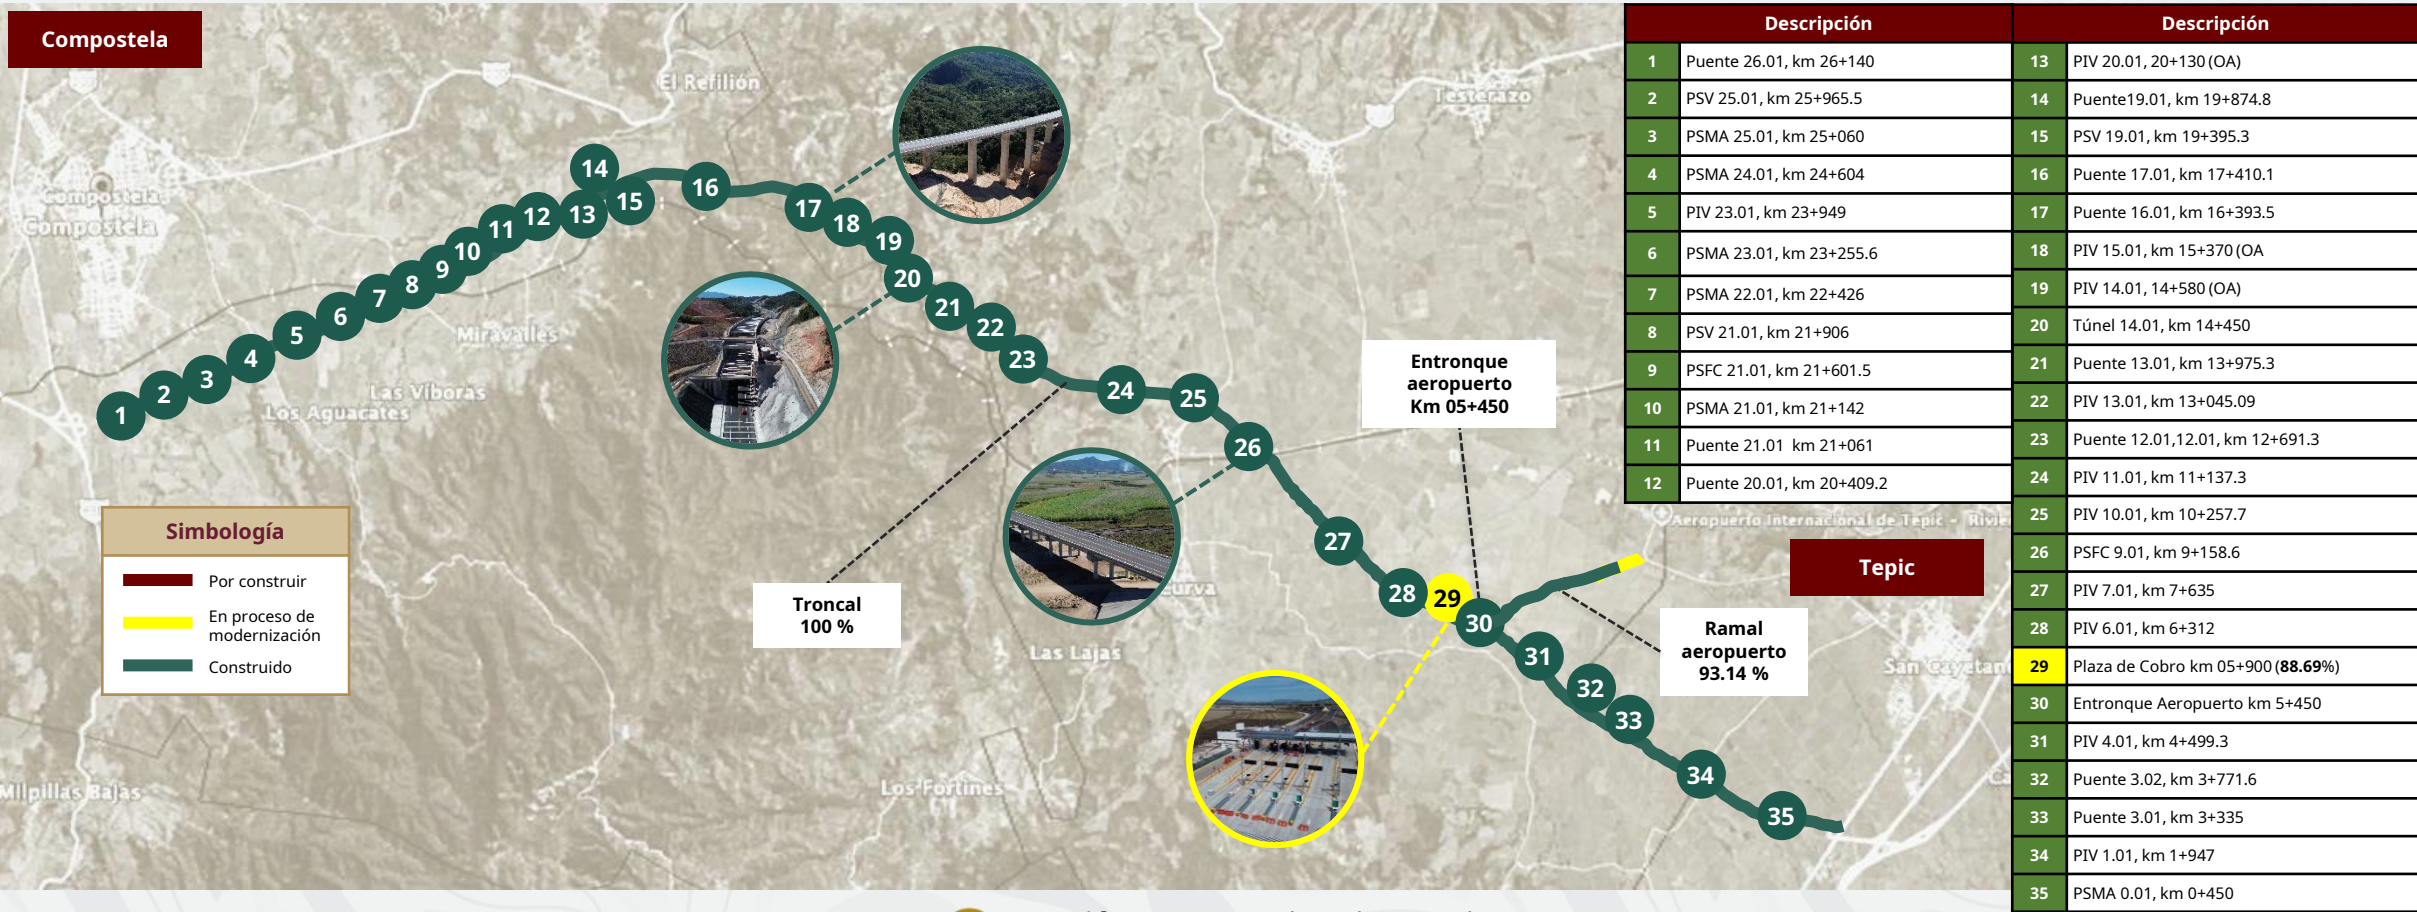

Concesionaria: FONADIN

### Avance físico

- Programado: 100 %
- Real: 99.995 %
- Financiero: 96.70 %
- Semanal: 0.001 %

**Inversión:** 2,473.43 mdp (solo troncal y estructuras, no considera Ramal Aeropuerto\*)

**Meta:** 30.17 km. (26 km en troncal y 4.17 en estructuras)  
1 Túnel Falso, 1 Plaza de cobro, 10 Puentes, 2 PSFC, 1 Entronque (solo gases) y 1 Entronque completo (Aeropuerto) y 21 Cruces (no considera Ramal Aeropuerto\*) y múltiples obras de drenaje.

\* Una vez que se cuente con el monto del Ramal Aeropuerto se actualizará la Inversión y Meta.

**Inicio:** Marzo 2023  
**Término:** 15 Sep 2025

**2,473** empleos directos generados P/MDI  
**4,946** empleos indirectos generados P/MDI

**490 mil** habitantes beneficiados

**35 minutos** de ahorro en tiempo


# Nayarit

## Tramo Tepic - Compostela

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	06/02/26 al 12/02/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m3)	2,095,966.26	2,095,954.62	11.64			
Subyacente (m²)	290,689.00	281,764.49	8,924.51	1,050.00	1,078.00	
Puente 16.01 km 16+393.50						
Columnas	8	8	0			Trabajos concluidos.
Cortes (m³) Estabilización de taludes	2,443,497.56	2,423,372.63	20,124.93			
Obras de drenaje	77	77	0			Trabajos concluidos.
P.S.F.C. 9.01 km 09+158.50						
Losa (claro)	7	7	0			Trabajos concluidos.
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50						
Junta de dilatación (pza)	2	2	0			

**Descripción de la obra**  
**Tepic - Compostela**  
Construcción de la Autopista Tepic – Compostela, con una longitud de 26 km, carretera tipo A2 con una velocidad de proyecto de 110 km/hr, con una superficie de rodamiento de concreto asfáltico y un TDPA de 6,400 vehículos, incluye la construcción de 1 Túnel Falso, 1 Plaza de cobro, 10 Puentes, 2 PSFC, 2 Entronques y 21 Cruces

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

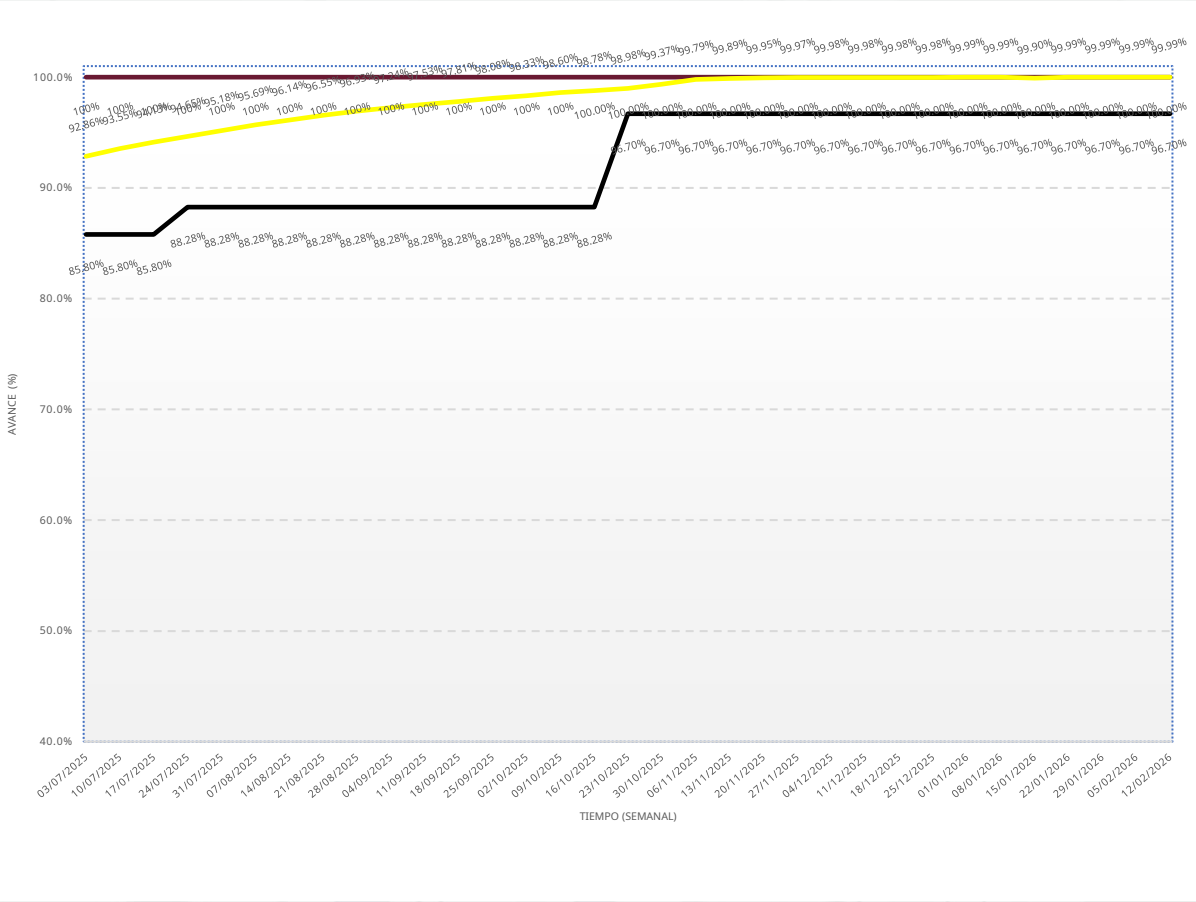

Avance Programado      Avance Físico      Avance Financiero

	30 de enero al 05 de febrero	06 de febrero al 12 de febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	250	250
Maquinaria	50	50
Frente de Trabajo	Ramal Aeropuerto, Plaza de Cobro km 05+900	Ramal Aeropuerto, Plaza de Cobro km 05+900
