

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Inversión: 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)

Meta: 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 79 PSVyG

Inicio: 01 marzo 2016
Término: 30 junio 2027

Avance físico:

- Programado: 79.50%
- Real: 41.60%
- Financiero: 23.84%
- Semanal: 00.20%

29,598 empleos generados
(9,866 empleos directos y 9,732 empleos indirectos)

1 millón 244 mil habitantes beneficiados

60 minutos de ahorro en tiempo


Nota: Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	19/09/25 al 25/09/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	184	160	2	0.74	• Se está incrementando la mano de obra para cumplir las metas prometidas.
Zapatas	86	39	47	1	0.59	
Columnas	96	18	78	1	0.37	
Cabezales	76	6	70	1	0.39	
Caballetes	24	4	20	1	0.36	
Trabes de concreto	395	0	395	0	0	
Trabes metálicas	29	0	29	0.8	0.75	

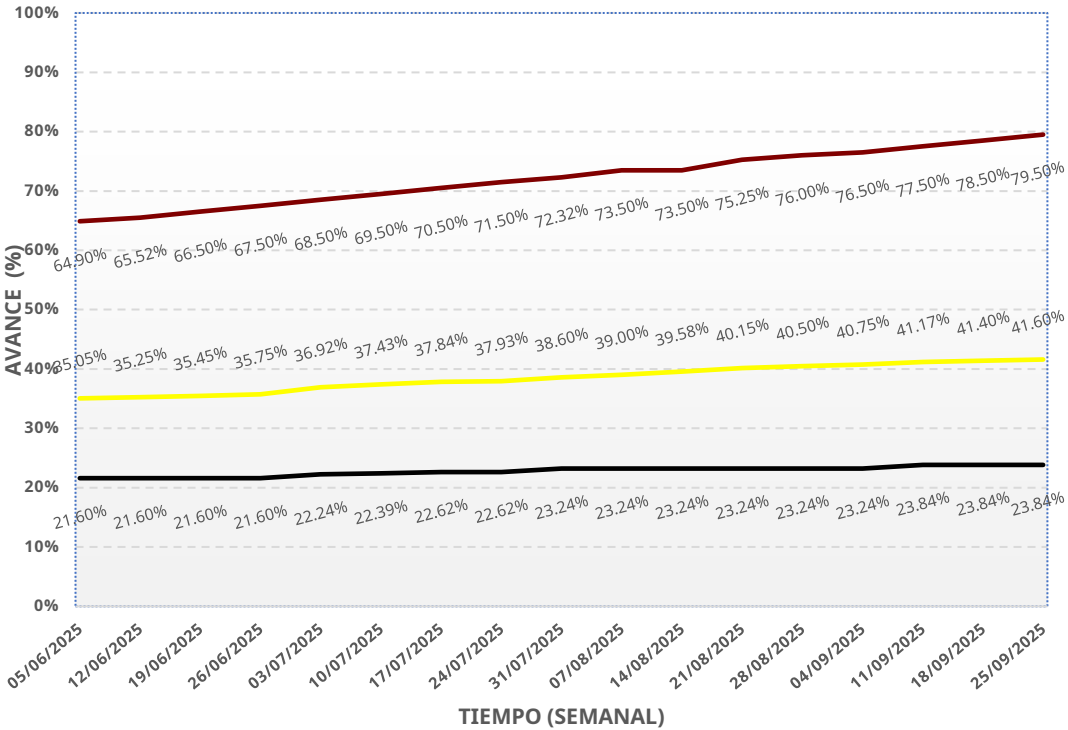

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 12 de septiembre al 18 de septiembre	19 de septiembre al 25 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	1,837	1,854
Maquinaria	483	487



2025
Año de
La Mujer
Indígena
