

Colima

Tramo Armería-Manzanillo


Avance físico

• Programado: 88.22%

• Semanal: 0.42 %

• Real: 29.72%

• Financiero: 20.79%

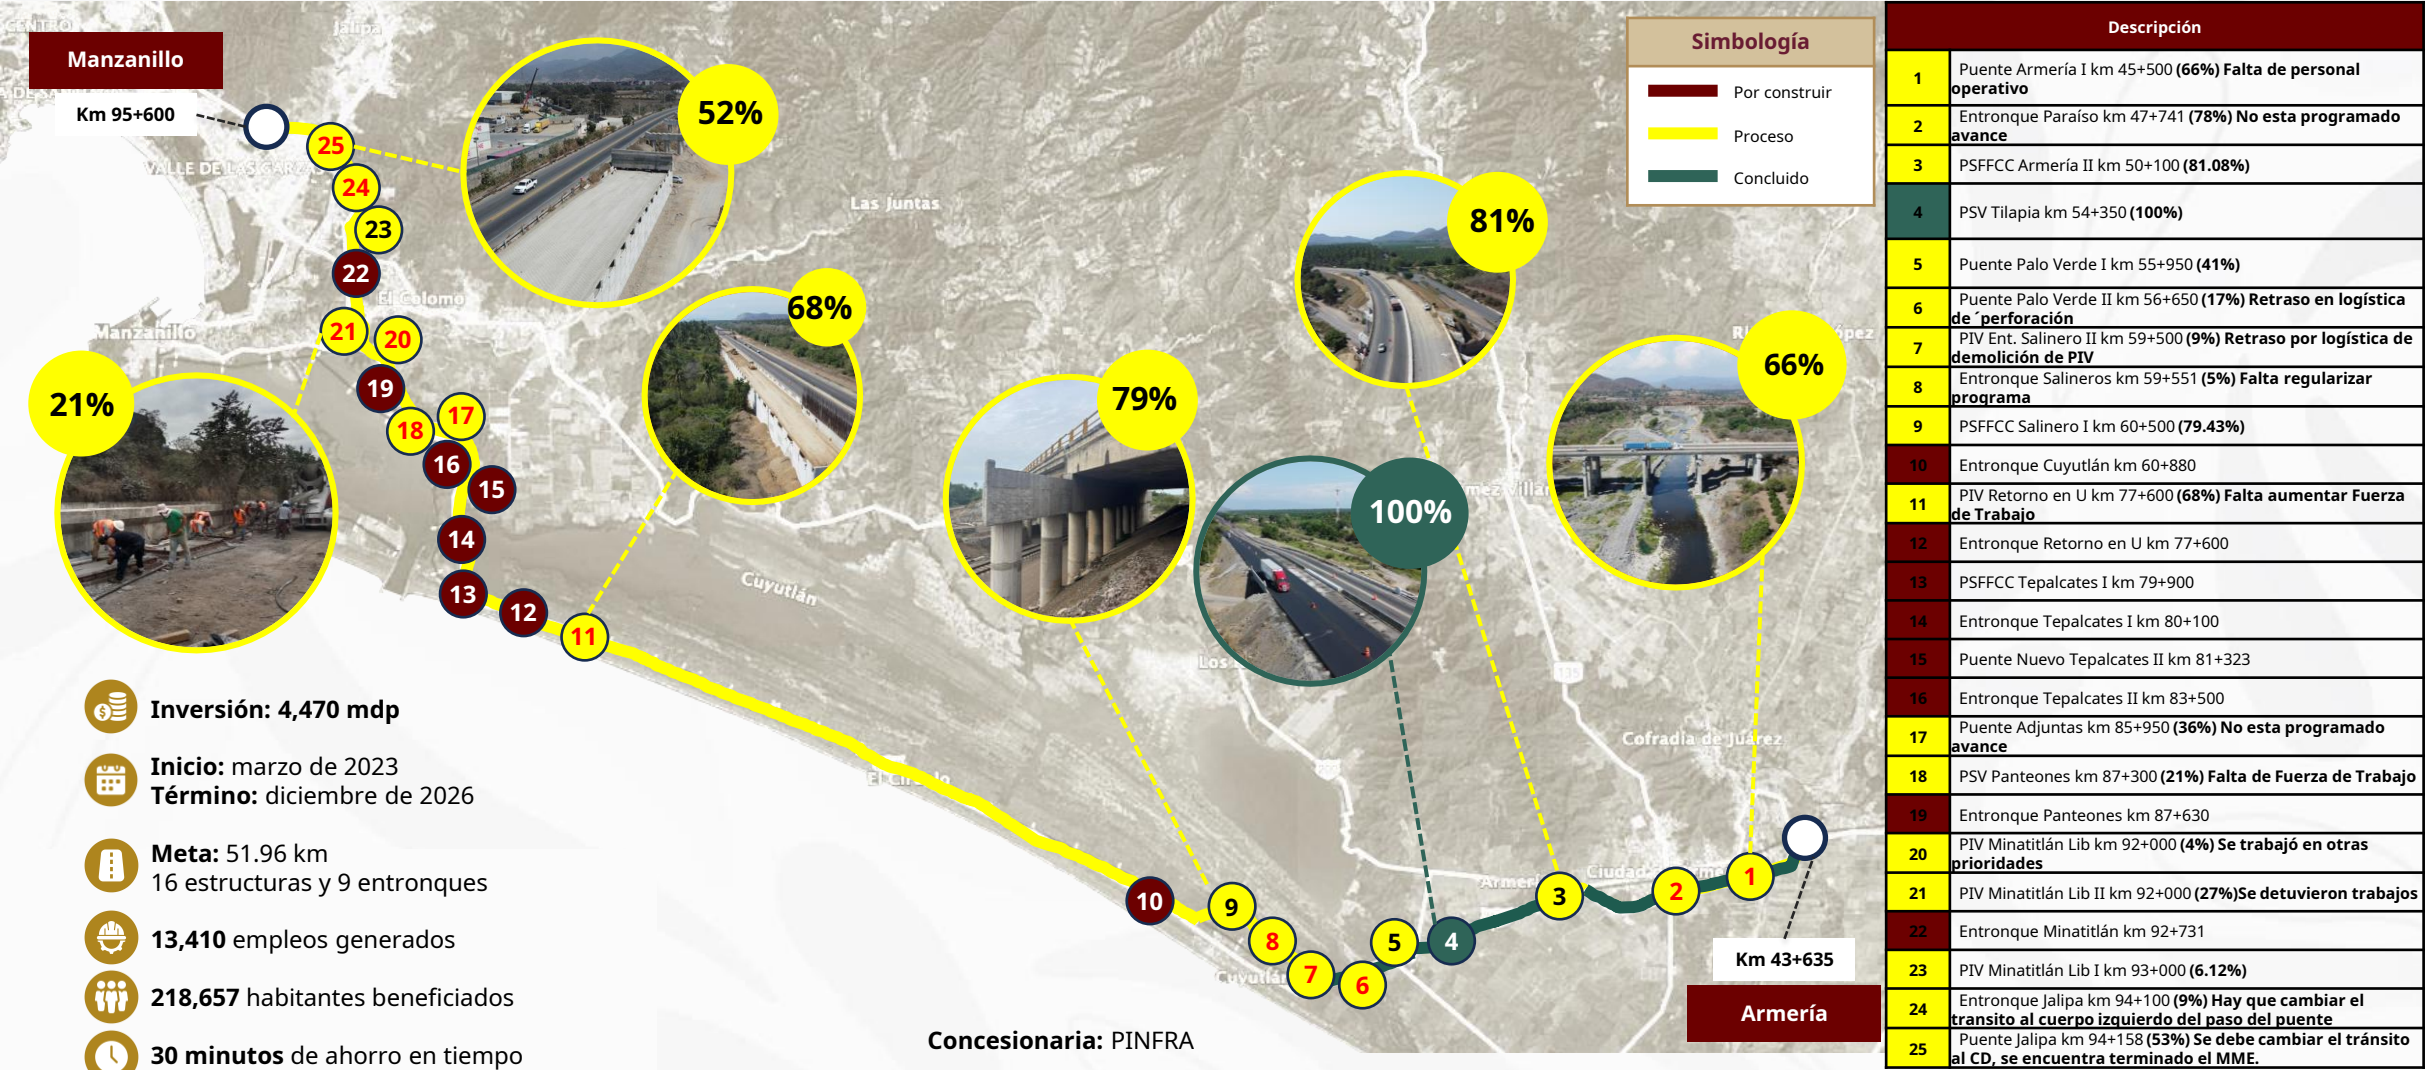


Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Elemento	Intervención	Ejecutado	Faltante	22/08/25 al 28/08/25		Observaciones
		acumulado		Programad o	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	261,836	0	0	2,412	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	489,419	324,490	0	4,720	
Base y sub base (m³)	260,119	133,468	126,651	0	1,957	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

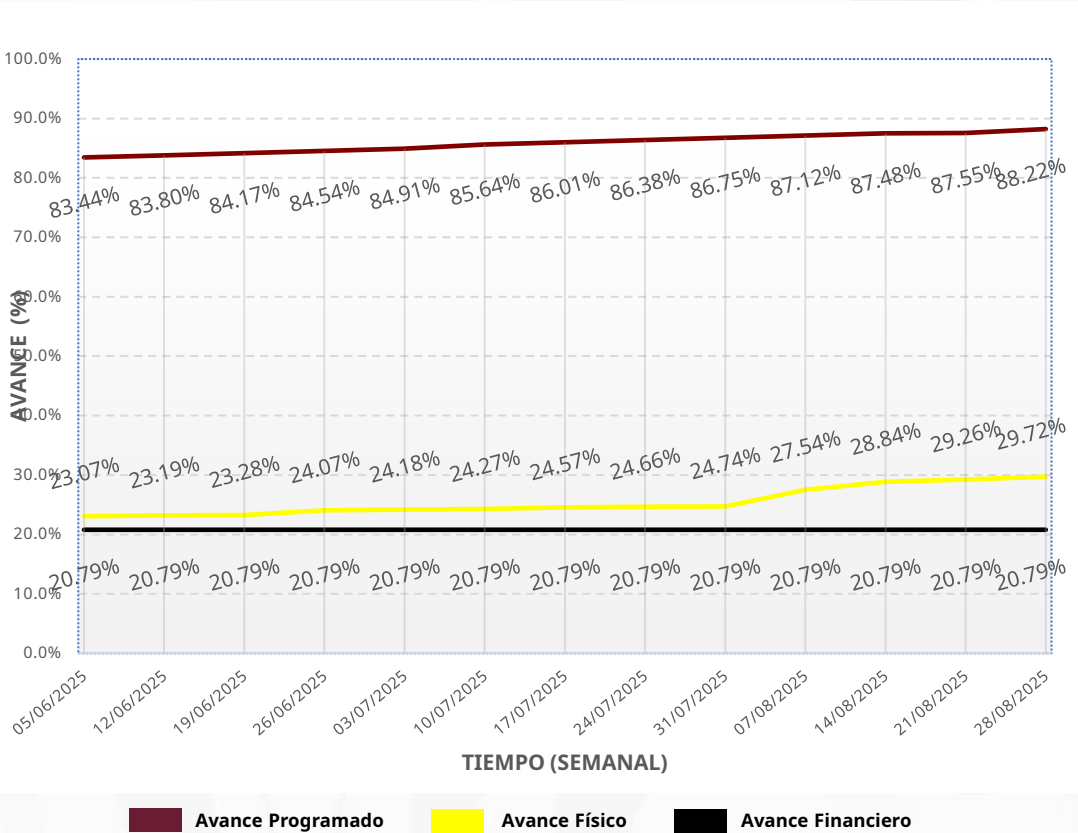

	15 de agosto al 21 de agosto	22 de agosto al 28 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	178	158
Maquinaria	70	59

