


# Michoacán

## Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

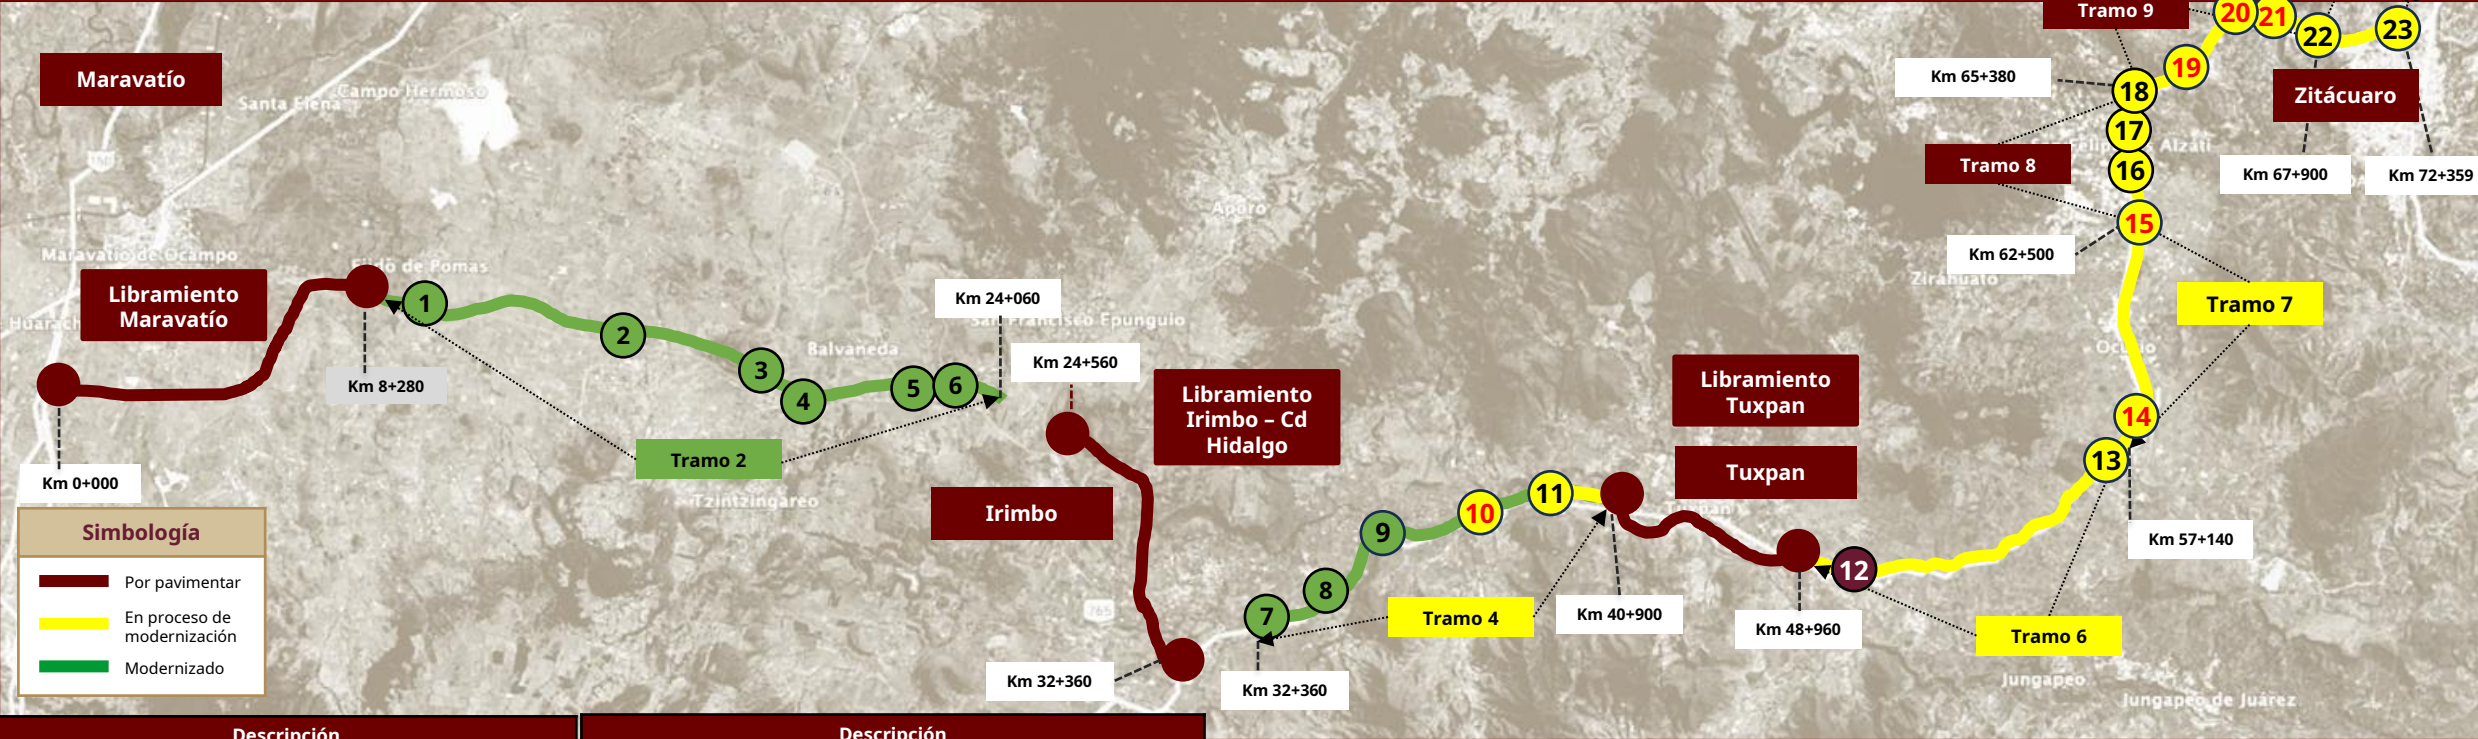

Descripción		Descripción	
1	Entronque Pomas km 9+380	13	Entronque Jungapeo km 56+700 (77.44%)
2	Entronque San Vicente km 14+500	14	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (68.32%) Sin actividad, Pendiente suministro de base Hidráulica en amp. De corona
3	PIP km 18+370	15	Entronque Zirahuato km 62+500 (57.44%) Pend. Base Asfáltica
4	Entronque Zinzingareo km 18+700	16	Entronque San Felipe I km 64+400 (23.26%)
5	Entronque Senguio km 21+280	17	Entronque San Felipe II Km 64+640 (23.26%)
6	PIP km 22+280	18	Entronque Macutzio km 65+620 (6.88%)
7	Entronque Santa Rosa km 32+420	19	Entronque Valle Verde km 67+220 (69.04%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
8	Entronque Ziranda-Jaripeo km 33+500	20	Entronque Curungueo I Km 68+240 (70.82%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
9	Puente Turundeo Km 36+460 (100.00%),	21	Entronque Curungueo II Km 68+780 (70.82%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
10	Entronque Turundeo I km 37+550 (99.99%), Falta tendido de carpeta asfáltica.	22	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (86.86%)
11	Entronque Turundeo II km 38+780 (99.92%)	23	PSV Zitácuaro Km 72+160 (86.19%)
12	Puente Obispo Km 50+400 (0.00%), Sin Iniciar		

### Avance físico

- Programado: 54.42% (Reprogramación T8)
- Real: 57.96%
- Semanal: 0.52%
- Financiero: 8.11%

**Nota:**  
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal, o no han iniciado.



**Inversión:** 4,575.3 mdp



**4,800 empleos generados**



**Meta:** 71.3 Km, 2 puentes, 1 PSV, 3 PIP's y 17 entronques



**126,000 habitantes beneficiados**



**Inicio:** septiembre 2020  
**Reinicio:** 27 de enero de 2024  
**Término:** 31 de diciembre de 2026



**Ahorro en tiempo:** 25 min

**Concesionaria:** Red de carreteras de occidente

# Michoacán

## Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 26 dic al 01 ene 26		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	727,556.90	-21,998.90	2,184.33	4,404.33	
Terraplén (m3)	445,687.00	368,315.94	77,371.06	279.11	2,379.84	
Subyacente (m3)	256,097.00	248,423.95	7,673.05	50.00	1,796.97	
Subrasante (m3)	170,688.00	162,986.59	7,701.41	773.11	940.63	

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 26 dic al 01 ene 26		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	113,197.70	12,461.34	597.16	663.27	
Bacheo (m3)	1,800.00	1,627.75	172.25	33.33	37.50	
Fresado (m3)	10,676.00	10,580.91	95.09	0.00	95.95	
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	28.04	2.20	0.00	0.46	
Geomalla (m2)	84,520.00	77,523.80	6,996.20	311.11	899.60	
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	113,681.80	6,732.25	656.89	1,484.57	
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	24,903.34	20,344.46	258.49	143.29	SE ESTÁ DANDO PRIORIDAD AL TENDIDO DE BASE ASFÁLTICA


ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 26 dic al 01 ene 26		Observaciones
				Programad o	Ejecutado	
PIV JUNGPEO	1.00	1.0043	0.0000	0.0000	0.0004	CONTINÚA EL CORTE DE TN EN GASAS Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE
PSV SAN FELIPE	1.00	0.3232	0.6768	0.0000	0.0275	TRABAJOS DE FRESADO Y TENDIDO DE BSAE ASFÁLTICA
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.8686	0.1314	0.1320	0.0134	COLADO DE LOSA DE COMPRESIÓN
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.8619	0.1381	0.0102	0.0057	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE SALIDA.
DEFENSA METÁLICA	31,302.00 ml	24,141.37 ml	7,160.64 ml	0.00 ml	97.07 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4.
BALIZAMIENTO	157,137.60 ml	62,630.51 ml	94,507.09 ml	0.00 ml	442.15 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4.
CUNETA	12,028.95 ml	10,413.35 ml	1,615.60 ml	0.00 ml	85.99 ml	CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN EN TRAMO 4 Y TRAMO 6.
BOTONES	12,041.00 pza	7,480.00 pza	4,561.00 pza	0.00 pza	371.00 pza	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4.



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

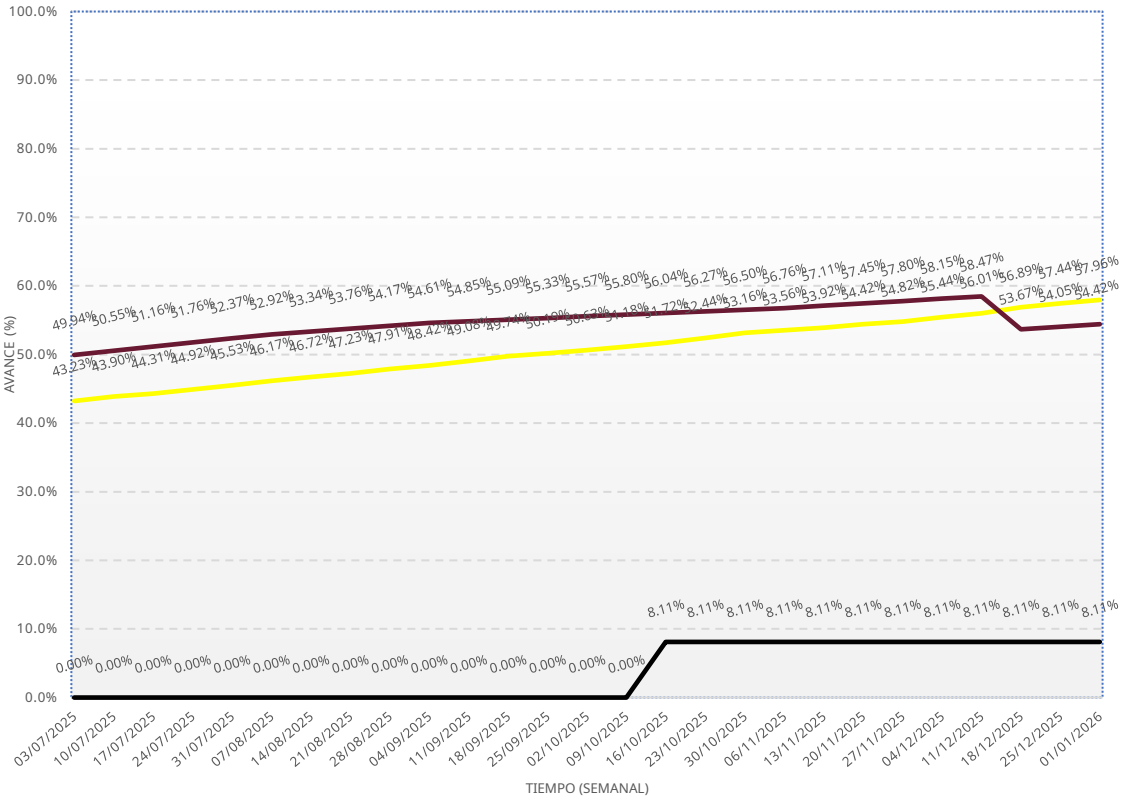

Avance Programado Avance Físico \*Avance Financiero

	Del 19 dic al 25 dic 25	Del 26 dic 25 al 01 ene 26
Fuerza de Trabajo (personas)	287	288
Maquinaria	191	185
tramos activos	IV, VI, VII, VIII, IX, X	IV, VI, VII, VIII, IX, X
