








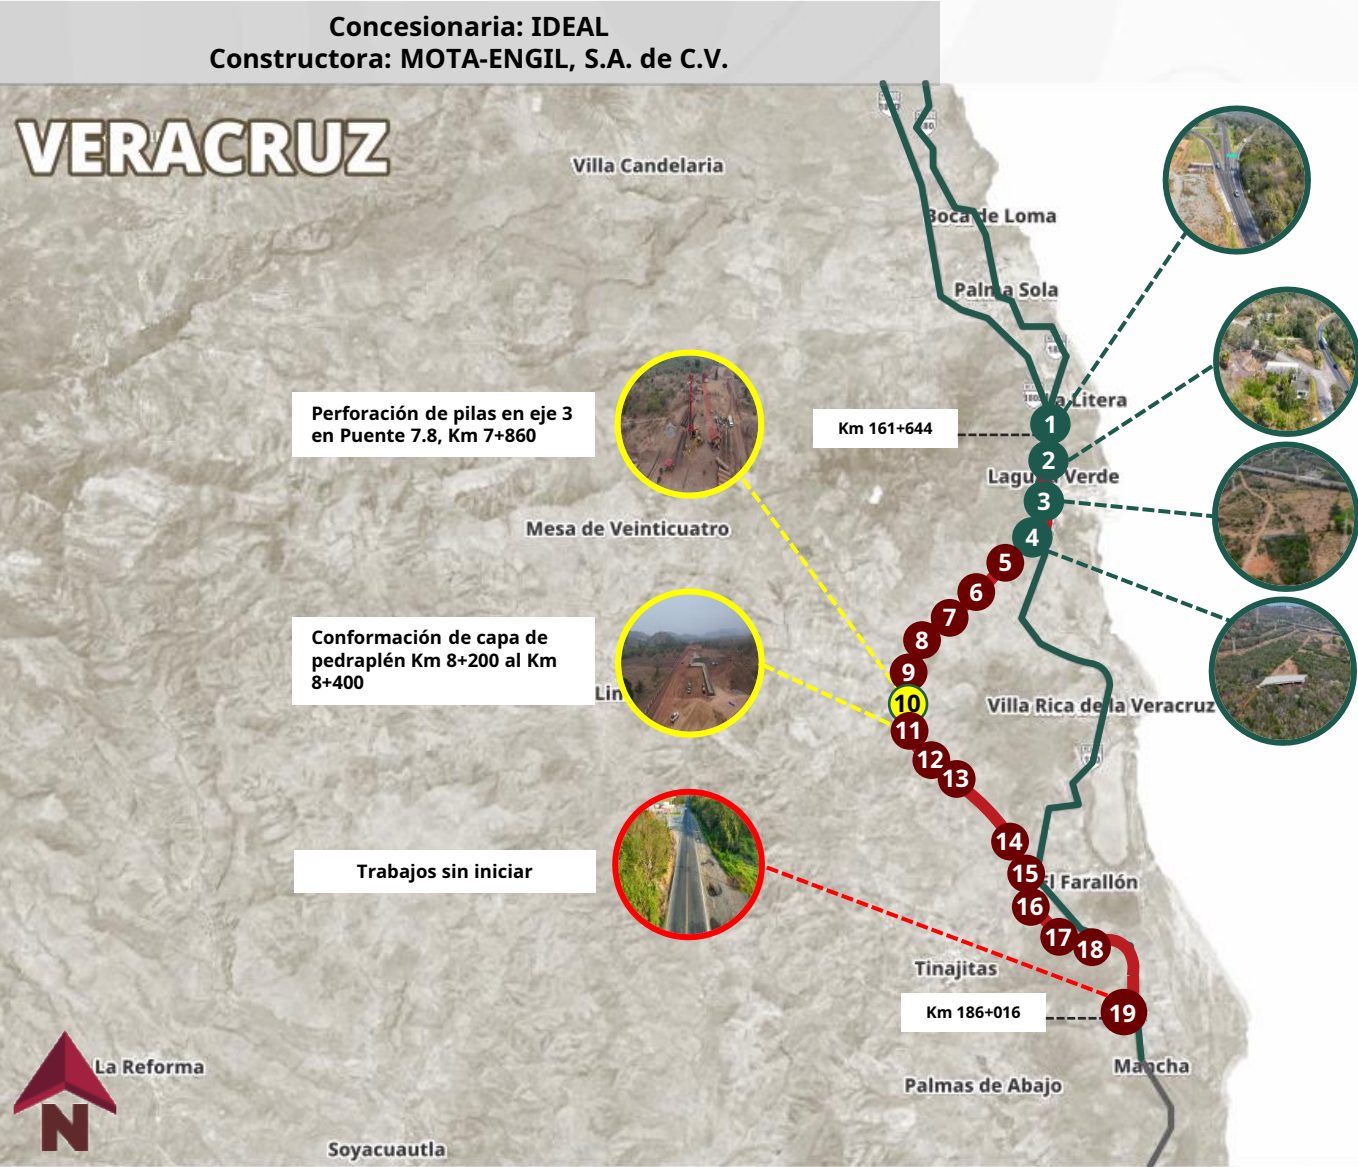


Veracruz Autopista Cardel-Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha



Descripción	
1	Entronque Laguna Verde Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.0 Km 3+041
5	PSMA 3.9 Km 3+900
6	PSMA 6.0 Km 6+080
7	PIV 6.8 Km 6+830
8	PIV 7.04 Km 7+040
9	PUENTE 7.3 Km 7+330
10	PUENTE 7.8 Km 7+860
11	PLAZA DE COBRO Km 8+300
12	PUENTE 8.7 Km 8+700
13	PSMA 8.9 Km 8+960
14	PUENTE 14 Km 14+000
15	PUENTE 14.7 Km 14+700
16	PSV Km 14+900
17	PSMA 15.3 Km 15+370
18	PSV 16.8 Km 16+800
19	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+840

Simbología	
	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

- Avance físico:**
- Programado: 9.58%
 - Real: 9.13%
 - Semanal: 0.38%
 - Financiero: 5.61%
-  **Inversión: 2,252.78 mdp**
-  **Inicio:** Marzo de 2025
Término: Agosto de 2026
-  **Meta:** 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMA, 43 ODTs y el Entronque Chapachapa
-  **21,147** empleos generados
-  **128,000** habitantes beneficiados
-  **45 minutos** de ahorro en tiempo, Tramo 4

Veracruz Autopista Cardel-Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	09/05/25 al 15/05/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volúmenes de obra						
Despalme	229,302.80	43,186.75	186,116.05	7,165.00	2365.00	La obra se suspendió a partir del km 8+800, se requiere pagar el DDV
Terraplén	1,155,915.50	12,378.19	1,143,537.31	20,641.00	861.00	La obra se suspendió a partir del km 8+800, se requiere pagar el DDV
Pedraplén	97,038.03	3,288.19	93,749.84	4,043.25	3288.19	La obra se suspendió a partir del km 8+800, se requiere pagar el DDV
Estructuras Laguna Verde - La Mancha						
Losa de cimentación	1	1	0	1	1	Losa de cimentación concluida en ODT 7.64
Pilas de Cimentación	5	2	3	2	2	Pilas puente 7.8, Km 7+860, inicio de actividades
Cabezotes	2	2	0	2	2	Armado de acero de refuerzo en ODT 8.1
Losa de cimentación y muros	4	1	3	1	1	Armado de acero de refuerzo en módulo 2 de ODT 8.8, inicio de actividades
Entronque Chapachapa						
Volúmenes de obra						
Despalme	5,384	3,480.61	1,903.39	711	103.11	
Saneo y corte	4,400	5,863.35	-1,463.35	143	261.03	Se tiene un volumen ejecutado mayor al volumen de proyecto
Terraplén (Material no compactable)	23,644	23,576.22	67.78	7881.33	1,203.74	
Terraplén (95%) Subyacente	10,637	750.62	9,886.38	2,659.25	750.62	La lluvia del viernes, sábado y domingo impidió continuar el trabajo
Estructuras Entronque Chapachapa						
Aleros	4	4	0	2	2	Colado de aleros de PSPyG 92+832.22

