

# Michoacán

## Uruapan-Nueva Italia


Avance físico

• Programado: 9.65 %

• Semanal: 0.17 %

• Real: 9.26 %

• Financiero: 0%

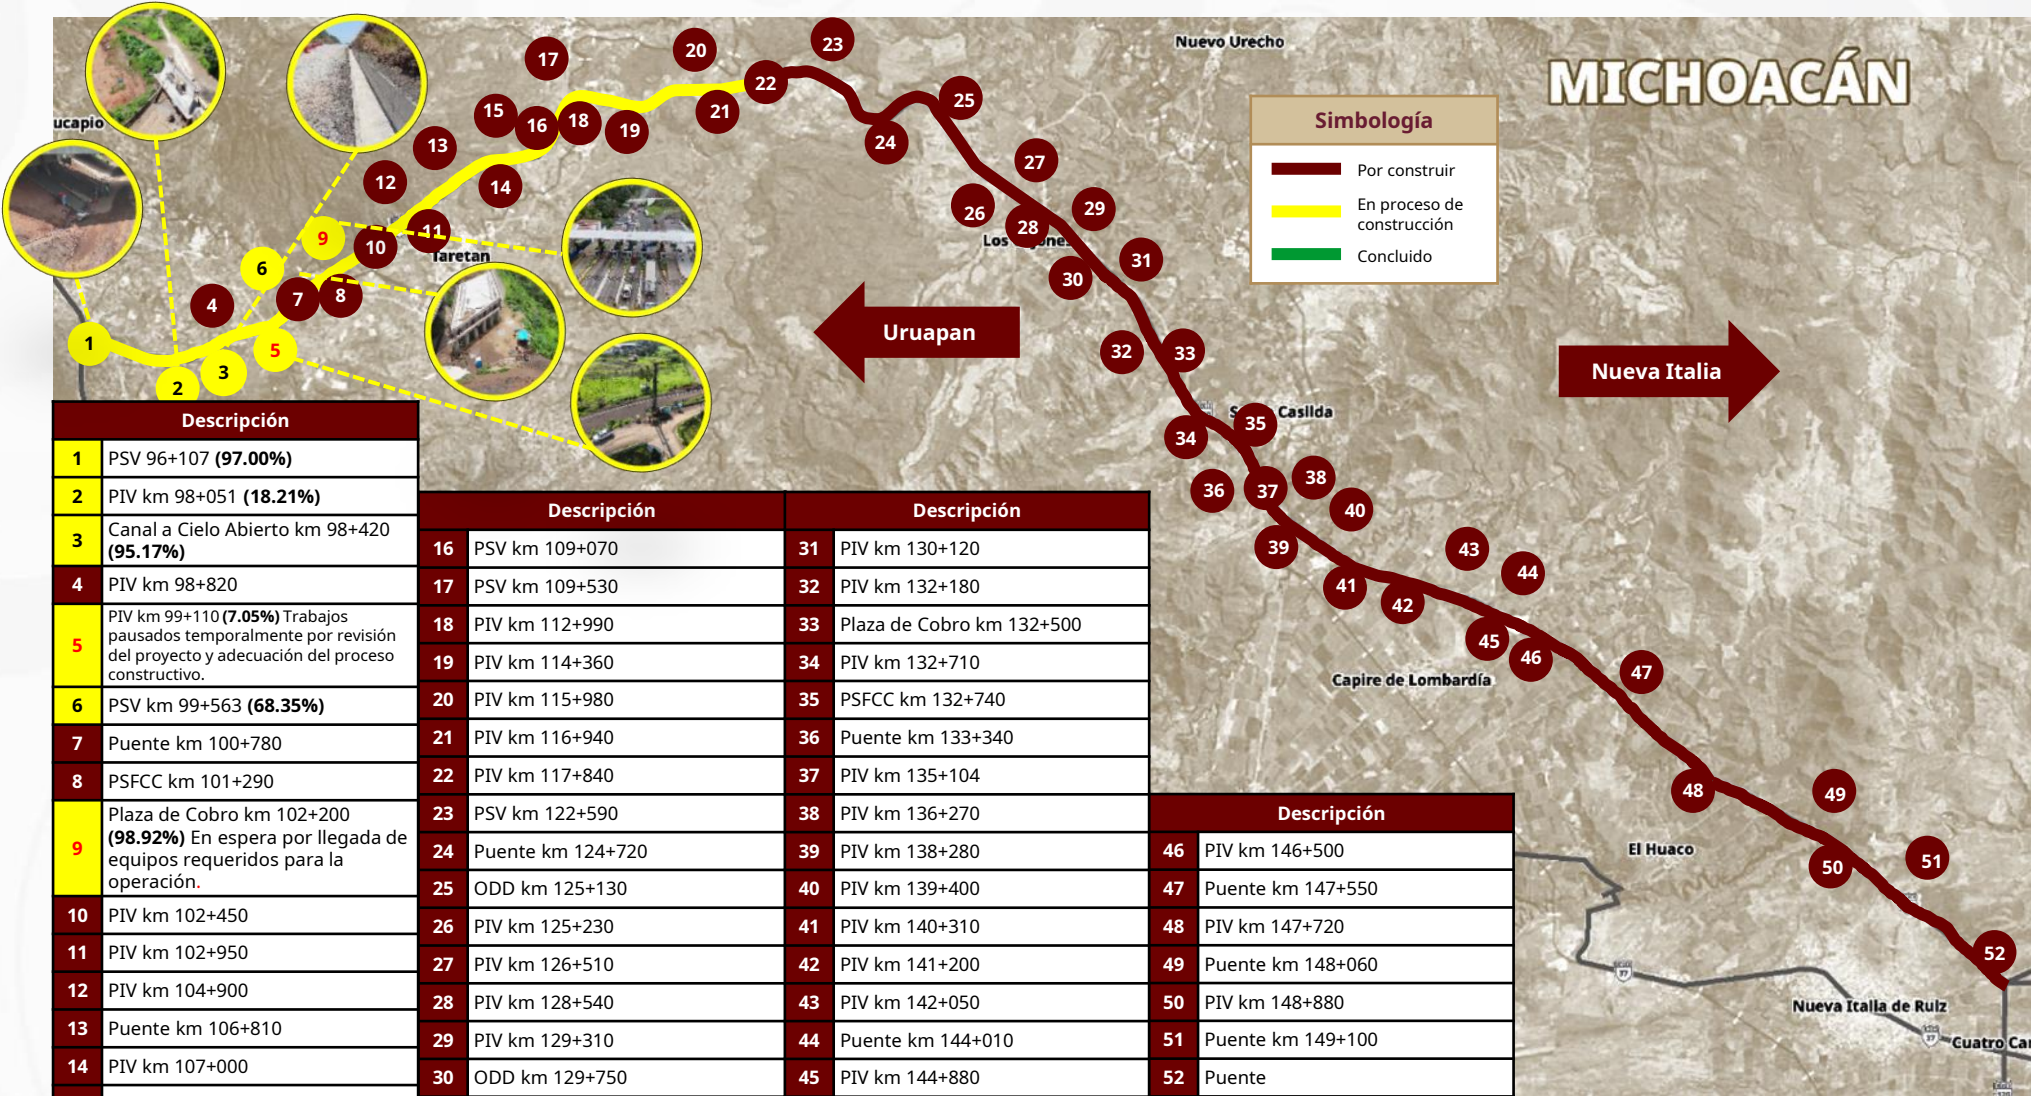

- 

**Inversión: 7,049 mdp**
- 

**Inicio:** noviembre de 2023  
**Término:** agosto de 2027
- 

**Meta: 67.09 km**  
65 km (troncal)  
2.09 km (estructuras)  
2 plazas de cobro, 10 puente,  
6 entronques, 54 cruces y  
múltiples obras de drenaje.
- 

**12,480** empleos generados
- 

**1,800,000** habitantes  
beneficiados
- 

**25 minutos** de ahorro  
en tiempo
- Concesionaria :** PINFRA.


**Nota:**  
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

# Michoacán

## Uruapan-Nueva Italia

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	29/08/2025 al 04/09/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Subbase	65 km	6.93 km	58.07 km	.200 km	.200 km	
Subyacente	65 km	8.46 km	56.54 km	.200 km	.200 km	
PSV 96+107 Conos de derrame	2	1	1	1	1	Construcción de lavadero en acceso C1
PSV 98+051 Demoliciones	2	1	1	1	1	Retiro de parapeto metálico de antiguo PIV
PSV 99+563 Guarniciones	2	1	1	1	1	Retiro de cimbra de madera en parapeto de concreto y diafragmas exteriores acceso C1.

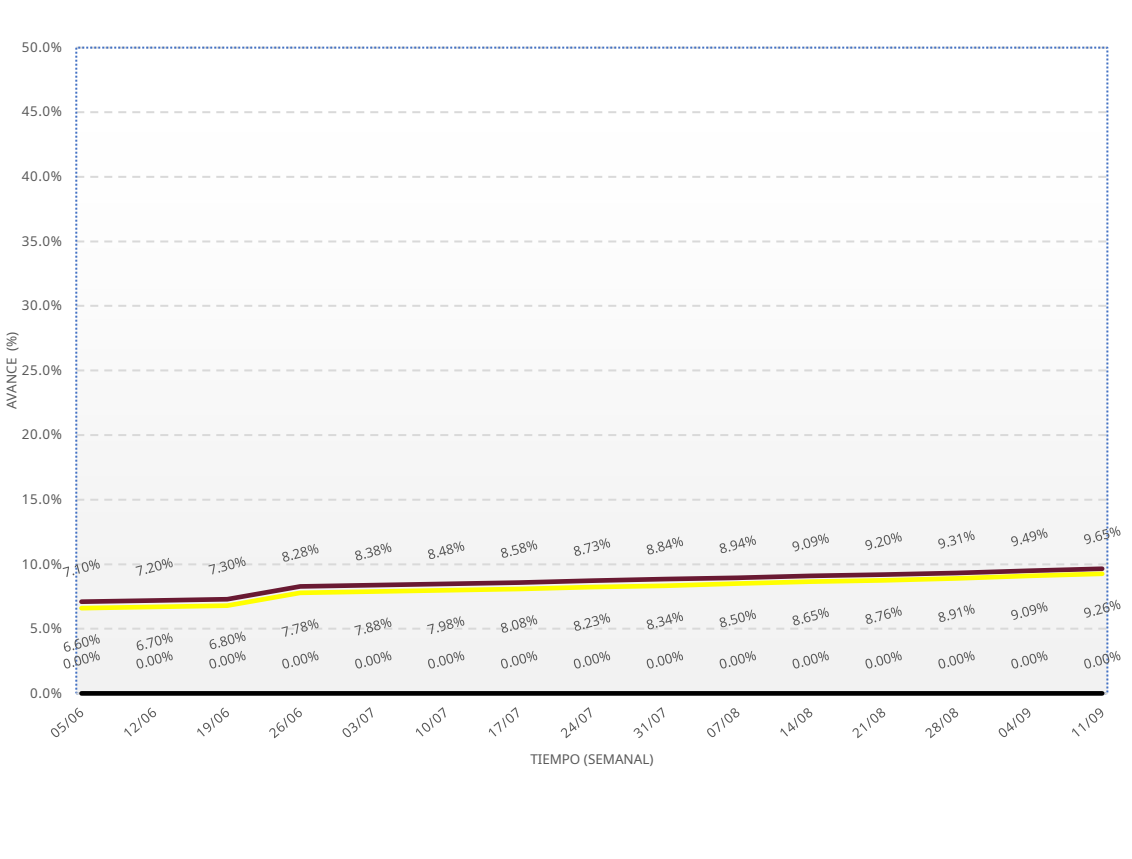

	Del 22 de agosto al 28 de agosto	Del 29 de agosto al 04 de septiembre.
Fuerza de Trabajo (personas)	570	570
Maquinaria	223	230

