


Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance físico

- Programado: 8.58 %
- Real: 8.08 %
- Semanal: 0.10 %
- Financiero: 0%

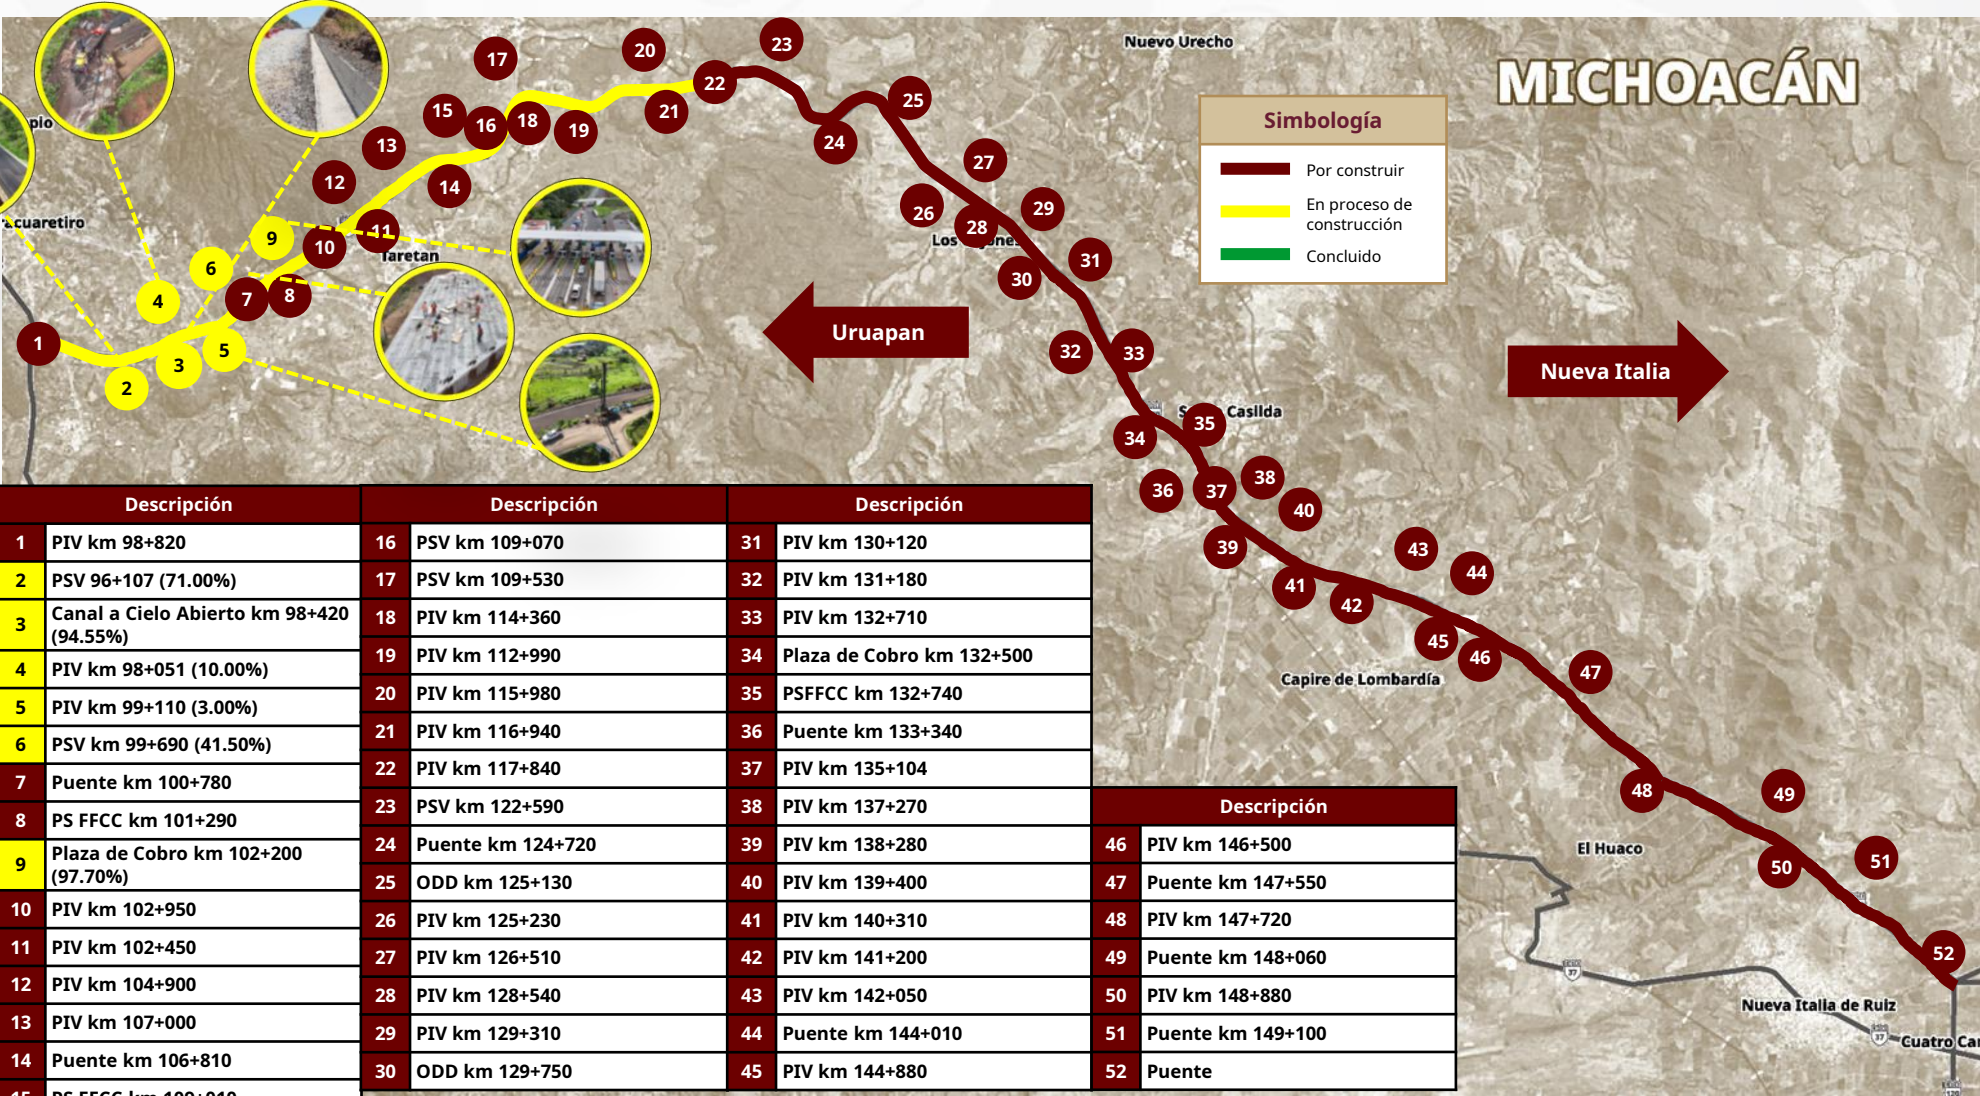


-  **Inversión: 7,049 mdp**
-  **Inicio:** noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
-  **Meta: 67.09 km**
65 km (tronal)
2.09 km (estructuras)
2 plazas de cobro, 10 puente,
6 entronques, 54 cruces y
múltiples obras de drenaje.
-  **12,480** empleos generados
-  **1,800,000** habitantes beneficiados
-  **10 minutos** de ahorro en tiempo
- Concesionaria : PINFRA.**

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance Programado-Físico-Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	04/07/25 al 10/07/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Subbase	65 km	6.65 km	58.35 km	.100 km	.100 km	En revisión programa de obra.
Subyacente	65 km	7.5 km	57.5 km	.300 km	.300 km	
PSV 96+107 Guarnición y parapeto	2	1	1	1	1	Colado de concreto para parapeto (lado izquierdo).
PIV 98+051 Cabezales	2	0	2	1	1	Habilitado de cimbra y suministro de acero previo al armado de acero de refuerzo para cabezal..
PSV 99+563 Losas de compresión	1	1	1	1	1	Continúan trabajos para armado de acero y habilitado de cimbra para muro pantalla en caballete #1
Plaza de cobro 102+200 Acabados	2	1	1	1	1	Colocación de cancelería de aluminio en cabinas.

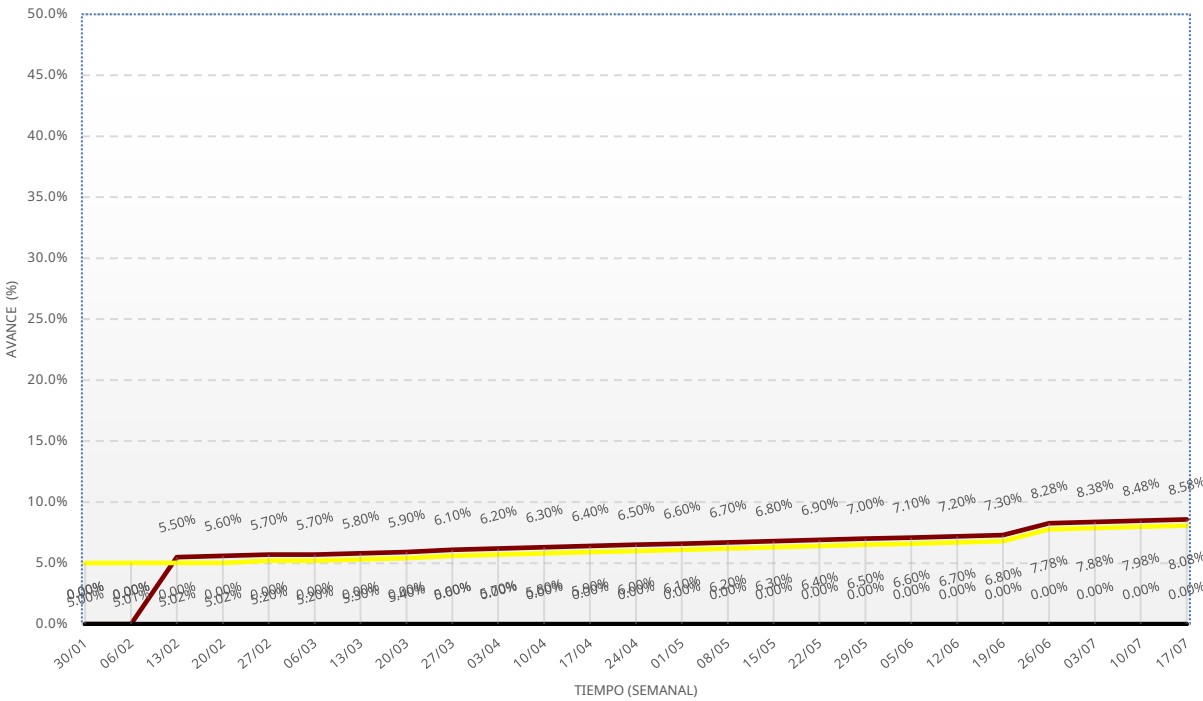

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 04 de julio al 10 de julio.	Del 11 de julio al 17 de julio.
Fuerza de Trabajo (personas)	1,500	1,500
Maquinaria	550	550



2025
Año de
La Mujer
Indígena
