

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II

Avance físico

- Programado: 100%
- Real: 98.82%
- Semanal: 0.02%

Avance obra pendiente

- Real: 85.92%



Descripción	
1	PIV km 87+900
2	PIP km 91+530
3	PIPR km 92+436
4	PIV km 92+438
5	PIP km 92+680
6	Entronque Llano Crucero km 92+690
7	Entronque Llano Laguna km 98+200

Descripción	
8	Entronque Cerro Pascale km 100+500
9	PIP km 106+570
10	PIV km 108+570
11	PIV km 109+247
12	PIV km 110+460
13	Entronque Danigare km 111+600

Descripción	
14	PIP km 112+270
15	PIV km 114+766
16	Entronque Agua Blanca Km 122+600
17	Entronque Quiavicuzas Km 137+900
18	PIPG Km 146+840
19	PI Km PG 159+400

Inversión: 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos

Término: Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)

Meta: Trabajos en la troncal, 6 entronques y 17 pasos de servidumbre, 13 en construcción y 4 en proyecto

❖ **Nota:** Se negoció cambiar 4 pasos de servidumbre por caminos laterales a la troncal, por lo que redujo de 21 a 17 pasos de servidumbre

12,204 empleos generados

+1 millón 400 mil habitantes beneficiados


2 hrs de ahorro en tiempo

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	18/04/25	24/04/25	Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PIV km 87+840						
Columnas	22	1	21	1	1	Se realizan trabajos de colado de pilotes,colado de columnas y 3 trabes armada
PIPR km 92+436						
Parapeto	16	13	3	1	1	Se continua con la colocación del parapeto
PIV km 92+438						
Parapeto	10	10	0	3	3	Se completó la colocación del parapeto metálico y se continúa con la instalación y pintura de parapetos. Además, se avanza en la construcción del muro de contención para el acceso al caballete 6
Entronque Llano Laguna km 98+200						
Junta de calzada	2	2	0	2	2	Se concluyó la colocación de junta de calzada en PIV. Se continua con la construcción de caja de captación en O.D. en gasa 8.
PIV km 109+247						
Prelosas	120	120	0	56	56	Se concluyó suministro y colocación de prelosas. Se realizan trabajos de armado de acero para losa de calzada.
Entronque Agua Blanca km 122+600						
Defensa metálica	1.030 m	1,030	0	520.5	520.5	Se realizan trabajos de construcción de guarnición en PIV. Se concluyó la colocación de la defensa metálica

Avance Programado-Físico-Financiero (%)

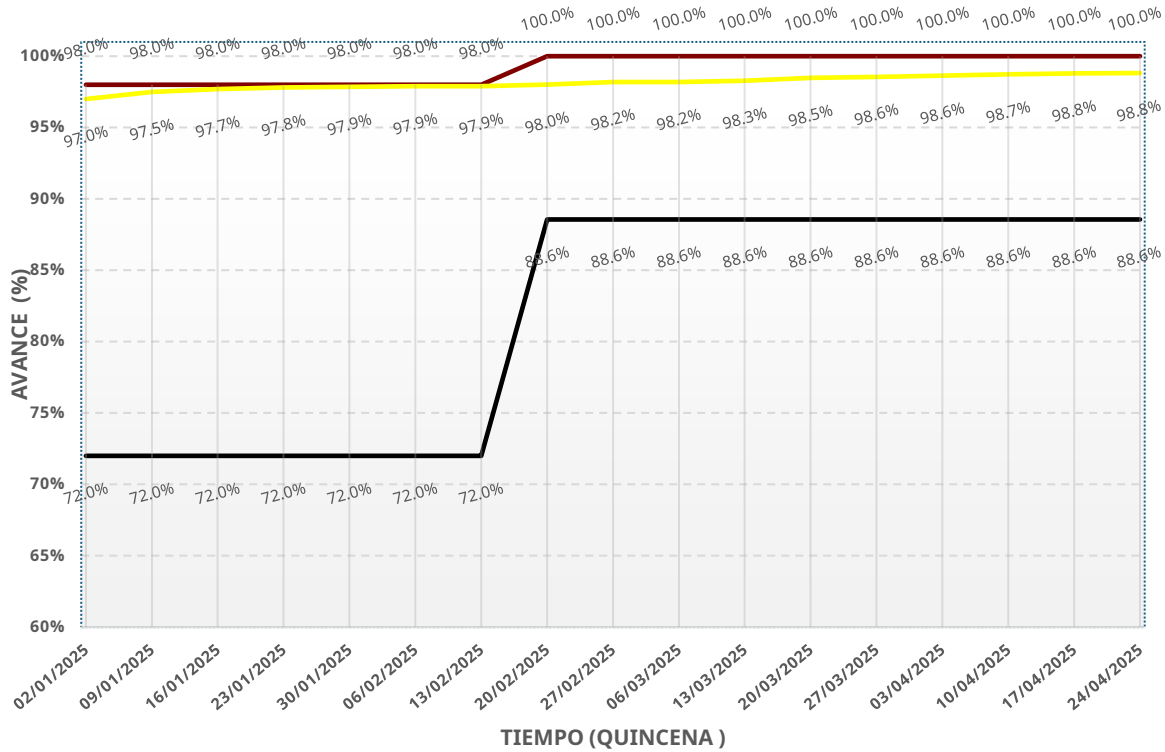

	11 de abril al 17 de abril	18 de abril al 24 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	600	500
Maquinaria	64	64
