

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico • Programado: 100% • Semanal: 0.02%
• Real: 99.60%

Avance obra pendiente • Real: 95.02%

Avance financiero • Real: 97.96%
• Nota: De este porcentaje se tiene
Una deuda de 2,798 mdp por
Trabajos ejecutados:



Descripción	
1	PIV km 87+900. 40% Conflicto entre sindicatos de camioneros
2	PIP km 91+530. 100%
3	PIPR km 92+436. 100%
4	PIV km 92+438. 100%
5	PIP km 92+680. 0%
6	Entronque Llano Crucero km 92+690. 82% Problemas D.V.
7	Entronque Llano Laguna km 98+200. 100%

Descripción	
8	Entronque Cerro Pascale km 100+500. 100%
9	PIP km 106+570. 100%
10	PIP km 108+570. 100%
11	PIV km 109+247. 100%
12	PIV km 110+460. 100%
13	Entronque Danigare km 111+600. 100%

*No hay avances debido a la falta de asignación de recursos

Descripción	
14	PIP km 112+270. 100%
15	PIV km 114+766. 100%
16	Entronque Agua Blanca Km 122+600. 100%
17	Entronque Quiavicuzas Km 137+900. 100%
18	PIPG Km 146+840. 95%
19	PIPG km159+400. 95%

Inversión: 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos

Término: Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)

Meta: 65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques, 2 casetas y 17 pasos de servidumbre. En proceso: Trabajos en la troncal, 1 entronque y 8 pasos de servidumbre

❖ **Nota:** De los pasos de servidumbre 9 están terminados, 2 con un 95%, 1 al 40% y 5 sin iniciar

❖ El Túnel Tornillo se encuentra colapsado y en proceso de determinar su solución

12,204 empleos generados

+1 millón 400 mil habitantes beneficiados

2 hrs de ahorro en tiempo

Nota:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.


Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulad o	Faltante	05/09/25 al 011/09/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Muro de pilas km 92+700						
Perforación de pilastrones	38	15	23	0	0	• Se reanudaron los trabajos sin embargo es mínimo el avance debido a la falta de recursos
Armado y colado de pilastrones	38	14	24	0	0	

❖Nota: A partir de esta fecha, ya no existirán avances debido a la considerable deuda que se tiene con las empresas contratadas por la concesionaria a la fecha y la falta de recursos presupuestales.

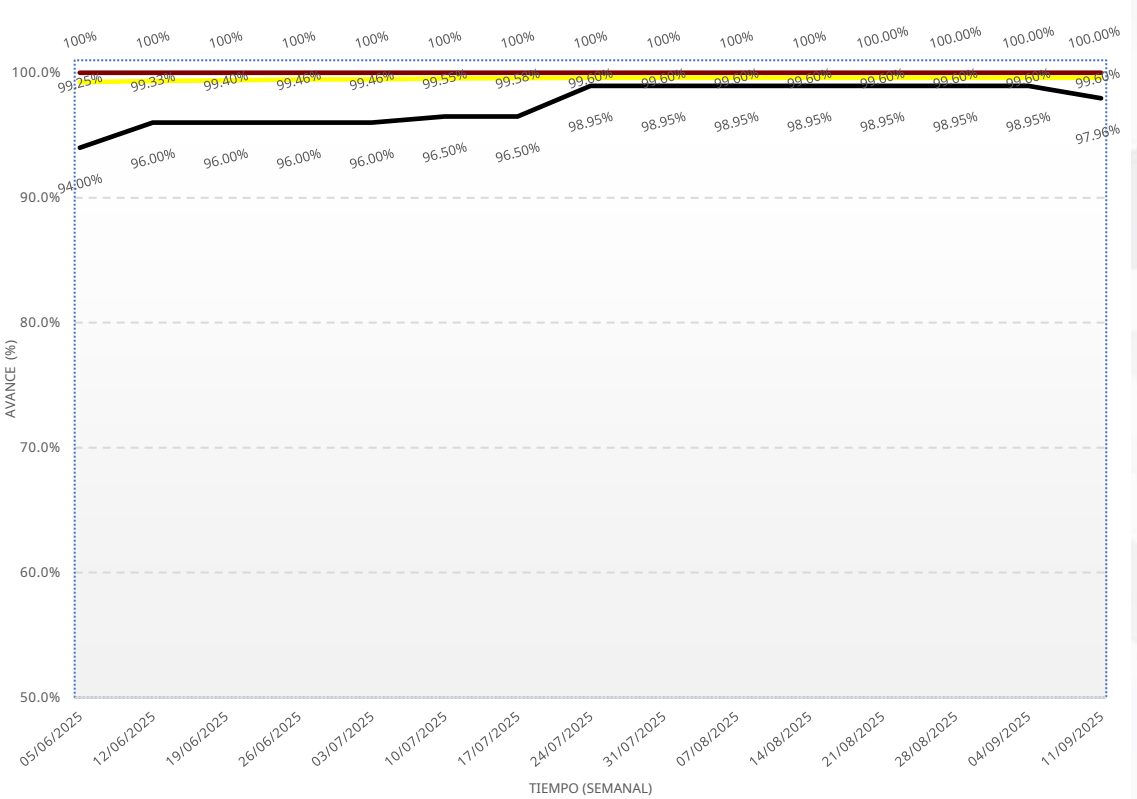

	29 de agosto al 04 de septiembre	05 de septiembre al 11 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	50	50
Maquinaria	9	9
