


Nayarit

Tramo Tepic - Compostela



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

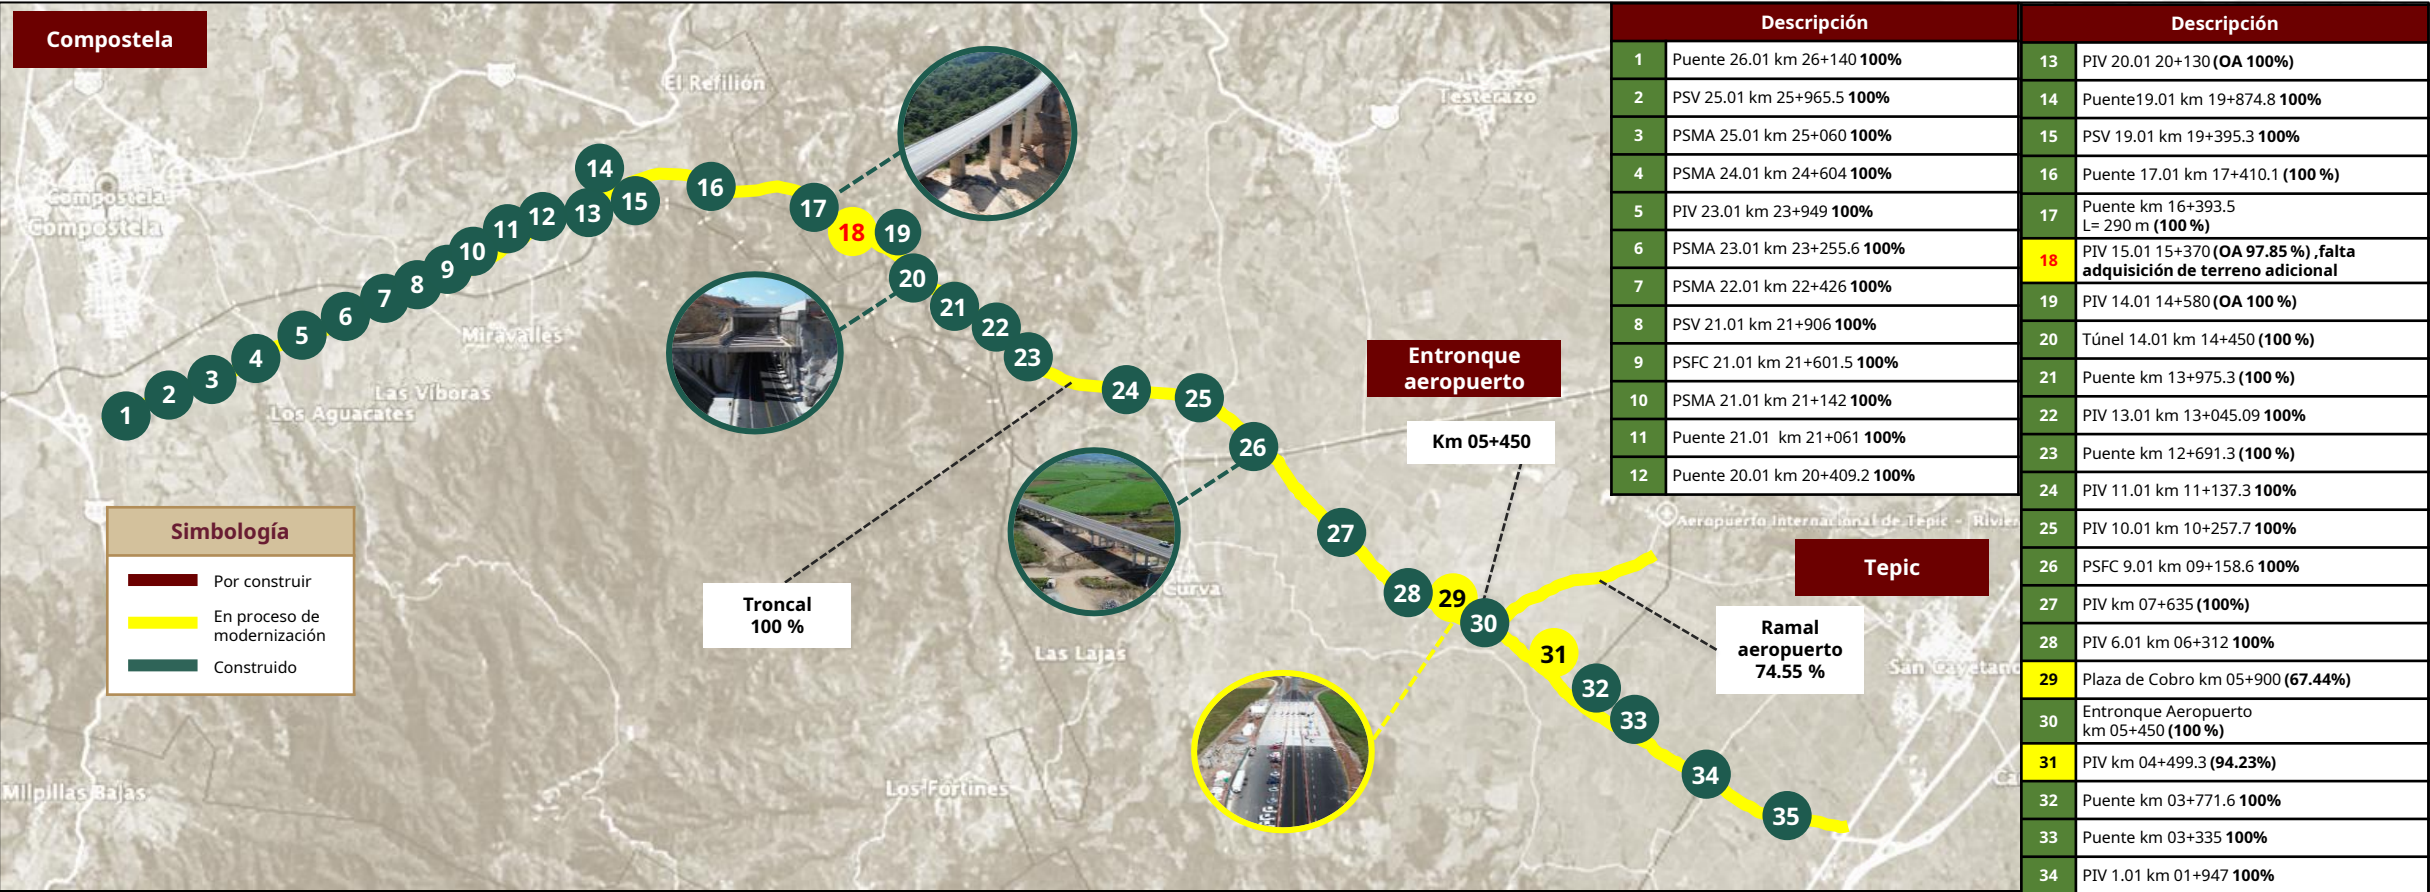

2025
Año de
La Mujer Indígena

Avance físico

- Programado: 100 %
- Real: 99.97 %
- Financiero: 96.70 %
- Semanal: 0.02 %

Concesionaria: FONADIN



Inversión: 2,473.43 mdp



Meta: 28 km. 1 Túnel Falso, 1 Plaza de cobro, 10 Puentes, 2 PSFC, 1 Entronque (solo gasas) y 1 Entronque completo (Aeropuerto), 21 Cruces y Ramal Aeropuerto



Inicio: Marzo 2023
Término: 31-Oct-2025



2,473 empleos directos generados P/MDI
4,946 empleos indirectos generados P/MDI



490 mil habitantes beneficiados



35 minutos de ahorro en tiempo

Nayarit


Tramo Tepic - Compostela



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	21/11/25 al 27/11/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m3)	2,095,966.26	2,065,999.62	29,966.64	2,350.00	2,500.00	
Subyacente (m³)	290,689.00	275,686.49	15,002.51	1,750.00	2,000.00	

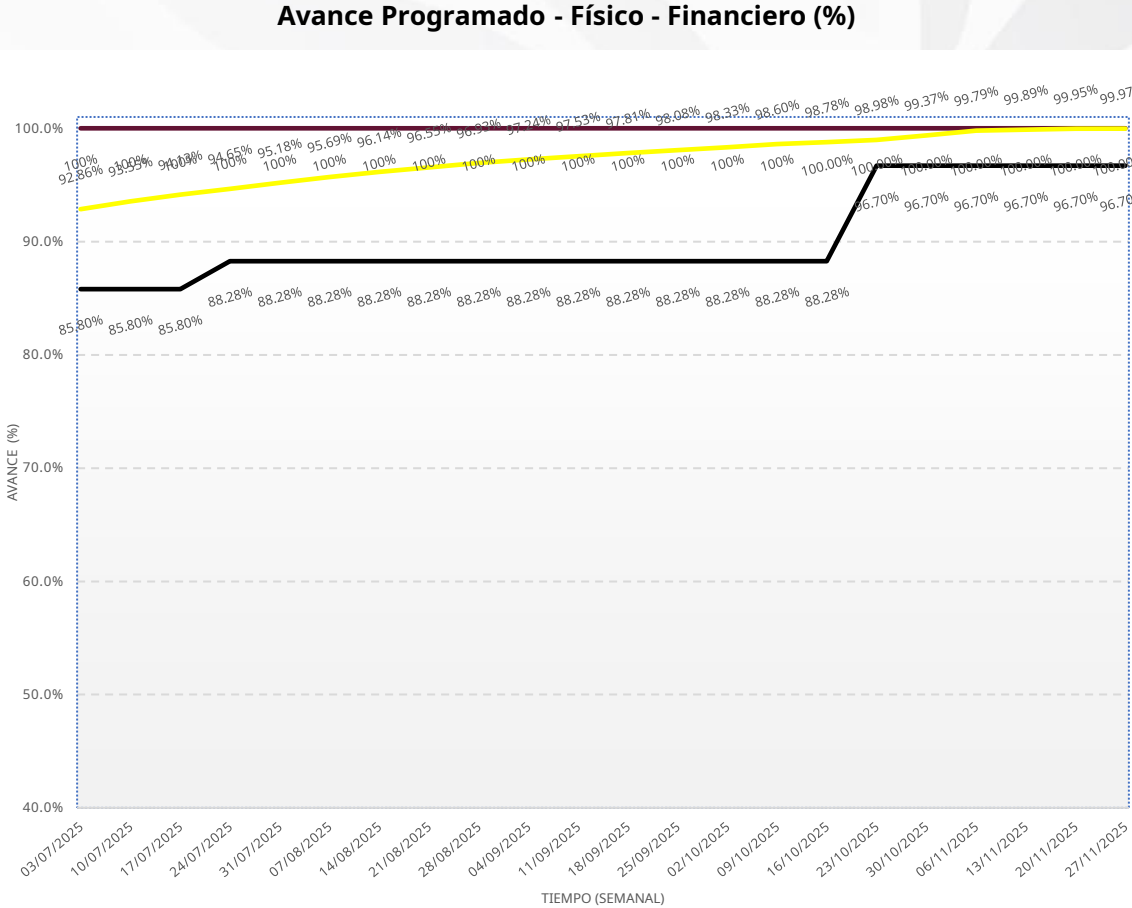

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	14 de noviembre al 20 de noviembre	21 de noviembre al 27 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	450	450
Maquinaria	68	68
