


Colima


Tramo Armería - Manzanillo


Avance físico


• Programado: 94.11%
• Real: 35.07%


• Semanal: 0.21 %
• Financiero: 20.79%

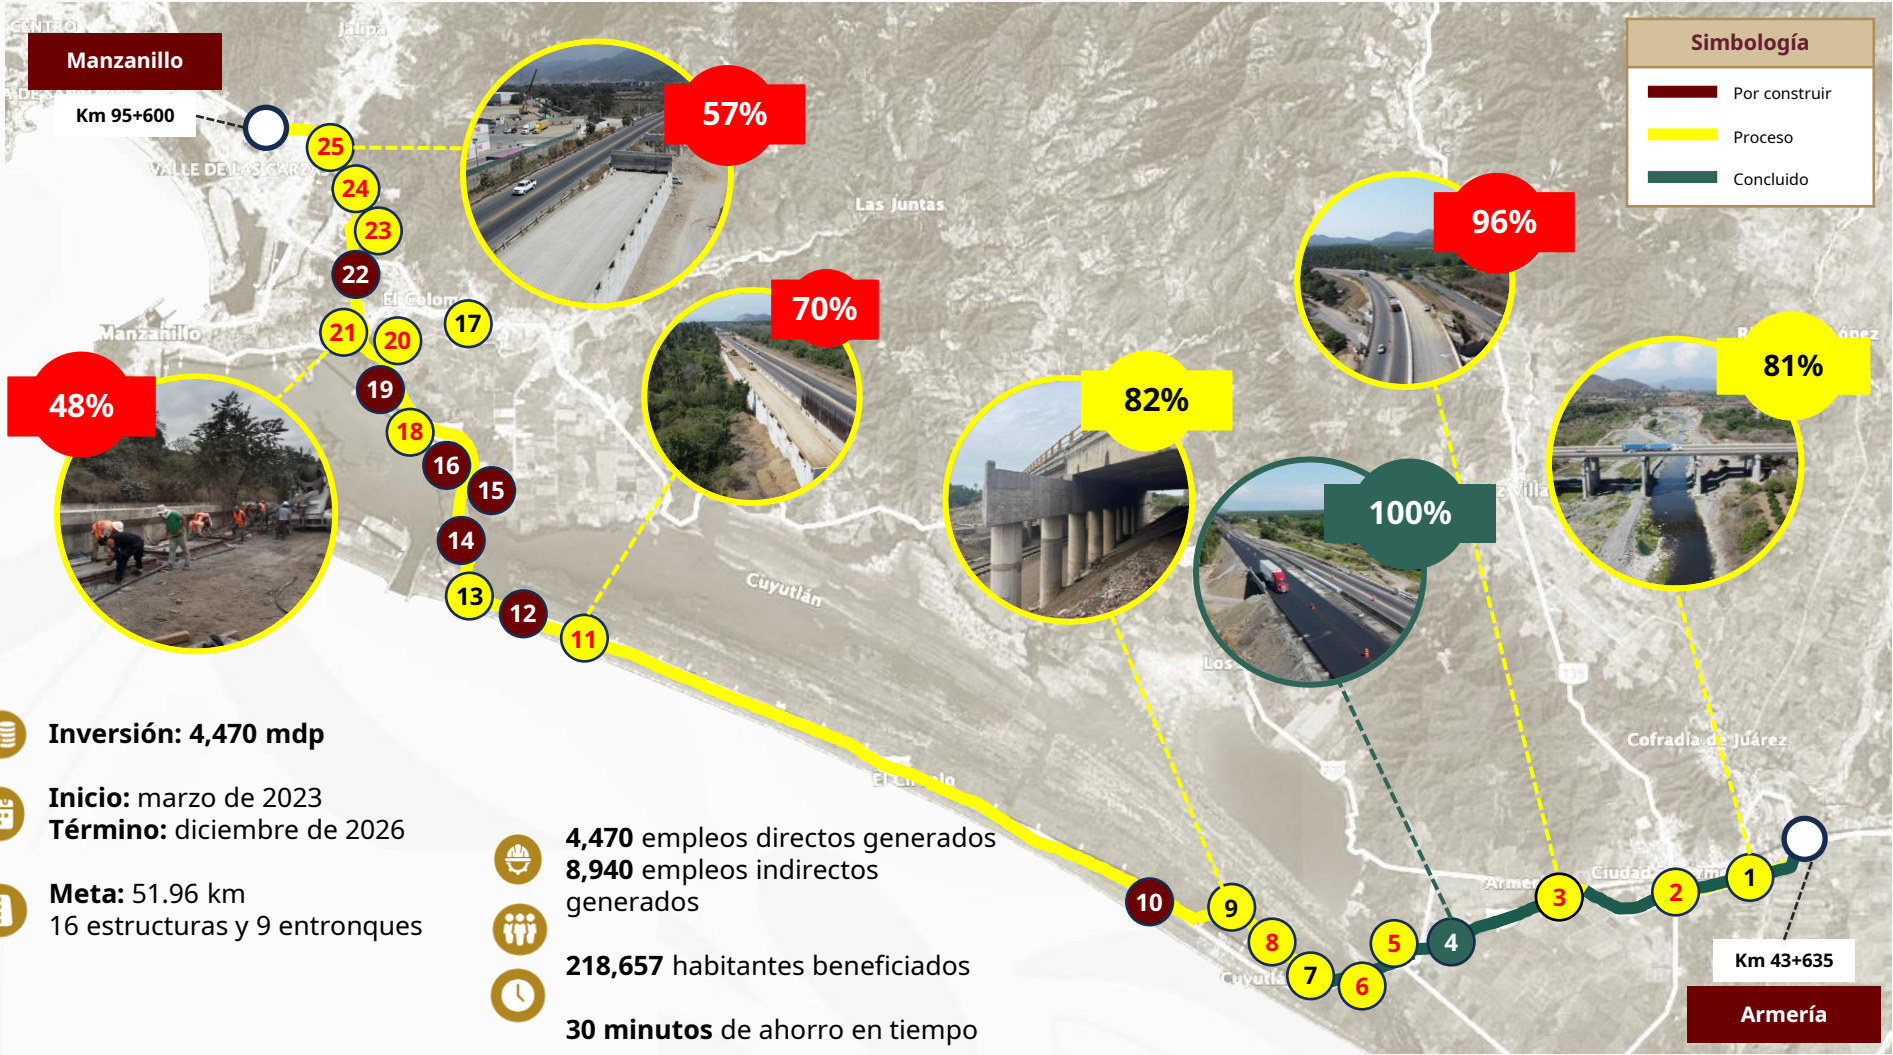



 **Inversión:** 4,470 mdp

 **Inicio:** marzo de 2023
Término: diciembre de 2026

 **Meta:** 51.96 km
16 estructuras y 9 entronques

 **4,470** empleos directos generados
8,940 empleos indirectos generados

 **218,657** habitantes beneficiados

 **30 minutos** de ahorro en tiempo

Concesionaria: PINFRA

Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (81%)
2	Entronque Paraíso km 47+741 (78%) No esta programado avance.
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (96%) Sin trabajos programados
4	PSV Tilapia km 54+350 (100%)
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (42%) Se inició habilitado de acero
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (17%) Sin actividades programadas
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (37%)
8	Entronque Salineros km 59+551 (5%) Falta regularizar programa
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (82%)
10	Entronque Cuyutlán km 60+880
11	PIV Retorno en U km 77+600 (70.66%) No se tuvieron trabajos programados
12	Entronque Retorno en U km 77+600
13	PSFFCC Tepalcates I km 79+900 (52%)
14	Entronque Tepalcates I km 80+100
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+323
16	Entronque Tepalcates II km 83+500
17	Puente Adjuntas km 85+950 (67%)
18	PSV Panteones km 87+300 (21%) Falta de Fuerza de Trabajo
19	Entronque Panteones km 87+630
20	PIV Minatitlán Lib. km 92+000 (4%) Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.
21	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 (48%) Trabajo programado para esta semana concluido
22	Entronque Minatitlán km 92+731
23	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (15.75%) No se ha comenzado en esta estructura por logística de perforación
24	Entronque Jalipa km 94+100 (9%) Hay que cambiar el tránsito al cuerpo izquierdo del paso del puente
25	Puente Jalipa km 94+158 (57%) El trabajo programado para esta semana, está concluido

Colima


Tramo Armería - Manzanillo

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/11/25 al 27/11/25		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	272,281	0	0	204	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	520,194	293,716	0	2,468	
Base y sub base (m³)	260,119	161,612	98,507	0	3,712	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.



Avance Programado - Físico - Financiero (%)

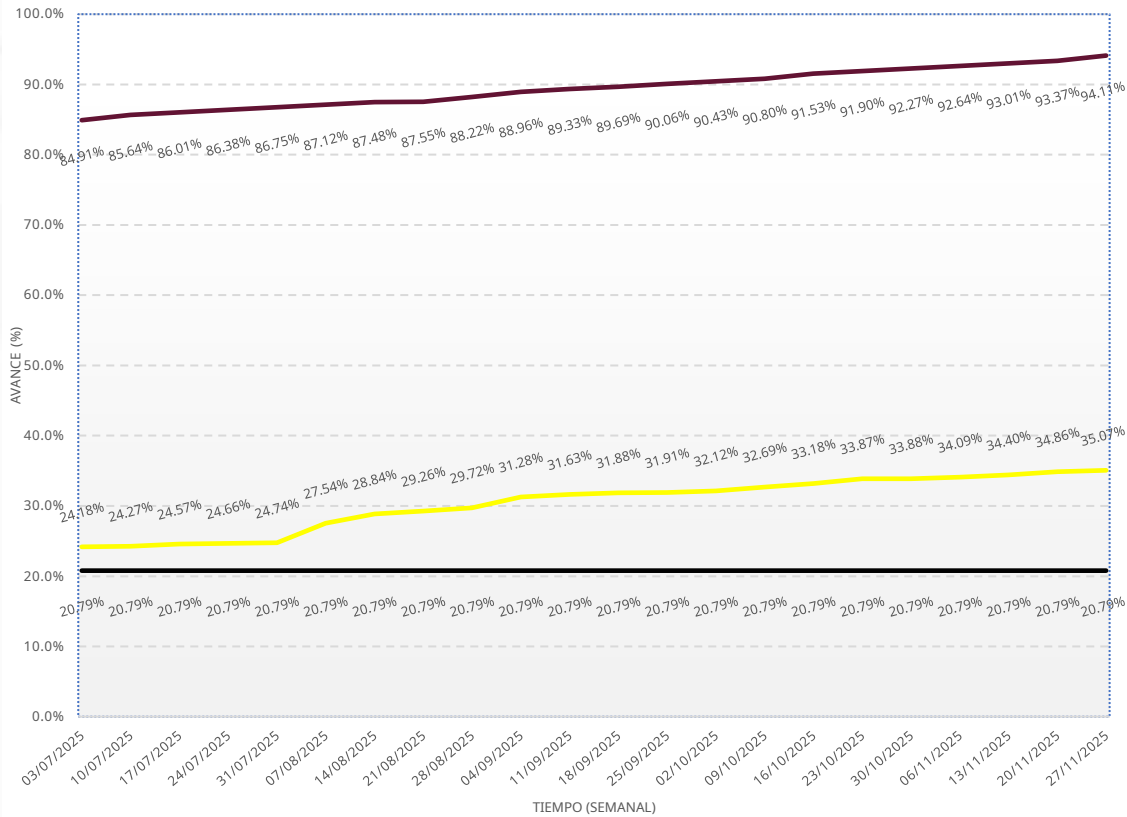

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	14 al 20 de noviembre	21 al 27 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	151	160
Maquinaria	63	66
