

# Chiapas

## Entronque San Cristóbal


Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV


**Avance físico**


- Programado: 0.00%
- Real: 25.17%
- Semanal: 0.00%


### Avances

En septiembre se prevé el reinicio de las obras para la conclusión del entronque. El proyecto ejecutivo se encuentra autorizado y el derecho de vía necesario modificado.

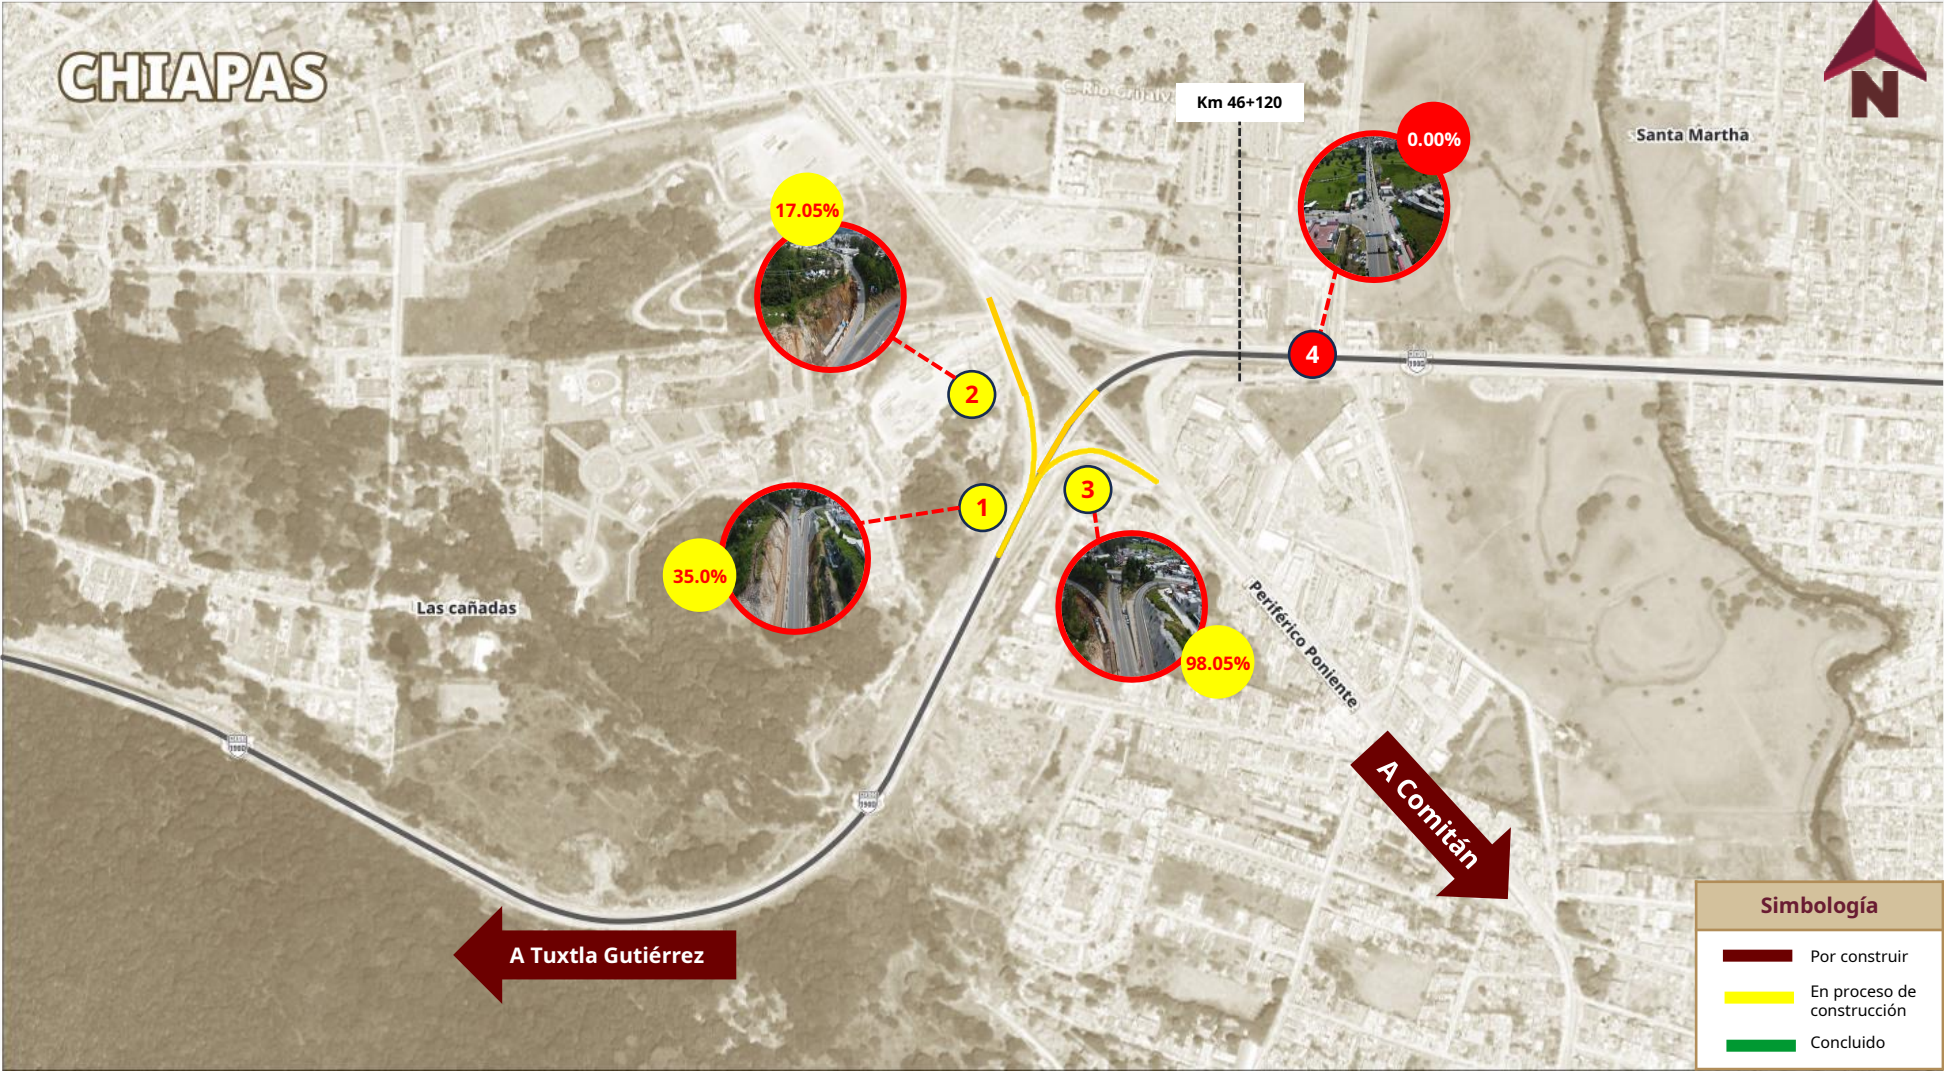



**Inversión:** 44.96 mdp


**Meta:** 1 Entronque


**Avance físico:**

- Real: 25.17%
- Financiero: 22.96%

**Inicio:**

**Término:** Por definir

**135** empleos generados

**200,000 mil** habitantes beneficiados

- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
- Disminución de accidentes.
- Se evitan vueltas prohibidas.

	Descripción	Observaciones
1	Eje 50: 35.00%	El 22-Jul-2025, La Concesionaria entregó a la DGDC, la solicitud de reanudación de los trabajos, junto con el programa de obra para su autorización.
2	Eje 2: 17.05%	
3	Eje 20: 98.05%	
4	Eje 4 (Glorieta a nivel de piso): 0.00%	
