


Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Avance físico

- Programado: 93.01%
- Semanal: 0.31 %
- Real: 34.40%
- Financiero: 20.79%

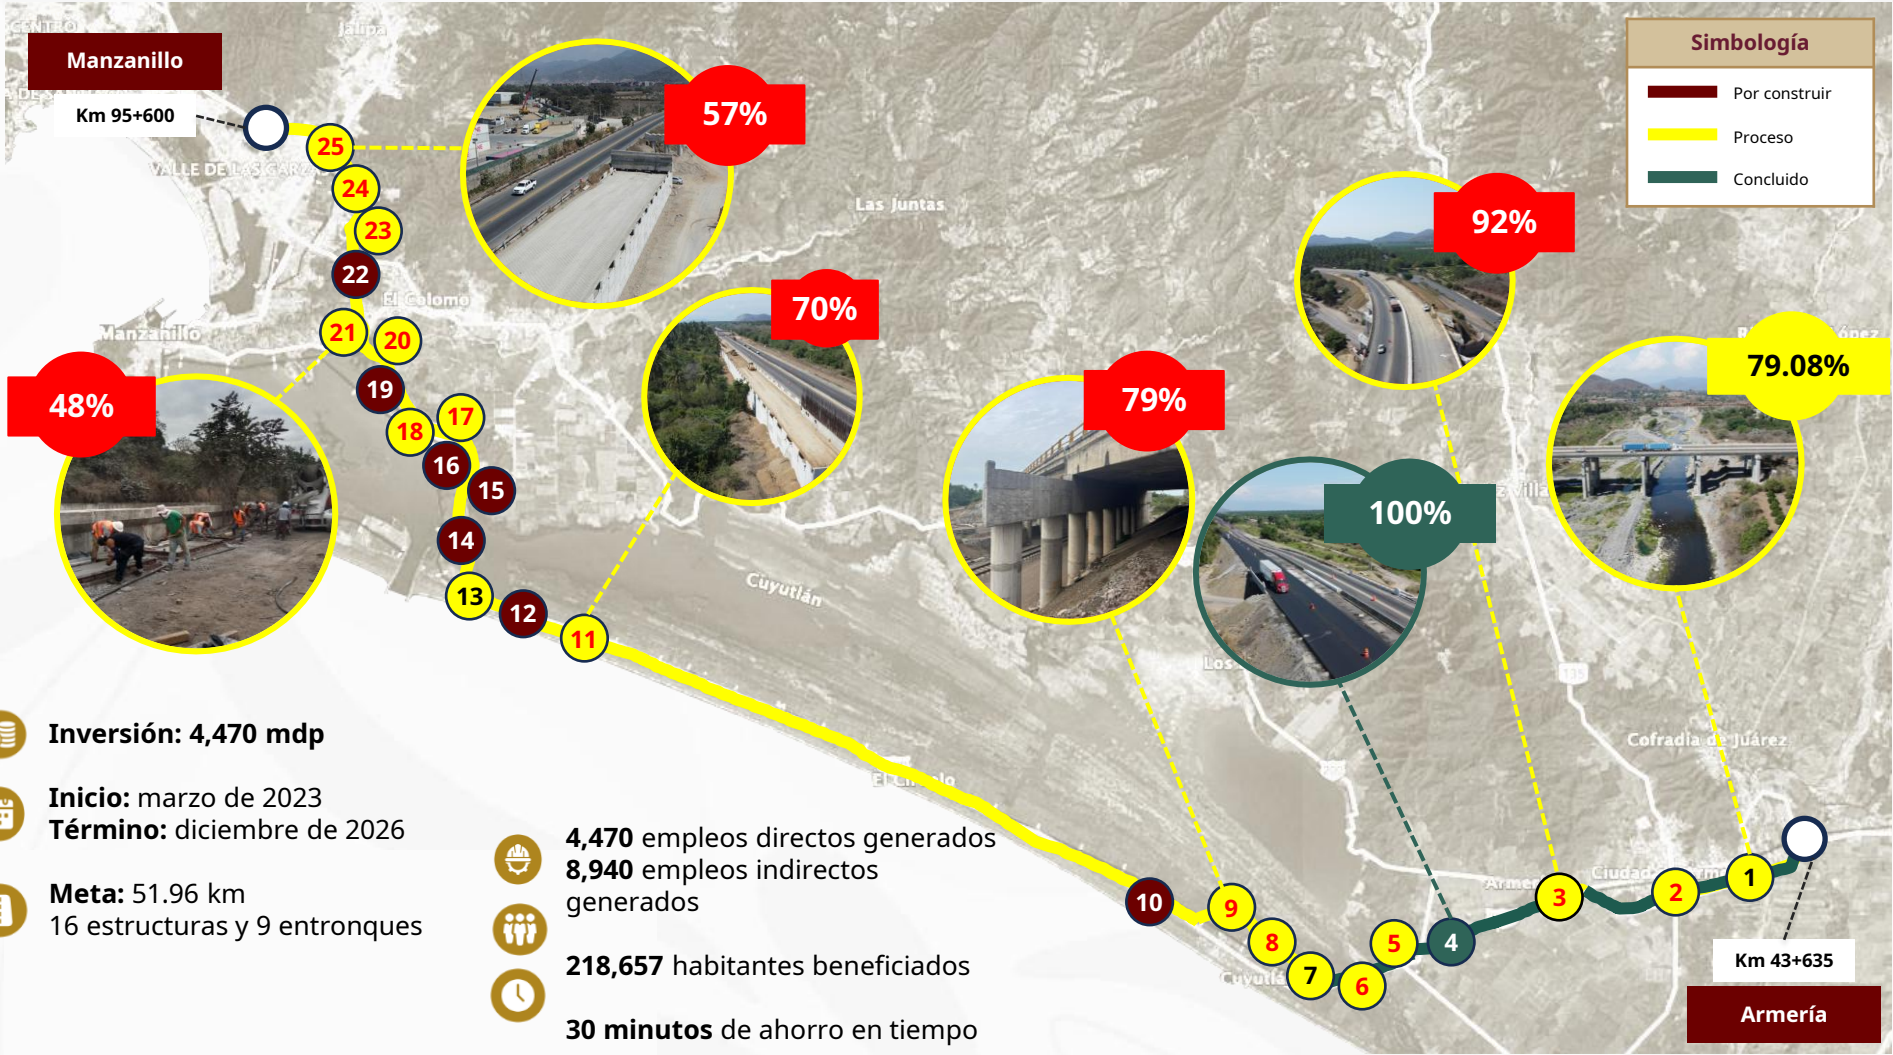

Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (79.08%)
2	Entronque Paraíso km 47+741 (78%) No esta programado avance.
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (92%) Se concilian volúmenes de avance
4	PSV Tilapia km 54+350 (100%)
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (42%) Retraso en logística
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (17%) Retraso en logística de perforación.
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (15.01%)
8	Entronque Salineros km 59+551 (5%) Falta regularizar programa
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (79.45%) Sin trabajos programados para esta semana
10	Entronque Cuyutlán km 60+880
11	PIV Retorno en U km 77+600 (70.66%) No se tuvieron trabajos programados
12	Entronque Retorno en U km 77+600
13	PSFFCC Tepalcates I km 79+900 (39.23%)
14	Entronque Tepalcates I km 80+100
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+323
16	Entronque Tepalcates II km 83+500
17	Puente Adjuntas km 85+950 (57%) Sin trabajos programados para esta semana
18	PSV Panteones km 87+300 (21%) Falta de Fuerza de Trabajo
19	Entronque Panteones km 87+630
20	PIV Minatitlán Lib. km 92+000 (4%) Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.
21	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 (48%) Sin trabajos programados para esta semana.
22	Entronque Minatitlán km 92+731
23	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (15.75%) No se ha comenzado en esta estructura por logística de perforación
24	Entronque Jalapa km 94+100 (9%) Hay que cambiar el tránsito al cuerpo izquierdo del paso del puente
25	Puente Jalapa km 94+158 (57%) El trabajo programado para esta semana, está concluido

Colima


Tramo Armería-Manzanillo

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	07/11/25 al 13/11/25		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	269,750	0	0	1,307	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	515,075	298,835	0	1,763	
Base y sub base (m³)	260,119	157,606	102,513	0	1,808	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.



Avance Programado - Físico - Financiero (%)

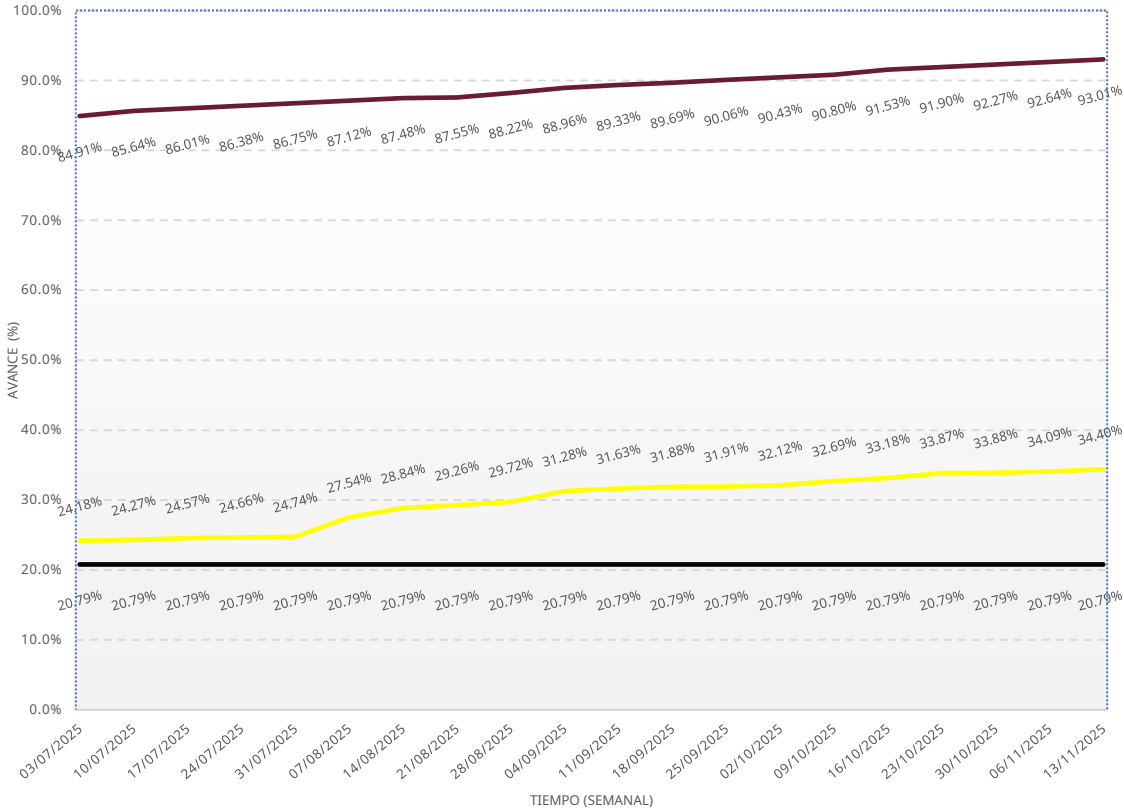

	31 de octubre al 06 de noviembre	07 al 13 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	159	177
Maquinaria	65	77
