


Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

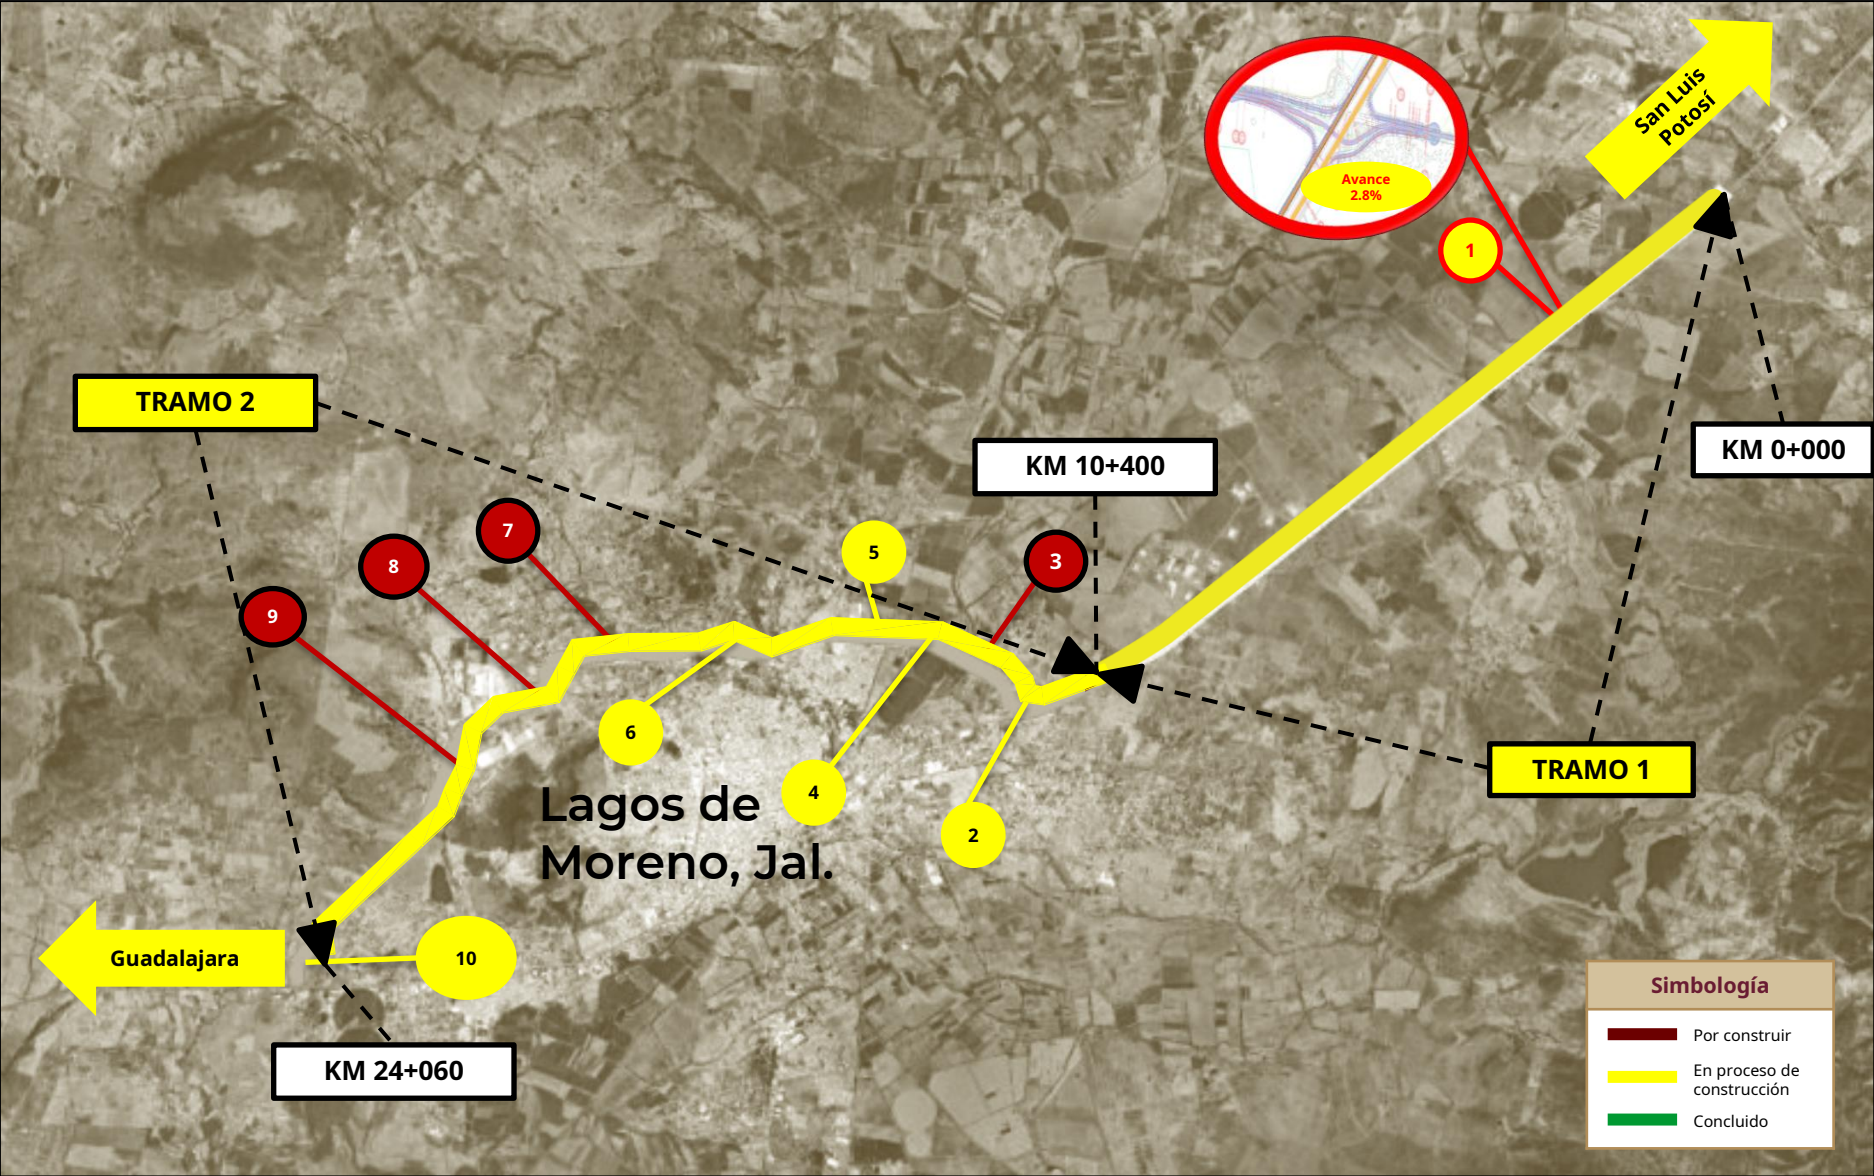


Descripción	
1	PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - Avance 2.8%. Problemas de DDV.
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- Avance 17.10 %.
3	PIV con entronque "Fracc. Andalucía" km 12+120
4	Puente km 12+450 "Río Lagos"- Avance 25.42%
5	PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620 Avance 3.37%
6	PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900 Avance 6.38%
7	PIV con entronque "Santorini" km 17+800
8	PIV con entronque "Encarnación" km 18+200
9	PSFC con retornos km 19+860
10	PIV con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920 Avance 7.80%


Avance físico general


- Real: 39.41%
- Programado: 28.81%
- Semanal: 1.27%
- Financiero: 22.92 %


 **Inversión: 2,345 mdp**

 **Inicio:** 1 de marzo de 2025
Término: 28 de febrero de 2028

 **Meta:** 25 km

 **7,035** empleos generados
(2,345 empleos directos y 4,690 empleos indirectos)

 **250,000** habitantes beneficiados

 **20 minutos** de ahorro en tiempo


Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS TRONCAL TRAMO 2							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	14/11/25 al 20/11/25		Observaciones
					Programa do	Ejecutado	
Subyacente	m³	49,010	24,700	24,310	717.50	9,700	En proceso
Subrasante	m³	46,635	16,500	30,135	682	2,000	En proceso
Base hidráulica	m³	34,468	12,351	22,117	641	2,043	En proceso
Pedraplén	m³	26,600	7,936	18,664	390	1,436	En proceso
Base asfáltica	m³	35,228	2,882	32,346	644	2,232	En proceso

TRAMO 2 PSV AVANCE DE ESTRUCTURAS							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	14/11/25 al 20/11/25		Observaciones
					Programa do	Ejecutado	
Entronque Lagos de Moreno Oeste	%	100%	17.10%	82.90%	0.00	6.13%	En proceso
Puente km 12+450	%	100%	25.42%	74.58%	0.00	2.45%	En proceso
PIV KM 13+600	%	100%	3.37%	96.63%	0.00	0.83%	En proceso
PSV km 15+900	%	100%	6.38%	93.62%	0.00	3.71%	En proceso
PIV km 23+920	%	100%	7.80%	92.20%	0.00	0.05%	En proceso

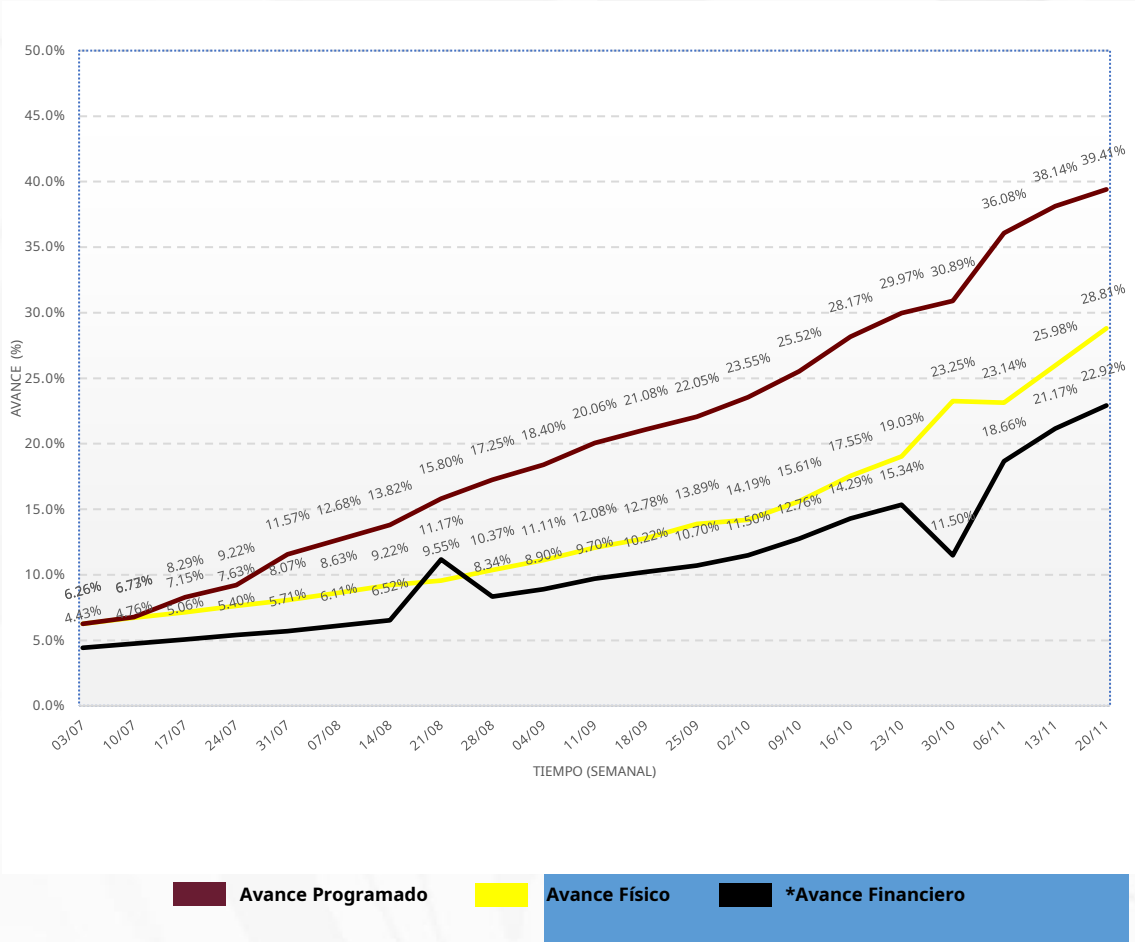

	07 de noviembre al 13 de noviembre	14 al 20 de noviembre 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	103	205
Maquinaria	14	61

